



**รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564**

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>





ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 441 รายการ วงเงิน 315,663,700 บาท

1. โดยวิธี E-bidding 334 รายการ เป็นเงิน 276,770,400 บาท

2. โดยวิธีคัดเลือก 6 รายการ เป็นเงิน 14,582,400 บาท

3. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101 รายการ เป็นเงิน 24,310,900 บาท




รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3
รายการครุภัณฑ์ **รวมทั้งสิ้น 441 รายการ**


- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ


100


80

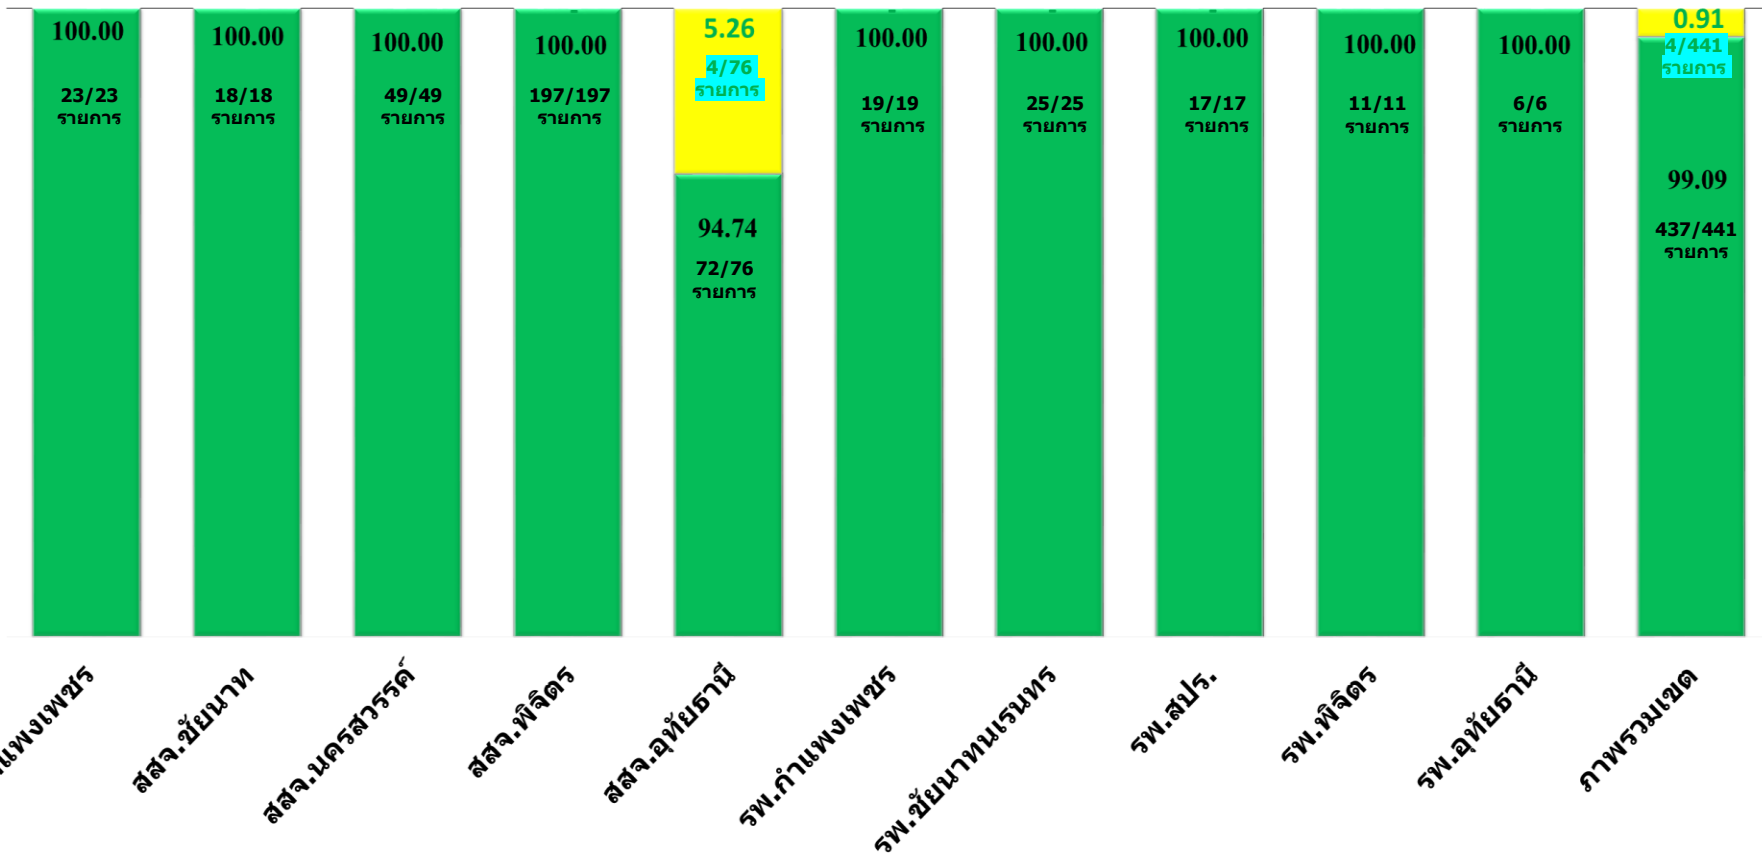



**ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 281,011,900 บาท**

- 
1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 73 รายการ รวมเป็นเงิน 233,222,500 บาท
 - 1.1 โดยวิธี E-bidding 64 รายการ เป็นเงิน 220,168,900 บาท
 - 1.2 โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ เป็นเงิน 9,866,000 บาท
 - 1.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ เป็นเงิน 3,187,600 บาท


- 
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน โดยวิธี E-bidding 5 รายการ
รวมเป็นเงิน 47,789,400 บาท

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว **รวมทั้งสิ้น 73 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

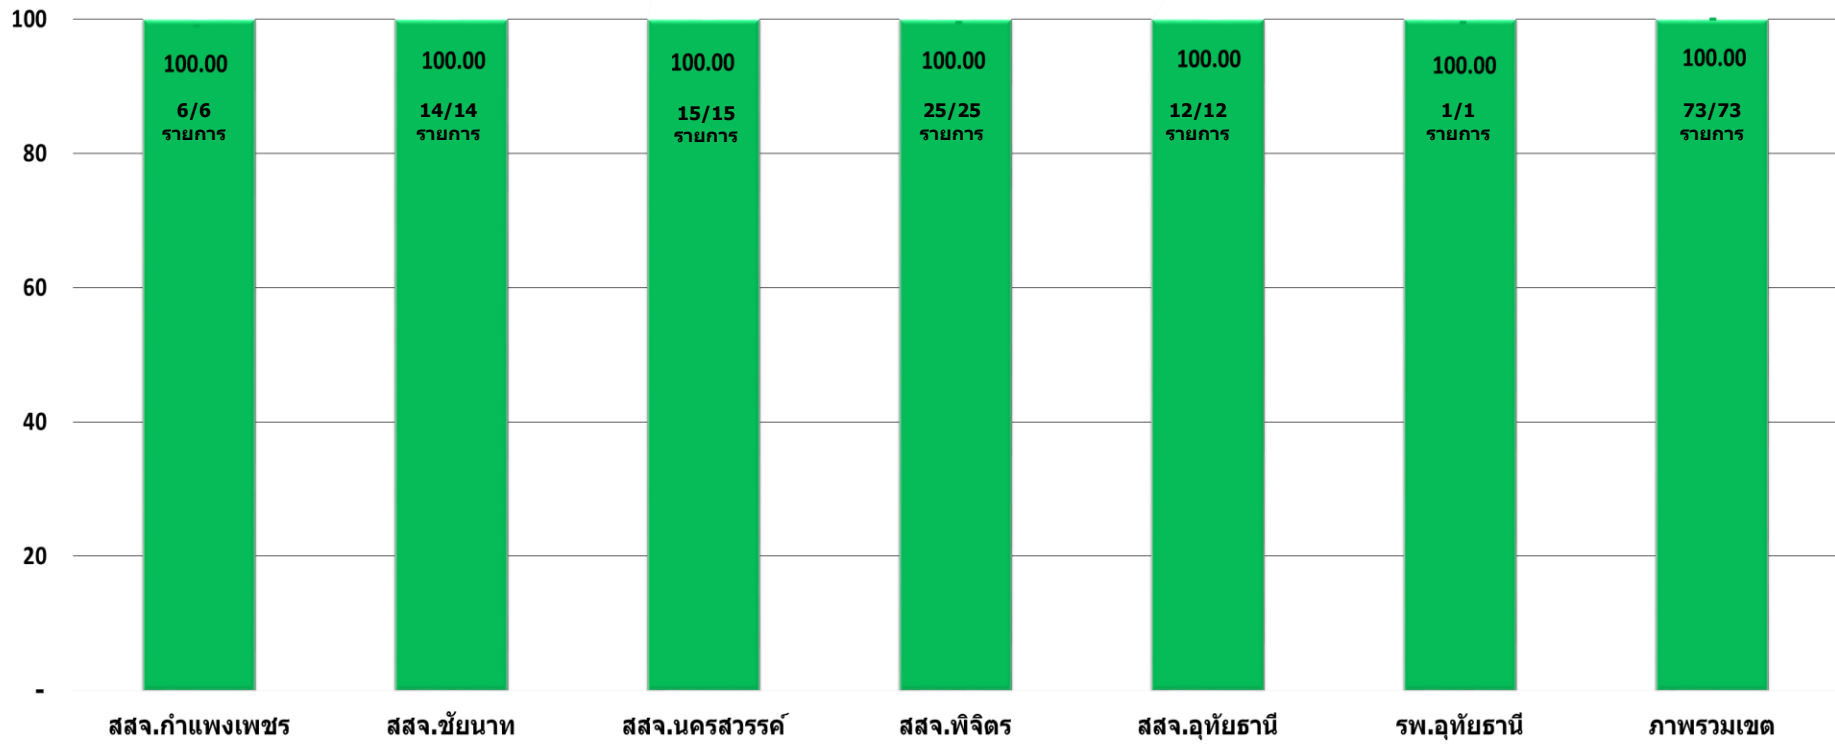


สิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน **รวมทั้งสิ้น 5 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

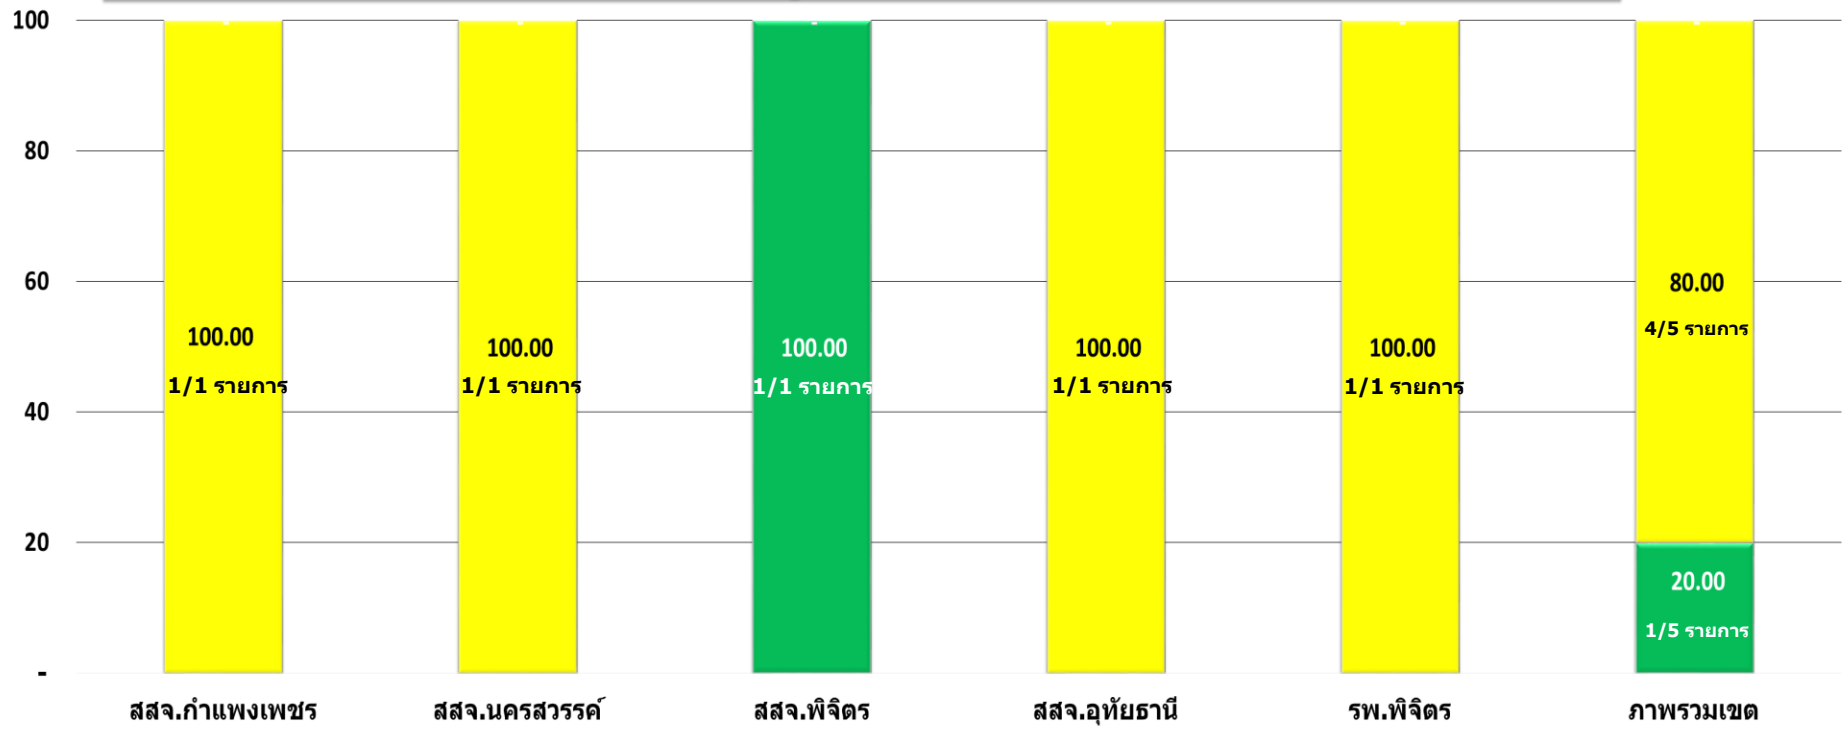

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 61 (บาท)	งบ ปี 62 (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารรังสีและผ่าตัดเป็นอาคารคสล.6 ชั้น	รพ. สวรรค์ประชาภิรักษ์	481,460,000	116,192,800	29,930,400	157,437,400	177,899,400	19	19	18	1	428,499,400	56,960,600	

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพง เพชร	163,500,000	10,904,150	43,161,600	69,265,500	61,584,000	22	4	1	3	-	163,500,000	ลงนาม ในสัญญา 30 ก.ย. 63
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 1 หลัง	รพ. สวรรค์ ประชา รักษ์	349,400,000	22,001,325	77,009,700	275,011,500	-	18	7	5	2	50,243,720	299,156,280	งวดที่ 4 ตรวจรับ 14 ก.พ. 2564
3. สสจ. เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น 1 หลัง	สสจ. นครสว ร์ค์	32,960,000	7,583,700	30,334,500	-	-	8	7	7	-	22,445,760.00	10,514,240	ลงนาม ในสัญญา 15 ก.ค. 63

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ที่ทำสัญญาใหม่

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วย นอกและอุบัติเหตุ คสล. 9 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	309,000,000	21	7	5	2	87,691,110 (งวดที่ 1 จำนวน 11,845,515 บาท งวดที่ 2 จำนวน 10,295,880 บาท งวดที่ 3 จำนวน 9,376,605 บาท งวดที่ 4 จำนวน 9,823,110 บาท และจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท)	221,308,890	ลงนามในสัญญา 10 ส.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม 2565 - จ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท - งบผูกพันโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถ กันเงินภายใน 30 ก.ย. 63 จำนวน 47,790,878 บาท * สาเหตุความล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างติดปัญหา เรื่องไม่สามารถเพิ่มแรงงานได้ เนื่องจากติดปัญหาแรงงานข้ามจังหวัดไม่ได้



Thank
you
