



**รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564**

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>






รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3  
รายการครุภัณฑ์ **รวมทั้งสิ้น 441 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

100

80

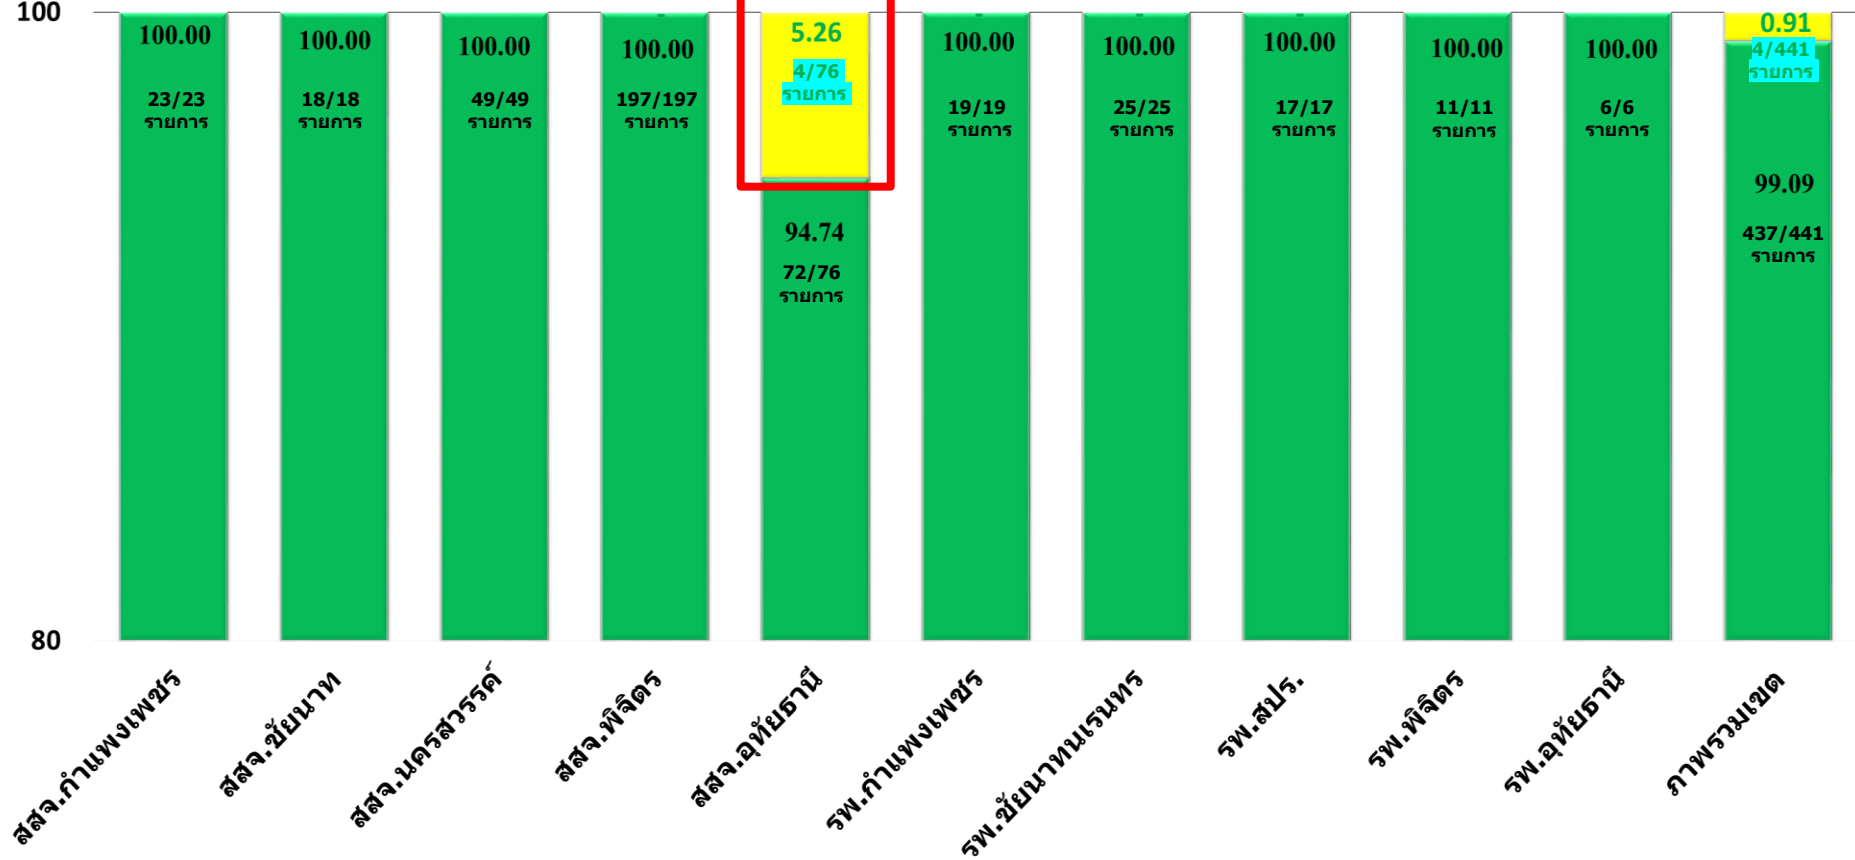

## รายการครุภัณฑ์ ปิงบประมาณ 2564 ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ทั้งสิ้น 4 รายการ


ลำดับ	เขต	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ขอ	ราคารวม	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้งที่	ขั้นตอน													สาเหตุความล่าช้า				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	10	11		12	13		
ครุภัณฑ์ (4 รายการ)																											
1	3	อุทัยธานี	รพ.สว่างอารมณ์	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	254,800.00	1	254,800.00	E-bidding	1																		อื่นๆ (ระบบ) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 ไม่มีผู้อุทธรณ์ เนื่องจากประกาศราคากลาง 3 รายการ รวมผลการวินิจฉัย รายการอุทธรณ์ จึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้
2	3	อุทัยธานี	รพ.สว่างอารมณ์	เครื่องดึงคอลและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	367,500.00	1	367,500.00	E-bidding	1																		อื่นๆ (ระบบ) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 ไม่มีผู้อุทธรณ์ เนื่องจากประกาศราคากลาง 3 รายการ รวมผลการวินิจฉัย รายการอุทธรณ์ จึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้
3	3	อุทัยธานี	รพ.หนองขาหย่าง	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	2,450,000.00	1	2,450,000.00	E-bidding	1																		อื่นๆ (ระบบ) : สิ้นสุด 2 ก.พ.64 มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย ส่งผลการอุทธรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางวินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ 0032.001/1678 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 64
4	3	อุทัยธานี	รพ.ห้วยคต	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	509,600.00	1	509,600.00	E-bidding	1																		อื่นๆ (ระบบ) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 มีผู้อุทธรณ์ผลการเสนอราคา ส่งเรื่องให้ กรมบัญชีกลางวินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ 0032.001/1677 ลงวันที่ 9 กพ.64 ได้ไม่ได้รับตอบกลับ ติดตามผลการอุทธรณ์ที่กรมบัญชีกลาง เลขที่ อน 0032.001/6276 ลว.4 มี.ย.64

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

## รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว **รวมทั้งสิ้น 73 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

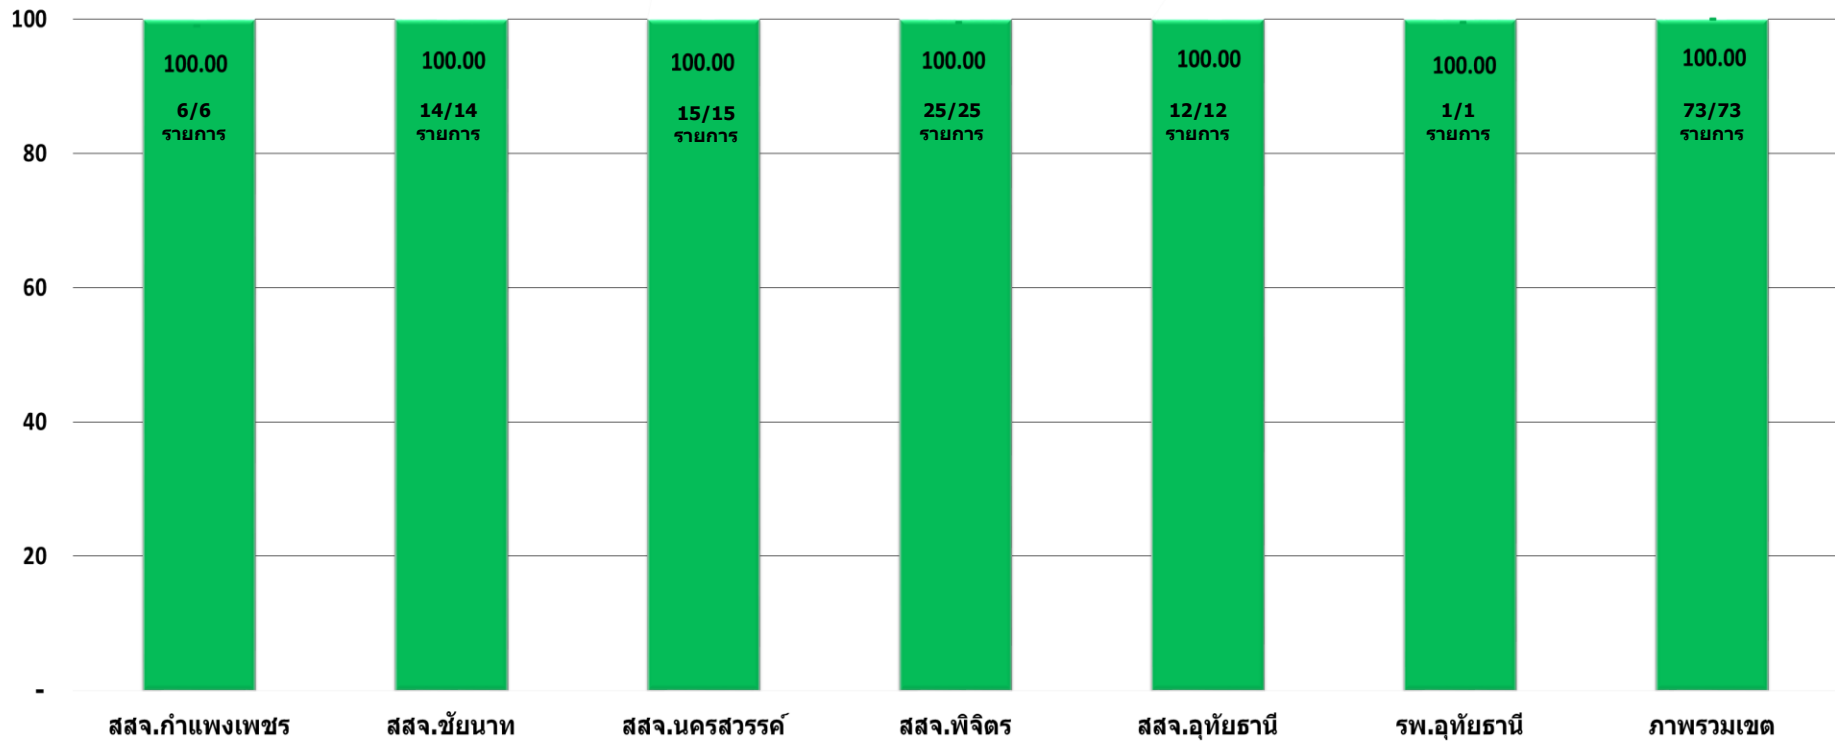


สิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

## รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน **รวมทั้งสิ้น 5 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

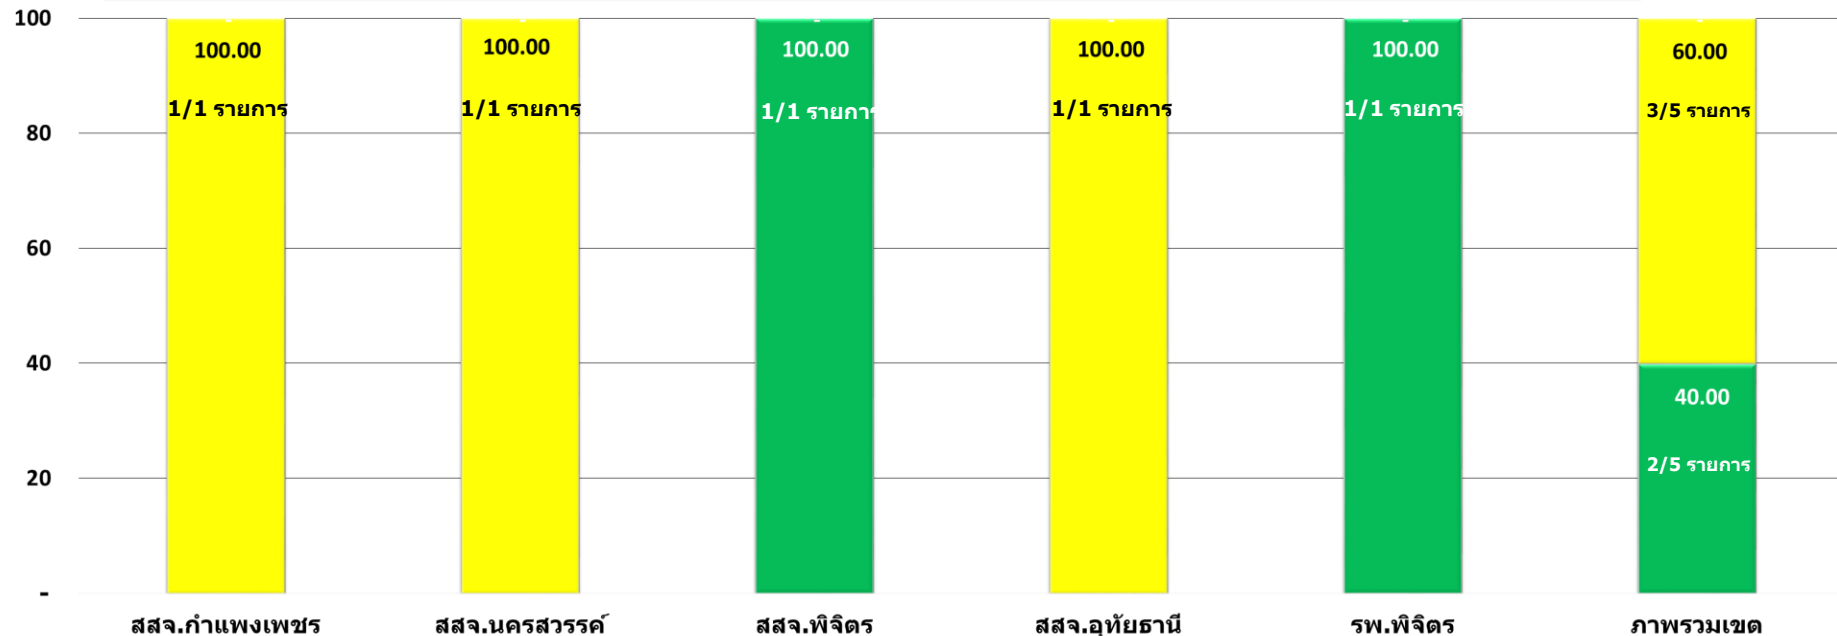



# รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>



## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 61 (บาท)	งบ ปี 62 (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารรังสีและผ่าตัดเป็นอาคารคสล.6 ชั้น	รพ. สวรรค์ประชาภิรักษ์	481,460,000	116,192,800	29,930,400	157,437,400	177,899,400	19	19	18	1	428,499,400	56,960,600	




## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพง เพชร	163,500,000	10,904,150	43,161,600	69,265,500	61,584,000	22	4	1	3	-	163,500,000	ลงนาม ในสัญญา 30 ก.ย. 63
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 1 หลัง	รพ. สวรรค์ ประชา รักษ์	349,400,000	22,001,325	77,009,700	275,011,500	-	18	7	6	1	61,040,180	288,359,820	งวดที่ 5 ตรวจรับ 11 มิ.ย. 2564
3. สสจ. เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น 1 หลัง	สสจ. นครสว ร์ค์	32,960,000	7,583,700	30,334,500	-	-	8	7	7	-	22,445,760.00	10,514,240	ลงนาม ในสัญญา 15 ก.ค. 63

## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ที่ทำสัญญาใหม่

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ช่วย นอกและ อุบัติเหตุ คสล. 9 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	309,000,000	21	7	5	2	87,691,110  (งวดที่ 1 จำนวน 11,845,515 บาท งวดที่ 2 จำนวน 10,295,880 บาท งวดที่ 3 จำนวน 9,376,605 บาท งวดที่ 4 จำนวน 9,823,110 บาท และจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท)	221,308,890	ลงนามในสัญญา 10 ส.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม 2565 - จ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท - งบผูกพันโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากไม่ สามารถกันเงินภายใน 30 ก.ย. 63 จำนวน 47,790,878 บาท  * สาเหตุความล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างติดปัญหา เรื่องไม่สามารถเพิ่ม แรงงานได้ เนื่องจากติดปัญหาแรงงานข้าม จังหวัดไม่ได้



Thank  
you
