



รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ วันที่ 19 กันยายน 2566



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 790 รายการ วงเงิน 223,053,700 บาท

1. โดยวิธี E-bidding 401 รายการ เป็นเงิน 244,481,800 บาท


2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 389 รายการ เป็นเงิน 19,070,100 บาท

3. โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ เป็นเงิน 2,358,000 บาท



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 790 รายการ

- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว

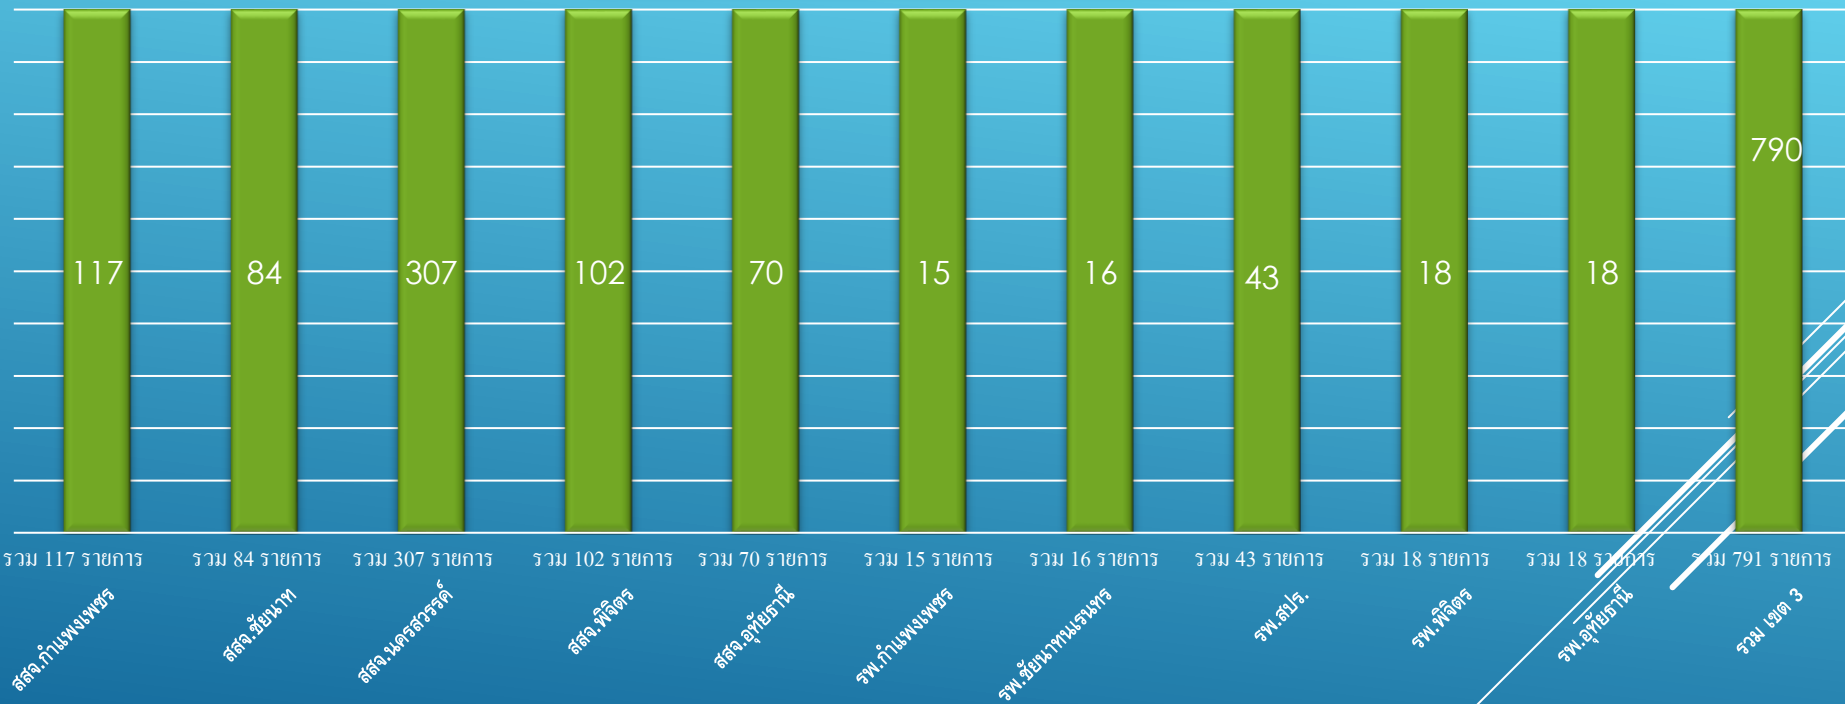


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 31 รายการ วงเงิน 599,993,900 บาท

1. สิ่งก่อสร้างพิเศษ จำนวน 25 รายการ รวมเป็นเงิน 63,716,200 บาท
 - 1.1 โดยวิธี E-bidding 19 รายการ เป็นเงิน 59,541,800 บาท
 - 1.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 รายการ เป็นเงิน 4,174,400 บาท
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 536,277,700 บาท
 - 2.1 โดยวิธี E-bidding 6 รายการ เป็นเงิน 536,277,700 บาท

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ทั้งสิ้น 6 รายการ

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน
■ ประกาศเชิญชวนแล้ว
■ ลงนามแล้ว

หน่วย : รายการ

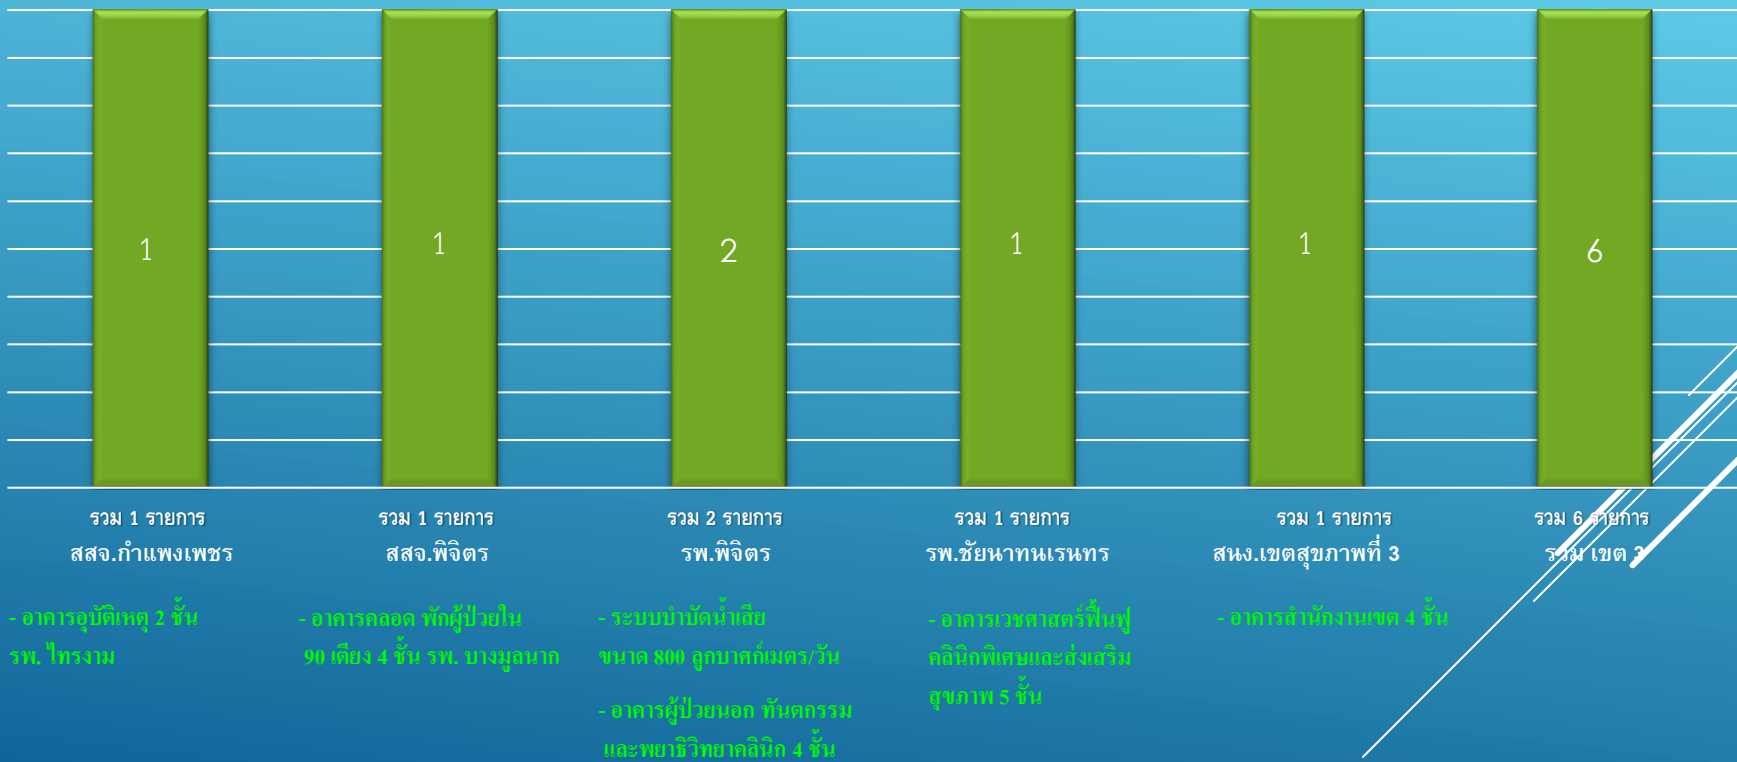



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค กบรส. สป.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>





รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1. อาคารบริการและ จอครด เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพง เพชร	163,500,000	10,904,300	43,616,600	24,253,500	84,725,600	22	22	16	6	90,006,750	73,493,250

หมายเหตุ

- ขยายเวลาก่อสร้างสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566
- ล่าช้าเนื่องจาก มีการปรับแบบรูปรายการ และมีการแก้ไขสัญญา

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งวด งาน ทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 ชั้น	รพ. ตาคลี	25,200,000	5,040,000	20,160,000	9	9	6	3	8,636,156.85	16,563,843.15	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายล่วงหน้า 9,531,000 บ. - ขยายเวลาก่อสร้างสิ้นสุด 4 ส.ค. 2566 - งบปี ปี 64 จำนวน 2,745,873.15 บาท - จะตั้งคำขอในปี 2567
2. อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ 4 ชั้น	รพ. คลองขลุง	89,102,500	17,820,500	71,282,000	12	10	4	6	12,752,984	76,349,516	<ul style="list-style-type: none"> - งบปี ปี 64 จำนวน 15,972,500 บาท - คกก. บริหารสัญญา ให้ผู้รับจ้างจัดทำ แผนงานก่อสร้าง (ใหม่) ประกอบการเพิ่ม แรงงานให้สัมพันธ์กับแผนการก่อสร้าง - ได้รับสิทธิคำปรับ ร้อยละ 0 (ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 67) ส่วนที่เหลือปรับอัตราปกติ - ส่งงวดงานที่ 3 วันที่ 7 ส.ค. 66 - กำหนดส่งงานงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบ งาน ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 66) - จะตั้งคำขอในปี 2567
3. อาคารสนับสนุน บริการ 5 ชั้น	รพ. พิจิตร	74,244,200	14,848,900	59,395,300	10	10	9	1	45,014,853	29,229,347	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปรับแบบผังชั้นการใช้งาน - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 9 และ 10 คาดว่า จะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66 - คกก. ตรวจสอบการจ้าง ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ)

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งวด งาน ทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
4. อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 ชั้น	รพร. ตะพานหิน	25,200,000	5,040,000	20,160,000	9	9	7	2	11,392,500	13,807,500	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากมีปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้งานหลายแห่ง และขาดสภาพคล่อง - ได้รับสิทธิ์ค่าปรับ ร้อยละ 0 - อยู่ระหว่างส่งมอบงวดงานที่ 7 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 66 - งวดงานที่ 8 และ 9 ไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66 เป็นจำนวนเงิน 11,857,500 บาท
5. อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 ชั้น	รพ.หนองฉาง	25,200,000	5,040,000	20,160,000	9	9	7	2	11,152,192	14,047,808	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับสิทธิ์ค่าปรับ ร้อยละ 0 ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 7 คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ย. 66 แจ้งเรียกค่าปรับตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 66 จนกว่าจะแล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุบัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	รพ. โกรกพระ	41,469,500	8,293,900	33,175,600	11	11	11	-	31,516,332.29	9,953,167.71	
2. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	รพ. คลองลาน	65,209,600	13,042,000	52,167,600	10	10	10	-	48,520,800	16,688,800	

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) **ที่ทำสัญญาใหม่**

รายการ	สถานที่	งบประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	88,671,270	5	5	2	3	8,900,000	79,771,270	<ul style="list-style-type: none">- เริ่มงาน วันที่ 21 ก.ค. 66- สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ย. 66- ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพัน เป็นปีงบประมาณ 2561-2566- เบิกจ่ายจากงบเงินบำรุง- อยู่ระหว่างดำเนินการขอเบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ 2 จำนวนเงิน 21,921,270 บาท
