



รายงานติดตามความก้าวหน้าการลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ วันที่ 27 กันยายน 2566



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 790 รายการ วงเงิน 223,053,700 บาท

1. โดยวิธี E-bidding 401 รายการ เป็นเงิน 244,481,800 บาท

2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 389 รายการ เป็นเงิน 19,070,100 บาท

3. โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ เป็นเงิน 2,358,000 บาท


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 31 รายการ วงเงิน 599,993,900 บาท

1. สิ่งก่อสร้างพิเศษ จำนวน 25 รายการ รวมเป็นเงิน 63,716,200 บาท
 - 1.1 โดยวิธี E-bidding 19 รายการ เป็นเงิน 59,541,800 บาท
 - 1.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 รายการ เป็นเงิน 4,174,400 บาท
2. สิ่งก่อสร้างพุกพั้น จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 536,277,700 บาท
 - 2.1 โดยวิธี E-bidding 6 รายการ เป็นเงิน 536,277,700 บาท

หน่วย : รายการ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียวทั้งสิ้น 25 รายการ

- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว

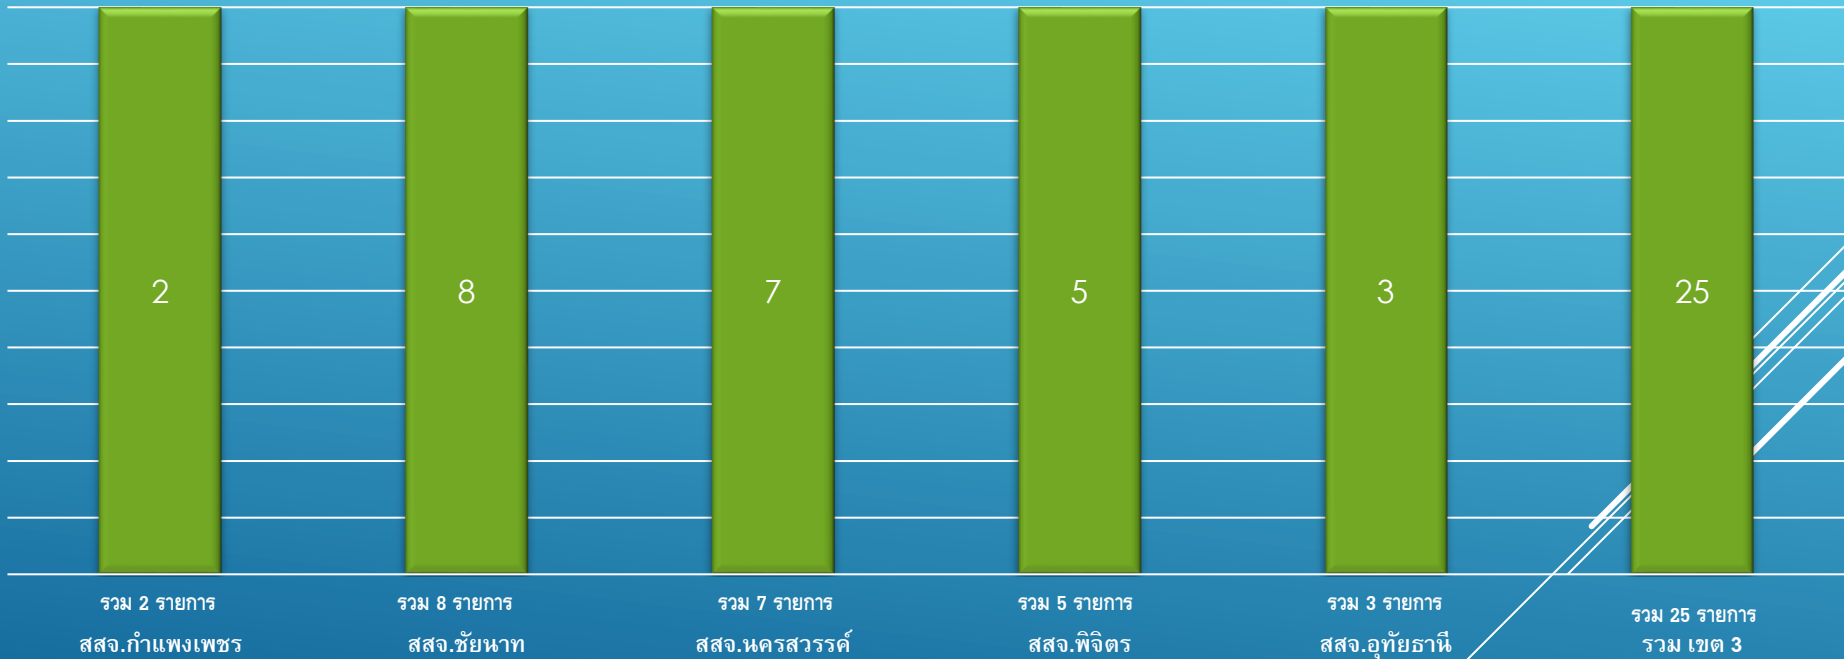


รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ทั้งสิ้น 6 รายการ

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน
■ ประกาศเชิญชวนแล้ว
■ ลงนามแล้ว

หน่วย : รายการ



รวม 1 รายการ
สสจ.กำแพงเพชร

- อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น
รพ. ไทรทอง

รวม 1 รายการ
สสจ.พิจิตร

- อาคารคลอด ที่ผู้ป่วยใน
90 เตียง 4 ชั้น รพ. บางมูลนาก

รวม 2 รายการ
รพ.พิจิตร

- ระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- อาคารผู้ป่วยนอก หันศกรวม
และพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น

รวม 1 รายการ
รพ.ชัยนาทนเรนทร

- อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกพิเศษและส่งเสริม
สุขภาพ 5 ชั้น

รวม 1 รายการ
สนง.เขตสุขภาพที่ 3

- อาคารสำนักงานเขต 4 ชั้น

รวม 6 รายการ
รวม เขต 2



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค กบรส. สป.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>





รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1. อาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพงเพชร	163,500,000	10,904,300	43,616,600	24,253,500	84,725,600	22	22	17	5	92,557,350	73,493,250

หมายเหตุ

- ขยายเวลาก่อสร้างสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566
- ล่าช้าเนื่องจาก มีการปรับแบบรูปรายการ และมีการแก้ไขสัญญา
- สัญญาสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 67
- คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. – ก.พ. 67

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งวด งาน ทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 ชั้น	รพ. ตาคลี	25,200,000	5,040,000	20,160,000	9	9	7	2	13,222,610	11,977,390	- เบิกจ่ายล่วงหน้า 9,531,000 บ. - ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับแผนงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาก่อสร้าง
2. อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ 4 ชั้น	รพ. คลองขลุง	83,144,984	17,820,500	71,282,000	12	10	5	5	17,036,984	66,108,000	- งบปี 64 จำนวน 15,972,500 บาท จะตั้งค่าขอในงบปี 67 - คกก. บริหารสัญญา ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้าง (ใหม่) ประกอบการเพิ่มแรงงานให้สัมพันธ์กับแผนการก่อสร้าง - ได้รับสิทธิ์ค่าปรับ ร้อยละ 0 (ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 66 - 9 ต.ค. 67) ส่วนที่เหลือปรับอัตราปกติ - สัญญาสิ้นสุดวันที่ 12 ต.ค. 66
3. อาคารสนับสนุน บริการ 5 ชั้น	รพ.พิจิตร	63,540,000	14,848,900	59,395,300	10	10	10	-	57,220,887	6,319,113	- มีการปรับแบบผังชั้นการใช้งาน - คกก.ตรวจการจ้าง ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ - งวดที่ 10 ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทัน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งวด งาน ทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
4. อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย 4 ชั้น	รพร. ตะพานหิน	23,250,000	5,040,000	20,160,000	9	9	7	2	11,392,500	11,857,500	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับสิทธิ์ค่าปรับ ร้อยละ 0 - อยู่ระหว่างส่งมอบงวดงานที่ 7 และจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 ก.ย. 66 - งวดงานที่ 7-9 ไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66 เป็นจำนวนเงิน 11,857,500 บาท - เนื่องจากมีปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้งานหลายแห่ง และขาดสภาพคล่อง
5. อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย 4 ชั้น	รพ.หนองฉาง	23,277,442	5,040,000	20,160,000	9	9	8	1	14,005,192	9,272,250	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับสิทธิ์ค่าปรับ ร้อยละ 0 ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 - เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากการแพร่ระบาดส่งผลกระทบทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง - ขยายระยะเวลาก่อสร้างสิ้นสุด วันที่ 6 ส.ค. 66

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	รพ. โกรกพระ	41,399,000	8,293,900	33,175,600	11	11	11	-	28,565,310	12,833,690	- คาดว่าจะส่งมอบ และ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66 - กั้นเลื่อนปีไว้ในปี 2567
2. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	รพ. คลองลาน	65,209,600	13,042,000	52,167,600	10	10	10	-	48,520,800	16,688,800	

รายงานควมกำวน้ำการเบกจ่ายงบลงทุน (ลิ่งก่อสร้างผูกพัน) **ที่ททำสัญญาใหม่**

รายการ	สถานที่	งบประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น	รพ.สุวรสคประชารักษ์	88,671,270	5	5	2	3	8,900,000	79,771,270	<ul style="list-style-type: none">- เริ่มงาน วันที่ 21 ก.ค. 66- สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ก.ย. 66- ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาท่อนี้ ผูกพัน เป็นปีงบ 2561-2566- เบกจ่ายจากงบเงินบำรุง- ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 15 ก.ย. และ อยู่ระหว่างเบกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงิน 21,921,270 บาท
