

**รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 16 เมษายน 2564**

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>





ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์  
รวมทั้งสิ้น 442 รายการ วงเงิน 315,687,300 บาท

1. โดยวิธี E-bidding 335 รายการ เป็นเงิน 276,794,000 บาท

2. โดยวิธีคัดเลือก 6 รายการ เป็นเงิน 14,582,400 บาท


3. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101 รายการ เป็นเงิน 24,310,900 บาท



รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3  
รายการครุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 442 รายการ

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

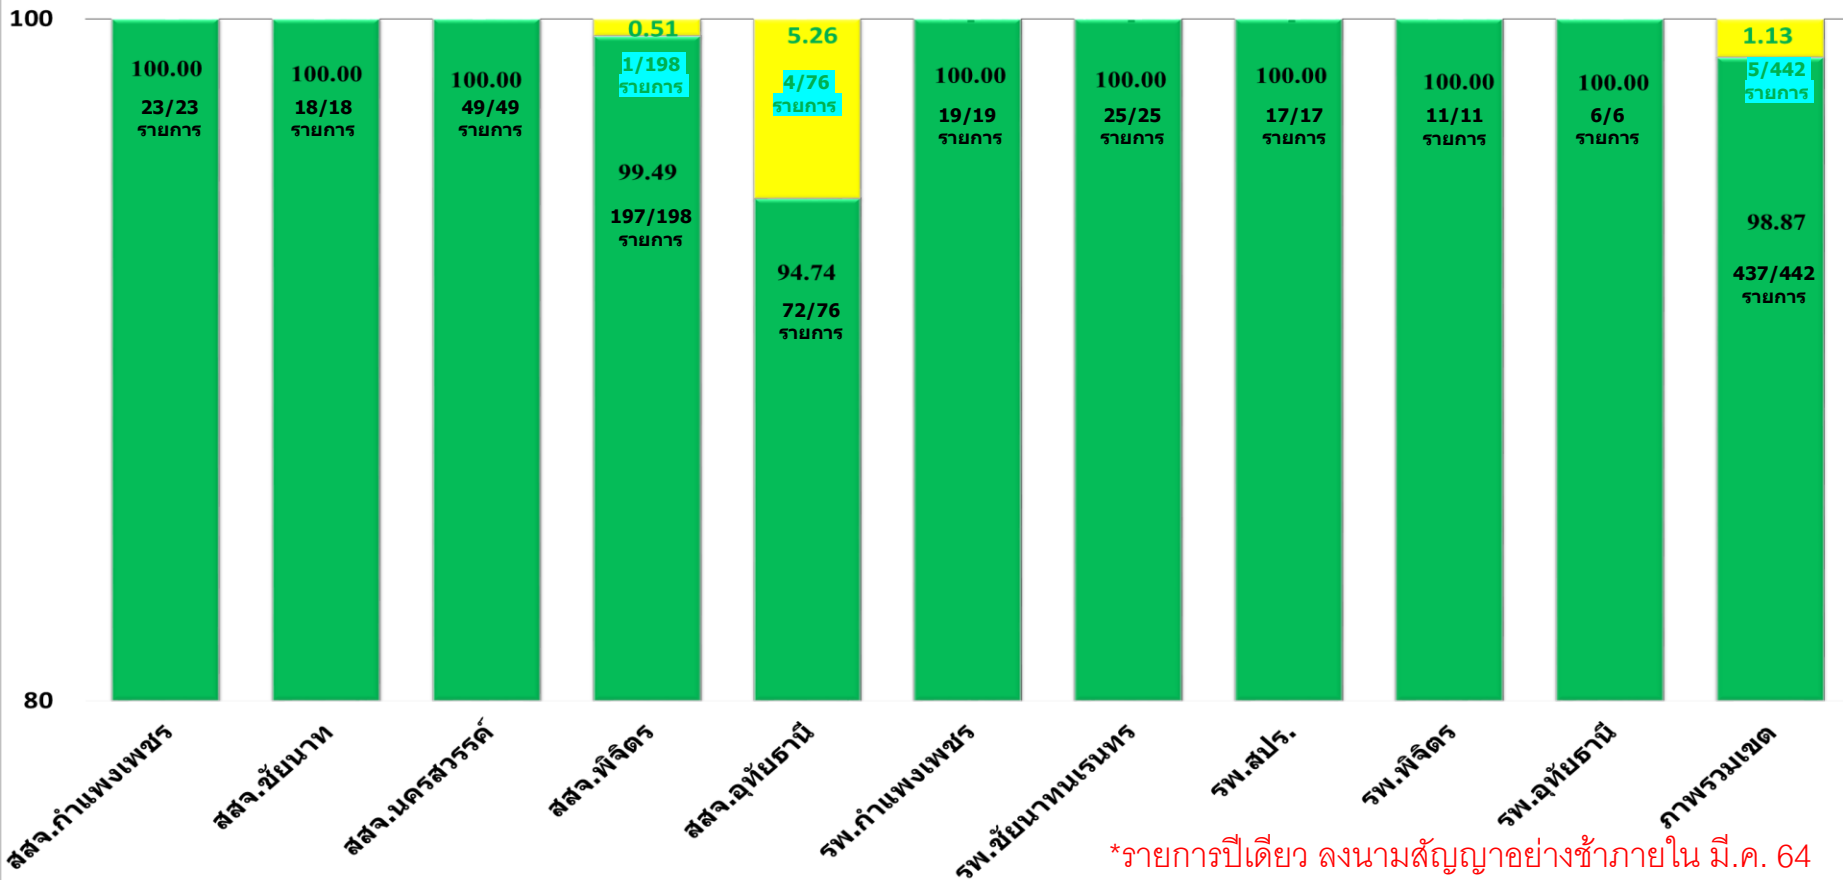

\*รายการปีเดียว ลงนามสัญญาอย่างช้าภายใน มี.ค. 64




# รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

## ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ทั้งสิ้น 5 รายการ


ลำดับ	เขต	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ขอ	ราคารวม	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้งที่	ขั้นตอน													สาเหตุความล่าช้า		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	10	11		12	13
<b>ครุภัณฑ์ (5 รายการ)</b>																									
1	3	พิจิตร	ทพ.เวชกรรม	ชุดเครื่องตรวจความเข้ากันไดของเลือด (Gel Card) โรงพยาบาลเวชกรรม 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเวชกรรม จ.พิจิตร 1 ชุด	23,600.00	1	23,600.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (รวม) : ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา วงเงินงบประมาณ ที่จัดสรรให้ มีวงเงินที่ต่ำกว่าราคากลาง และกำลังดำเนินการคืนเงินงบประมาณ
2	3	อุทัยธานี	ทพ.สว่างอารมณ์	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 3 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 1 ชุด	254,800.00	1	254,800.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (รวม) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 มีผู้อุทธรณ์ผลการเสนอราคา อยู่ระหว่าง คก.พิจารณา ส่งกรมบัญชีกลางวินิจฉัย
3	3	อุทัยธานี	ทพ.สว่างอารมณ์	เครื่องดึงคอนกรีตอัดแรงพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 3 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 1 เครื่อง	367,500.00	1	367,500.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (รวม) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 มีผู้อุทธรณ์ผลการเสนอราคา อยู่ระหว่าง คก.พิจารณา ส่งกรมบัญชีกลางวินิจฉัย
4	3	อุทัยธานี	ทพ.หนองขาหย่าง	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแปลดทาแนลโรตารี โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 3 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 1 เครื่อง	2,450,000.00	1	2,450,000.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (รวม) : สิ้นสุด 2 ก.พ.64 มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย อยู่ระหว่าง คก.พิจารณาผลการอุทธรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางวินิจฉัย
5	3	อุทัยธานี	ทพ.ห้วยคด	เครื่องช่วยขูดตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลห้วยคด 3 ตำบลห้วยคด อำเภอห้วยคด จ.อุทัยธานี 1 เครื่อง	509,600.00	1	509,600.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (รวม) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 มีผู้อุทธรณ์ผลการเสนอราคา อยู่ระหว่าง คก.พิจารณา ส่งกรมบัญชีกลางวินิจฉัย


อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการคืน  
เงินงบประมาณ

อยู่ระหว่าง คก.  
พิจารณา ส่ง  
กรมบัญชีกลาง  
วินิจฉัย



**ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง  
รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 281,011,900 บาท**

- 
1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 73 รายการ รวมเป็นเงิน 233,222,500 บาท
    - 1.1 โดยวิธี E-bidding 64 รายการ เป็นเงิน 220,168,900 บาท
    - 1.2 โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ เป็นเงิน 9,866,000 บาท
    - 1.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ เป็นเงิน 3,187,600 บาท

- 
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน โดยวิธี E-bidding 5 รายการ  
รวมเป็นเงิน 47,789,400 บาท

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3


## รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว **รวมทั้งสิ้น 73 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

100

80

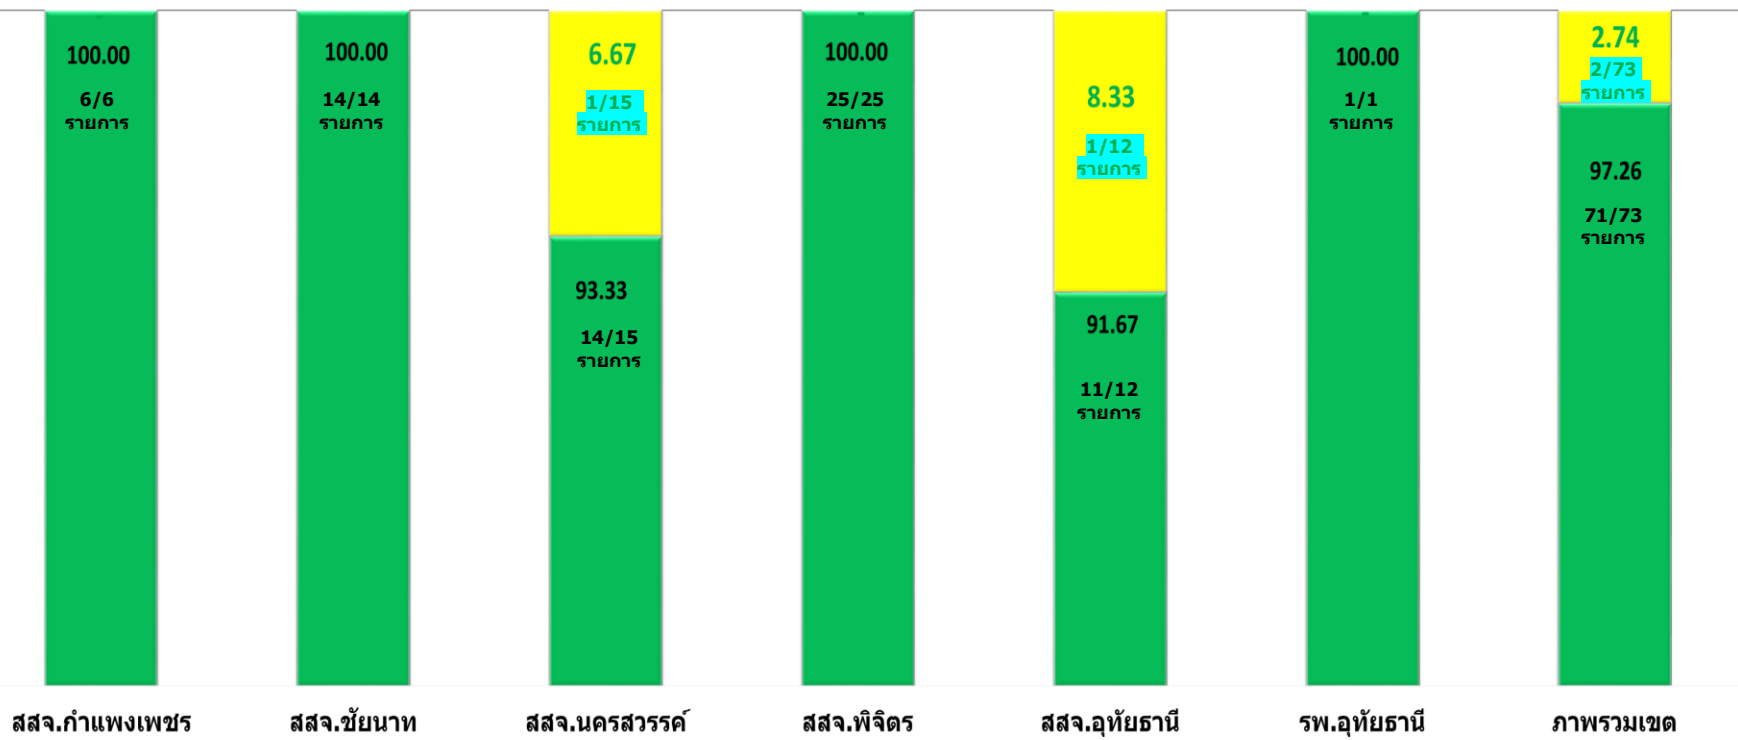

\*รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามสัญญาอย่างช้าภายใน มี.ค. 64



# รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2564 ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ทั้งสิ้น 2 รายการ

## วิธี E-bidding จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	เขต	จังหวัด	ชื่อนายงาน	ชื่อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ขอ	ราคารวม	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้งที่	ขั้นตอน													สาเหตุความล่าช้า		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	10	11		12	13
สิ่งก่อสร้างปีเดียว (1 รายการ)																									
1	3	นครสวรรค์	รพ.บรรพตพิสัย	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พื้นที่ใช้สอย 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	28,887,800.00	1	28,887,800.00	E-bidding	1																อื่นๆ (ระบุ) : คาดว่าจะลงนามภายในเดือนเมษายน 2564

## วิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ


ลำดับ	เขต	จังหวัด	ชื่อนายงาน	ชื่อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ขอ	ราคารวม	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้งที่	ขั้นตอน										สาเหตุความล่าช้า		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
สิ่งก่อสร้างปีเดียว (1 รายการ)																						
1	3	อุทัยธานี	รพ.ทัพทัน	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ตระนคร) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	9,866,000.00	1	9,866,000.00	วิธีคัดเลือก	1													อื่นๆ (ระบุ) : ยกเลิกประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการกำหนดราคากลางให้ผู้สามารถเห็นชอบราคากลาง โดยใช้คณะกรรมการกำหนดราคากลางชุดเดิม อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย มารื่นข้อเสนอ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่จรรยาผลการคัดเลือก ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการพิจารณาอนุมัติสิ่งส่งจ้าง ประกาศผลผู้ชนะ 22 มีนาคม 2564 รออุทธรณ์ 7 วัน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คาดว่าจะลงนามในสัญญา ประมาณ เม.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างลงทุน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

## รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน **รวมทั้งสิ้น 5 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

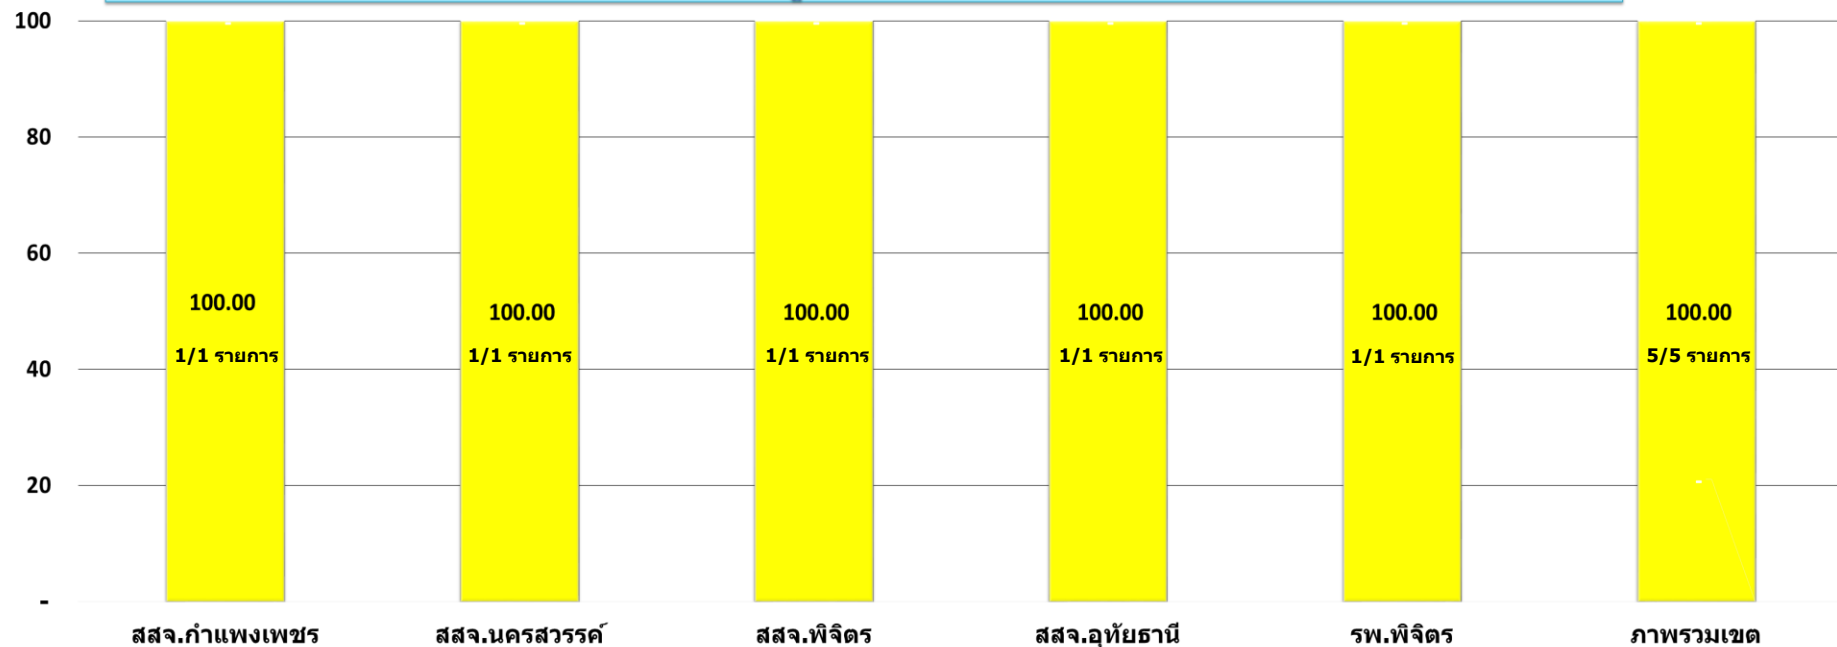

\*รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ลงนามสัญญาอย่างช้าภายใน มี.ค. 64





# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		รวมเงิน	สถานที่	จังหวัด	จัดซื้อ วิธี E-bidding	ระบบขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง			สาเหตุความล่าช้า	ได้รับ จ้าง
			งบประมาณ	ผูกพัน					ขั้นตอน สัปดาห์ที่ แล้ว	ขั้นตอน ปัจจุบัน	การดำเนินการ		
1	อาคารสนับสนุน บริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	1	14,848,900	59,395,300	74,244,200	รพ. พิจิตร	พิจิตร	1	8	8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่าน ระบบ e-GP		
2	อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น	1	17,820,500	71,282,000	89,102,500	รพ. คลองขลุง	กำแพงเพชร	1	9.1	9.1	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ที่พิจารณาผลพร้อม ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	อยู่ระหว่างให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบราคาค่า ก่อสร้าง	1
3	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น	1	5,040,000	20,160,000	25,200,000	รพ. ตาคลี	นครสวรรค์	1	9.1	9.1	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ที่พิจารณาผลพร้อม ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	กำหนดวันเสนอราคา 23 มีนาคม 2564	1
4	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	1	5,040,000	20,160,000	25,200,000	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชตะพานหิน	พิจิตร	1	9.1	9.1	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ที่พิจารณาผลพร้อม ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	ประกาศครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา และประกาศใหม่ครั้งที่ 2	1
5	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น	1	5,040,000	20,160,000	25,200,000	รพ.หนองฉาง	อุทัยธานี	1	8	9.1	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ที่พิจารณาผลพร้อม ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างปิดซองราคา ใน วันที่ 30 มีนาคม 2564 ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐอนุมัติจ้างและ ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศผลผู้ ชนะ วันที่ 5 เมษายน 2564	1
เขตสุขภาพที่ 3		5	47,789,400	191,157,300	238,946,700			5					4

# รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>



## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 61 (บาท)	งบ ปี 62 (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารรังสีและผ่าตัดเป็นอาคารคสล.6 ชั้น	รพ. สวรรค์ประชารักษ์	481,460,000	116,192,800	29,930,400	157,437,400	177,899,400	19	19	17	2	345,206,820	136,253,180	ตรวจรับงวดที่ 16 วันที่ 23 ก.พ. 2564

## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพง เพชร	163,500,000	10,904,150	43,161,600	69,265,500	61,584,000	22	3	1	2	-	163,500,000	ลงนาม ในสัญญา 30 ก.ย. 63
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 1 หลัง	รพ. สวรรค์ ประชา รักษ์	349,400,000	22,001,325	77,009,700	275,011,500	-	18	5	3	2	28,650,800	320,749,200	งวดที่ 2 ตรวจรับ 23 ก.พ. 2564
3. สสจ. เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น 1 หลัง	สสจ. นครสว รรค์	32,960,000	7,583,700	30,334,500	-	-	8	6	4	2	9,789,120	23,170,880	ลงนาม ในสัญญา 15 ก.ค. 63



## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ที่ทำสัญญาใหม่

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วย 156 เตียง คสล. 8 ชั้น	รพ.กำแพงเพชร	62,200,000	6	6	6	-	40,430,000 (งวดที่ 1-5)	21,770,000 (งวดที่ 6 งวดสุดท้าย)  (งบบุคลากร โดยผลของ กฎหมาย เนื่องจากไม่ สามารถกันเงินฯ ภายใน 30 ก.ย. 63)	ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 29 มี.ค. 64 - ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) 21 ต.ค. 63  <b>*แนวทางแก้ไข</b> <b>1. ขอสนับสนุนจาก รพ.สปร. 20 ล้านบาท</b> <b>2. ใช้จ่ายบำรุง รพ.กำแพงเพชร 1,770,000 บาท</b>
2. อาคารผู้ป่วย นอกและอุบัติเหตุ คสล. 9 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	309,000,000	21	7	3	4	68,491,395  (งวดที่ 1 จำนวน 11,845,515 บาท งวดที่ 2 จำนวน 10,295,880 บาท และจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท)	240,508,605	ลงนามในสัญญา 10 ส.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม 2565 - จ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท - งบบุคลากรโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถ กันเงินฯภายใน 30 ก.ย. 63 จำนวน 47,790,878 บาท  <b>* สาเหตุความล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างติดปัญหา เรื่องไม่สามารถเพิ่มแรงงานได้ เนื่องจากติดปัญหาแรงงานข้ามจังหวัดไม่ได้</b>



Thank  
you
