

รายงานติดตามความก้าวหน้าการลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 403 รายการ วงเงิน 187,488,700 บาท


1. โดยวิธี E-bidding 341 รายการ เป็นเงิน 179,344,700 บาท

2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62 รายการ เป็นเงิน 8,144,000 บาท

รายการประจำปีเดียว
- ลงนามสัญญา
ภายใน 31 ธ.ค. ๖๖

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 403 รายการ

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน
■ ประกาศเชิญชวนแล้ว
■ ลงนามแล้ว

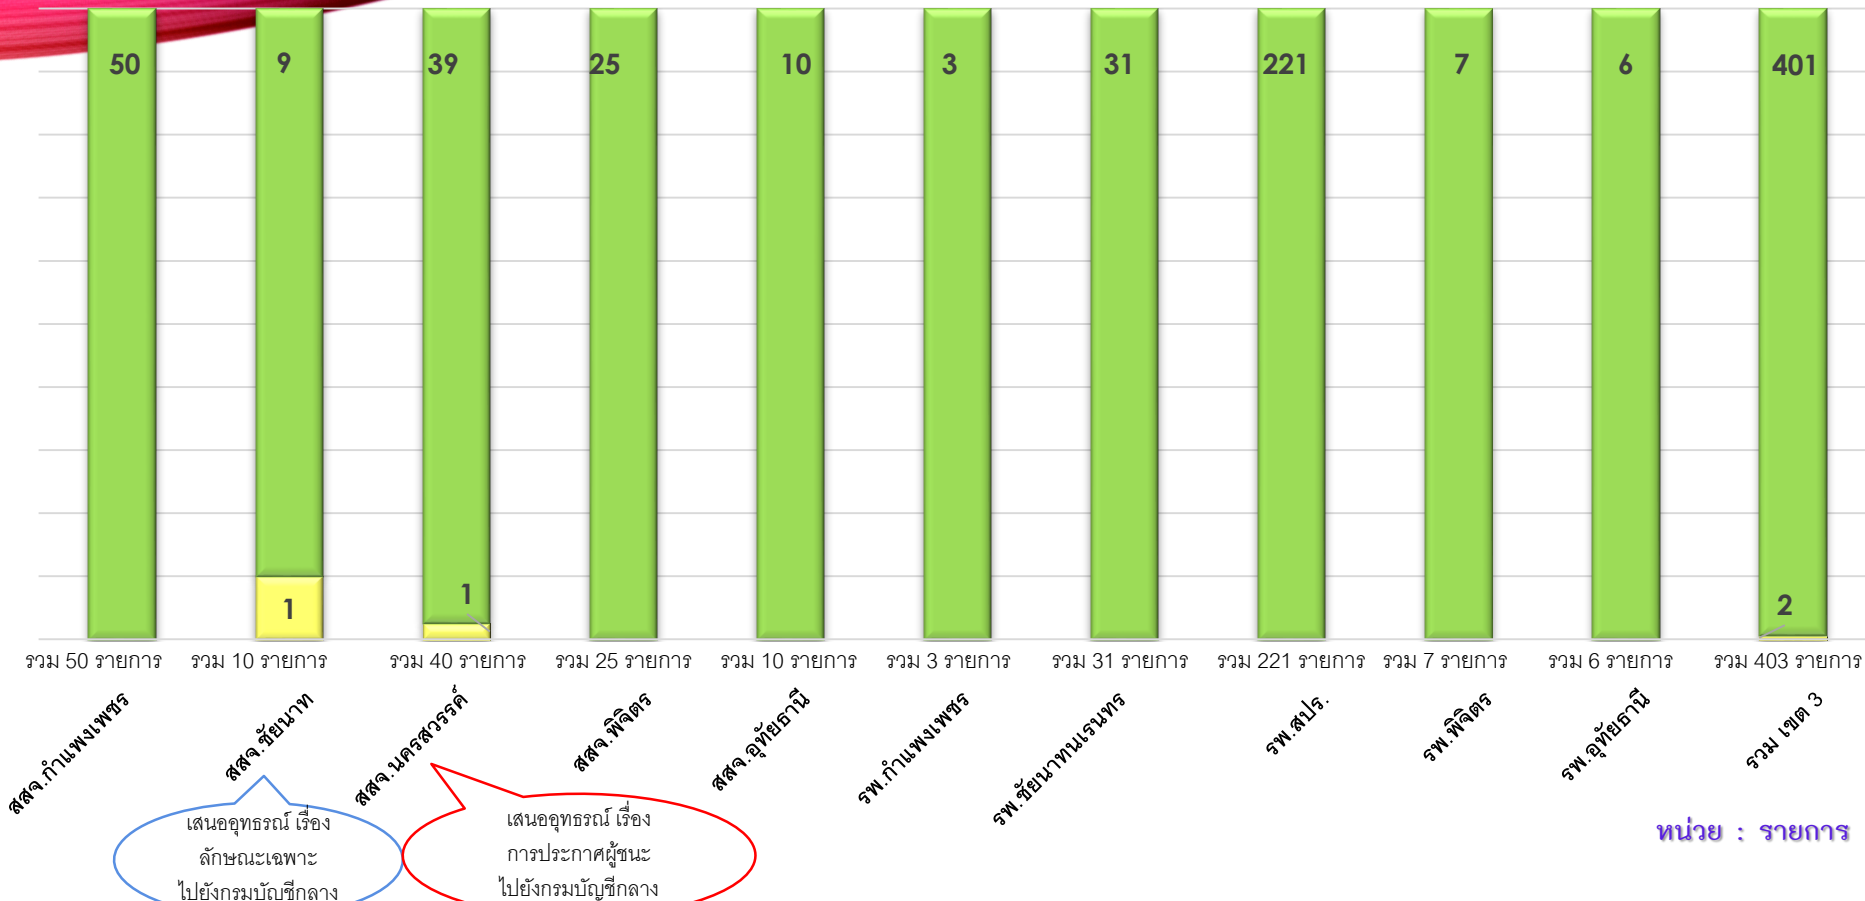

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 19 รายการ วงเงิน 121,938,200 บาท

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 17 รายการ รวมเป็นเงิน 100,602,300 บาท

1.1 โดยวิธี E-bidding 3 รายการ เป็นเงิน 82,325,900 บาท

1.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 รายการ เป็นเงิน 1,600,900 บาท

1.3 โดยวิธีตัดสั้วก 2 รายการ เป็นเงิน 16,675,500 บาท

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 21,335,900 บาท

1.1 โดยวิธี E-bidding 1 รายการ เป็นเงิน 13,042,000 บาท

1.2 โดยวิธีตัดสั้วก 1 รายการ เป็นเงิน 8,293,900 บาท

รายการประจำปีเดียว
- ลงนามสัญญา
ภายใน 31 ธ.ค. 64

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียวทั้งสิ้น 17 รายการ

- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว




คาดว่าจะลงนามในสัญญา
18 ก.พ. 65 (อำนาจผู้ว่าฯ)



หน่วย : รายการ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ทั้งสิ้น 2 รายการ

- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว

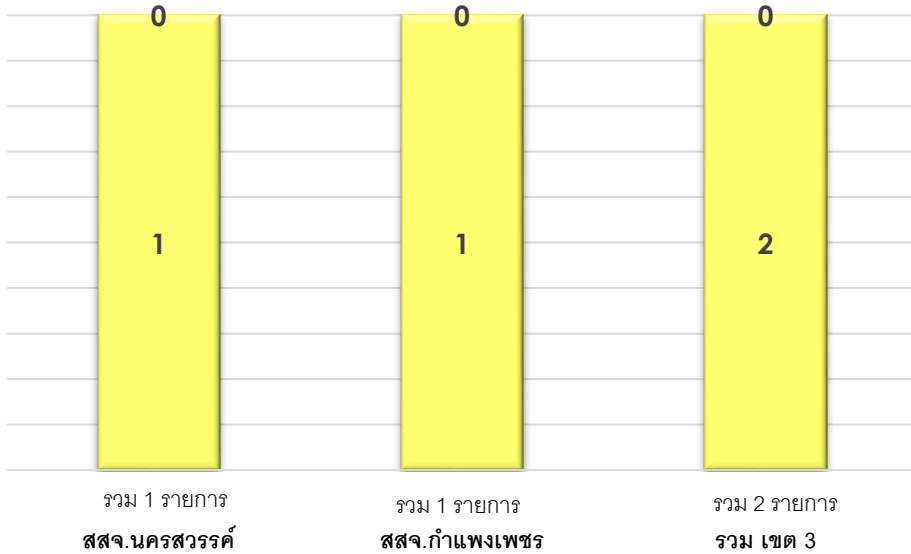


รายการก่อสร้างผูกพันใหม่
- ลงนามสัญญา
ภายใน 31 มี.ค. 65


วิธีคัดเลือก : ขั้นตอนที่ 8 ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาในระบบ e-GP เสนอรายงานผล
การอุทธรณ์ไปยังผู้ว่าฯ และรอสำนัก
งบประมาณอนุมัติให้ใช้ราคากลาง
เพื่อเรียกทำสัญญา

E-bidding : ขั้นตอนที่ 8 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอ
ราคาผ่านระบบ e-GP และมีผู้เสนอราคา 3 ราย
ผ่าน 2 ราย รอผู้ว่าฯ ลงนามรายงาน
ผลการพิจารณาประกวดราคาฯ

Time line อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,476 ตารางเมตร
โรงพยาบาลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ 41,469,500 บาท
งบประมาณ 2565 (งบผูกพันข้ามปี 2565 – 2566) ด้วยวิธีคัดเลือก

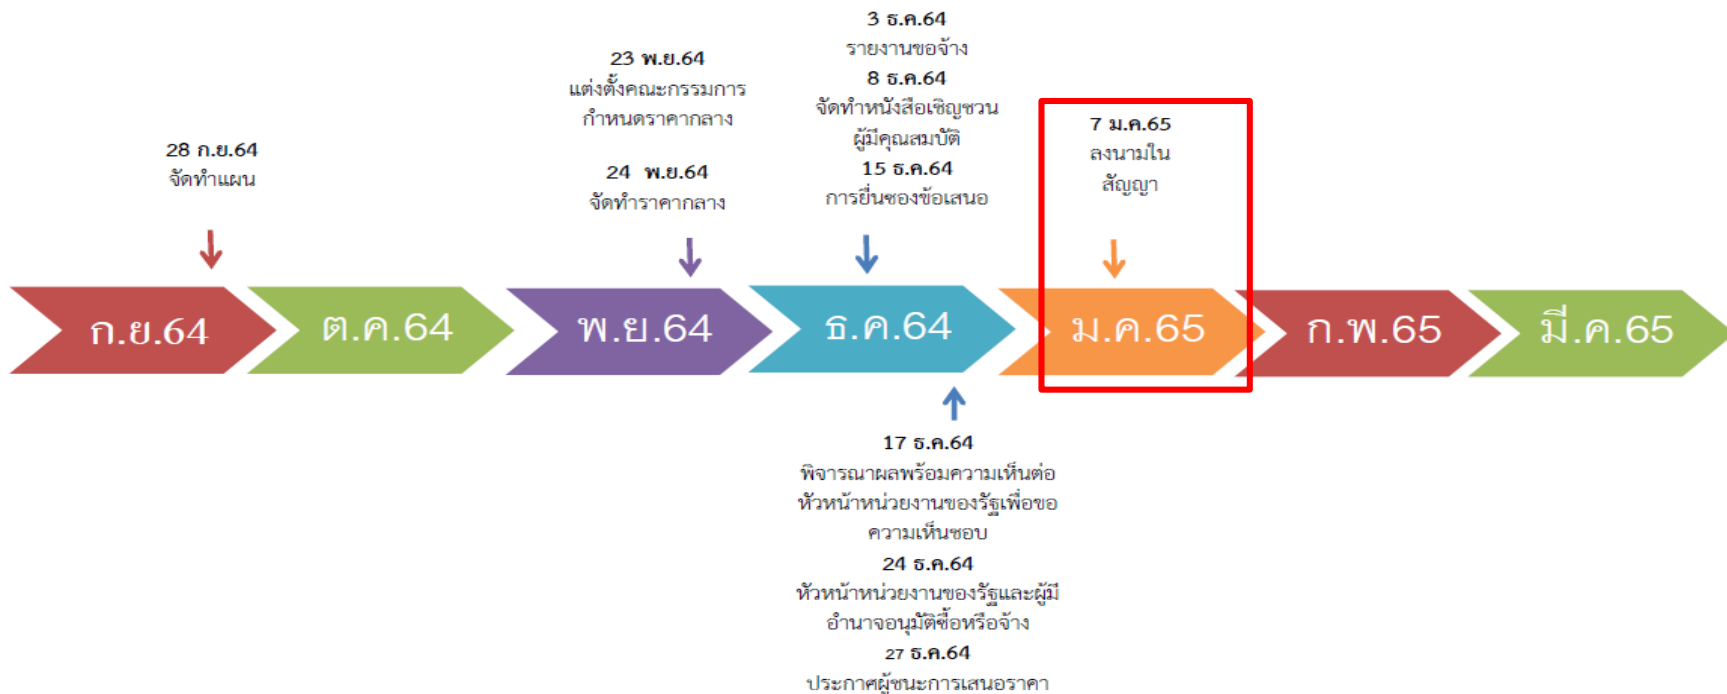

Time line ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร
 ที่โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง
 งบประมาณค่าก่อสร้าง 65,209,600.-บาท (งบผูกพัน 65-66) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

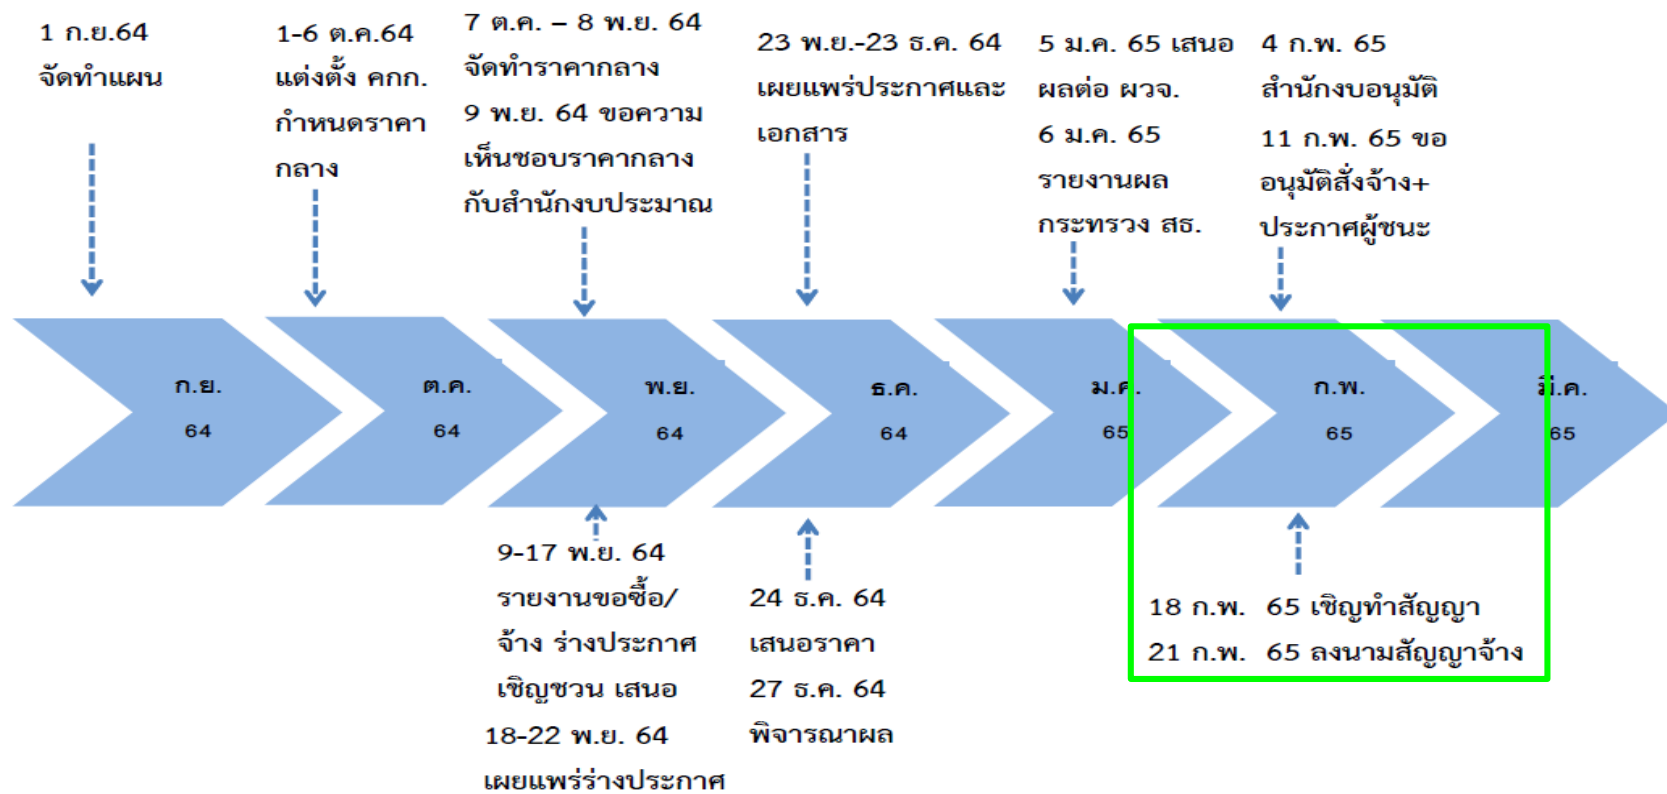

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค กบรส. สป.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 61 (บาท)	งบ ปี 62 (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารรังสีและผ่าตัดเป็นอาคารคสล.6 ชั้น	รพ. สวรรค์ประชาภิรักษ์	481,460,000	116,192,800	29,930,400	157,437,400	177,899,400	19	19	18	1	428,499,400	52,960,600	8 ธ.ค.64 แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 กำหนดค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 31 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคารคสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพงเพชร	163,500,000	10,904,300	43,616,600	24,253,500	84,725,600	22	11	2	9	24,050,850	139,449,150	ลงนามในสัญญา 30 ก.ย. 63
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 1 หลัง	รพ. สวรรค์ประชาภิรักษ์	349,400,000	22,001,325	77,009,700	275,011,500 (77,009,700)	-	18	15	13	2	215,579,800	133,820,200	

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุบัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วย 24 ยูนิต 4 ชั้น	รพ. ดาศลิ	25,200,000	5,040,000	20,160,000	-	9	4	1	3	-	25,200,000	
2. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	รพ. คลองขลุง	89,102,500	17,820,500	71,282,000	-	12	2	1	1	-	89,102,500	ส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป
3. อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	รพ. พิจิตร	74,244,200	14,848,900	59,395,300	-	10	5	2	3	1,512,252	72,731,948	
4. อาคารผู้ป่วย 24 ยูนิต 4 ชั้น	รพ. ตะพานหิน	25,200,000	5,040,000	20,160,000	-	9	5	4	1	5,115,000	20,085,000	
5. อาคารผู้ป่วย 24 ยูนิต 4 ชั้น	รพ. หนองฉาง	25,200,000	5,040,000	20,160,000	-	9	4	1	3	-	25,200,000	

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ที่ทำสัญญาใหม่

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วย นอกและ อุบัติเหตุ คสล. 9 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	309,000,000	21	18	14	4	211,444,065 บาท (งวดที่ 1-14 จำนวน 165,094,065 บาท และจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท)	97,555,935 บาท	ลงนามในสัญญา 10 ส.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 17 เมษายน 2565 - จ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท - งบถูกพับโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากไม่ สามารถกันเงินภายใน 30 ก.ย. 63 จำนวน 47,790,878 บาท



Thank
you

