



รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 791 รายการ วงเงิน 266,010,000 บาท


1. โดยวิธี E-bidding 401 รายการ เป็นเงิน 244,481,800 บาท

2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 389 รายการ เป็นเงิน 19,170,200 บาท

3. โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ เป็นเงิน 2,358,000 บาท

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 791 รายการ

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน
■ ประกาศเชิญชวนแล้ว
■ ลงนามแล้ว

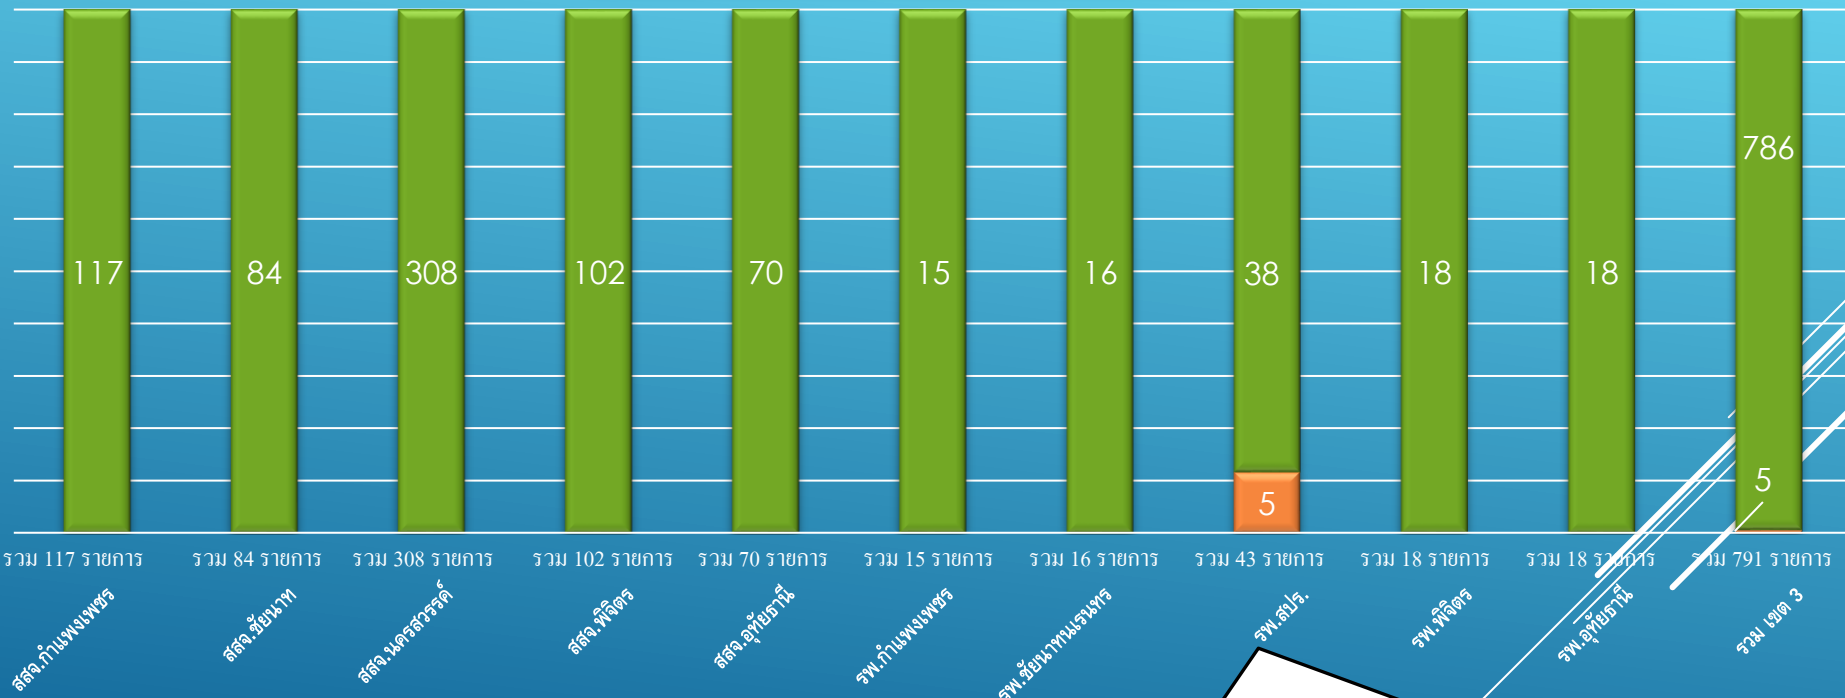

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์
 ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง
 (ประกาศผู้ชนะ วันที่ 4 ม.ค. 66 และได้รับการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66
 ซึ่ง คกก. พิจารณาไม่เห็นด้วย จึงส่งเอกสารให้ คกก. พิจารณาอุทธรณ์
 กรมบัญชีกลาง)


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 31 รายการ วงเงิน 599,993,900 บาท

1. สิ่งก่อสร้างพิเศษ จำนวน 25 รายการ รวมเป็นเงิน 63,716,200 บาท
 - 1.1 โดยวิธี E-bidding 19 รายการ เป็นเงิน 59,541,800 บาท
 - 1.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 รายการ เป็นเงิน 4,174,400 บาท
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 536,277,700 บาท
 - 2.1 โดยวิธี E-bidding 6 รายการ เป็นเงิน 536,277,700 บาท

หน่วย : รายการ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียวทั้งสิ้น 25 รายการ

- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว

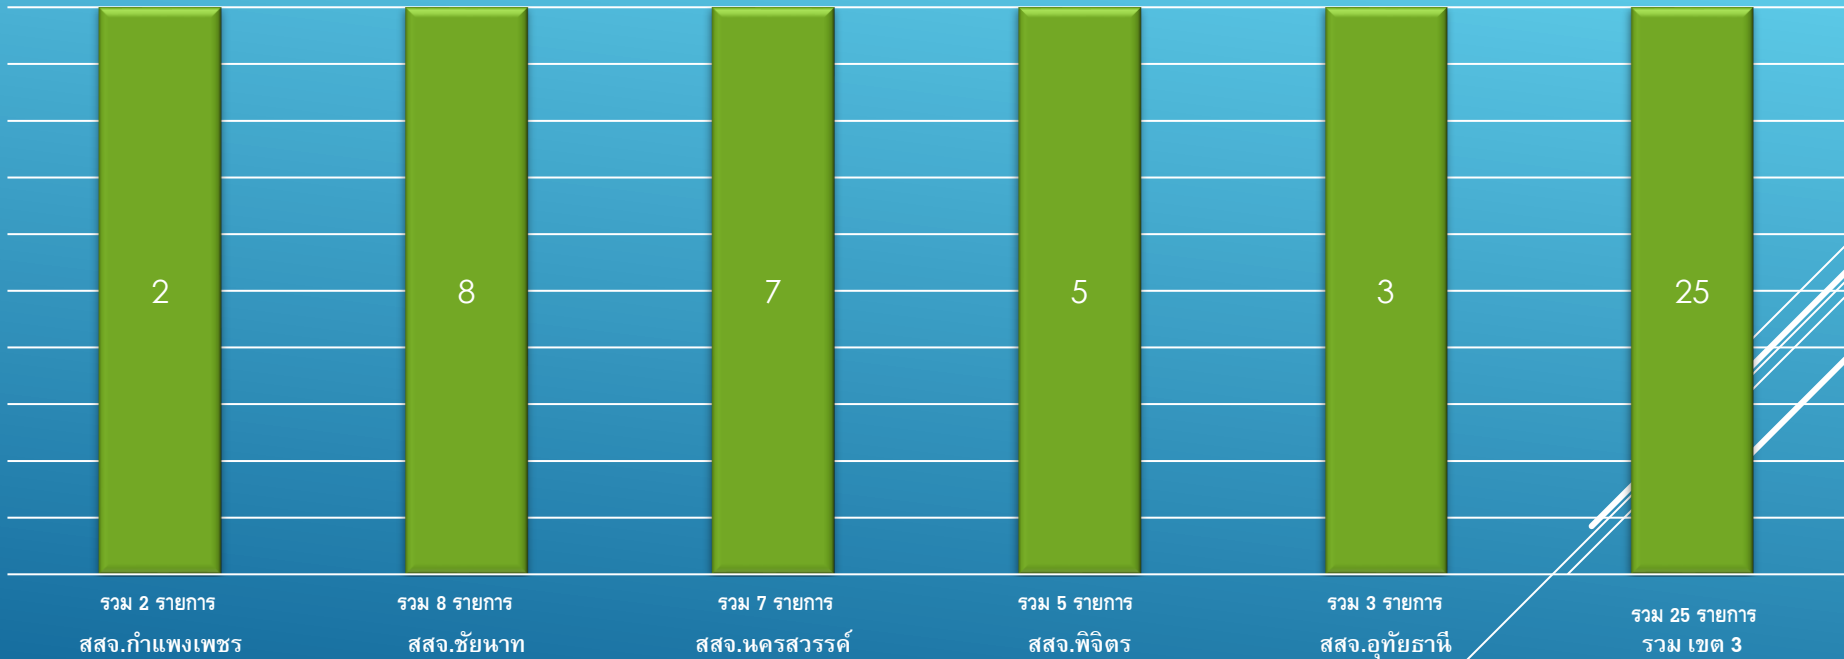


รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ทั้งสิ้น 6 รายการ

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน
■ ประกาศเชิญชวนแล้ว
■ ลงนามแล้ว

หน่วย : รายการ

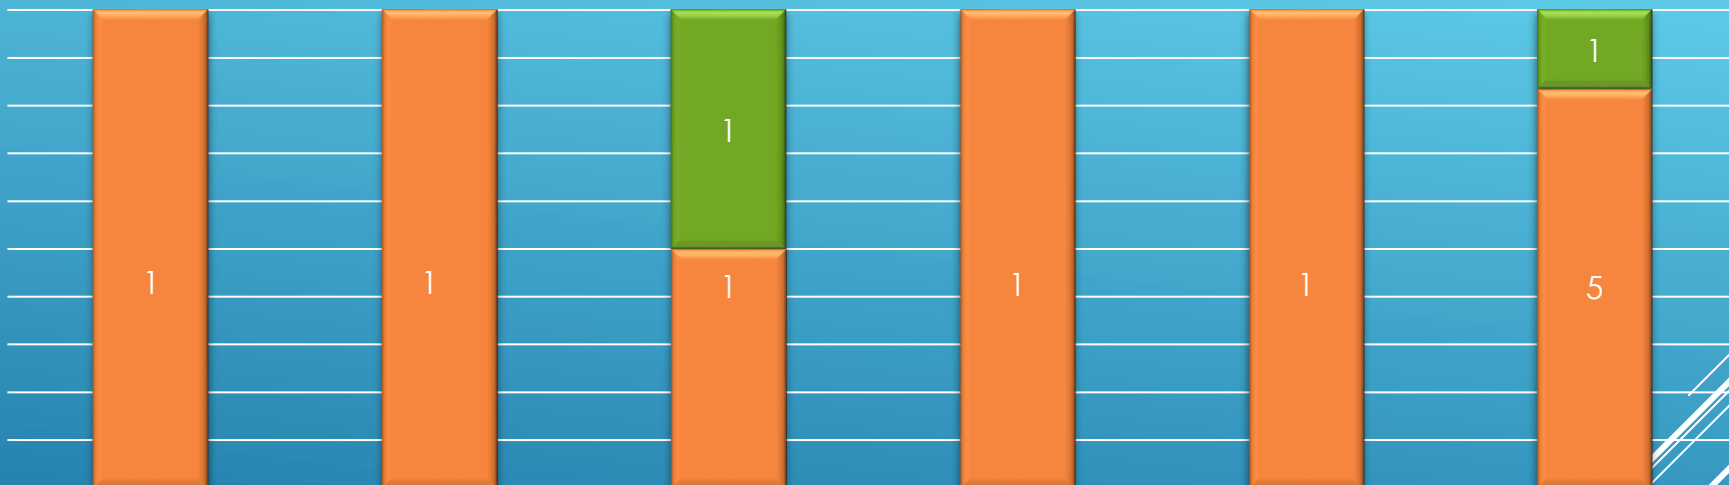

รวม 1 รายการ
 สสจ.กำแพงเพชร

- อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น
 รพ. ไทรงาม (เว้นระยะเวลา
 อุทธรณ์ ก่อนการลงนาม
 ในสัญญา)

รวม 1 รายการ
 สสจ.พิจิตร

- อาคารคลอด พักผู้ป่วยใน
 90 เตียง 4 ชั้น รพ. บางมูลนาก
 (เว้นระยะเวลาอุทธรณ์
 ก่อนการลงนามในสัญญา)

รวม 2 รายการ
 รพ.พิจิตร

- อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม
 และพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น
 (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ในระบบ e-GP)
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย
 ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รวม 1 รายการ
 รพ.ชัยนาทเนรท

- อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 คลินิกพิเศษและส่งเสริม
 สุขภาพ 5 ชั้น
 (คณะกรรมการพิจารณา
 ผลการประกวดราคาฯ)

รวม 1 รายการ
 สนง.เขตสุขภาพที่ 3

- อาคารสำนักงานเขต 4 ชั้น
 (เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนาม
 ในสัญญา)

รวม 6 รายการ
 รวม เขต 2



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค กบรส. สป.

เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>





รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1. อาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพง เพชร	163,500,000	10,904,300	43,616,600	24,253,500	84,725,600	22	22	15	7	86,131,800	77,368,200

หมายเหตุ

- ขยายเวลาก่อสร้างสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566
- ล่าช้าเนื่องจาก มีการปรับแบบรูปรายการ และมีการแก้ไขสัญญา

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย 4 ชั้น	รพ. ตาคลี	25,200,000	5,040,000	20,160,000	9	8	5	3	6,287,256.85	18,912,743.15	- เบิกจ่ายล่วงหน้า 9,531,000 บ. - ขยายเวลาก่อสร้างสิ้นสุด 4 ส.ค. 2566 - งบปี 64 จำนวน 2,745,873.15 บาท จะตั้งค่าขอในงบปี 2567
2. อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ 4 ชั้น	รพ. คลองขลุง	89,102,500	17,820,500	71,282,000	12	8	3	5	6,704,984	82,397,516	- คกก. บริหารสัญญา ให้ผู้รับจ้างส่งแผน MANDAY ติดตามเดือนละ 2 ครั้ง - แก้ไขสัญญา ค่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2566 ถึง 9 ธ.ค. 67 ที่เหลือคิดอัตราปกติ - ส่งงวด 2 วันที่ 28 มี.ค. 66 - งบปี 64 จำนวน 16,827,516 บาท จะตั้งค่าขอในงบปี 2567
3. อาคารสนับสนุน บริการ 5 ชั้น	รพ. พิจิตร	74,244,200	14,848,900	59,395,300	10	10	8	2	40,154,043	32,090,157	- มีการปรับแบบผังอาคารใช้งาน - กำหนดส่งงานงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย วันที่ 31 ส.ค. 66) และจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66 - คกก. ตรวจสอบการจ้าง ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
4. อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย 4 ชั้น	รพ.ร. ตะพานหิน	25,200,000	5,040,000	20,160,000	9	9	7	2	11,392,500	13,807,500	- มีปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้งาน หลายแห่งและขาดสภาพคล่อง - ได้รับสิทธิ์ค่าปรับ ร้อยละ 0
5. อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย 4 ชั้น	รพ.หนองฉาง	25,200,000	5,040,000	20,160,000	9	9	7	2	11,152,192	14,047,808	- ได้รับสิทธิ์ค่าปรับ ร้อยละ 0 ตามมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 - ก่อสร้างสิ้นสุด 5 ส.ค. 2566

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวดงาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุบัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	รพ. โกรกพระ	41,469,500	8,293,900	33,175,600	11	11	6	5	10,402,842.29	31,066,657.71	- ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
2. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	รพ. คลองลาน	65,209,600	13,042,000	52,167,600	10	9	8	2	22,736,800	42,472,800	

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) **ที่ทำสัญญาใหม่**

รายการ	สถานที่	งบประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น	รพ.สวรงค์ประชารักษ์	89,000,000	5	5	1	4	8,900,000	80,100,000	<ul style="list-style-type: none">- เริ่มงาน วันที่ 21 ก.พ. 66- สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ก.ค. 66- ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพัน เป็นปีงบประมาณ 2561-2566- เบิกจ่ายจากงบเงินบำรุง
