


รายงานความก้าวหน้าติดตามงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
เวลา 15.00 น.



# งบลงทุนรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

## รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

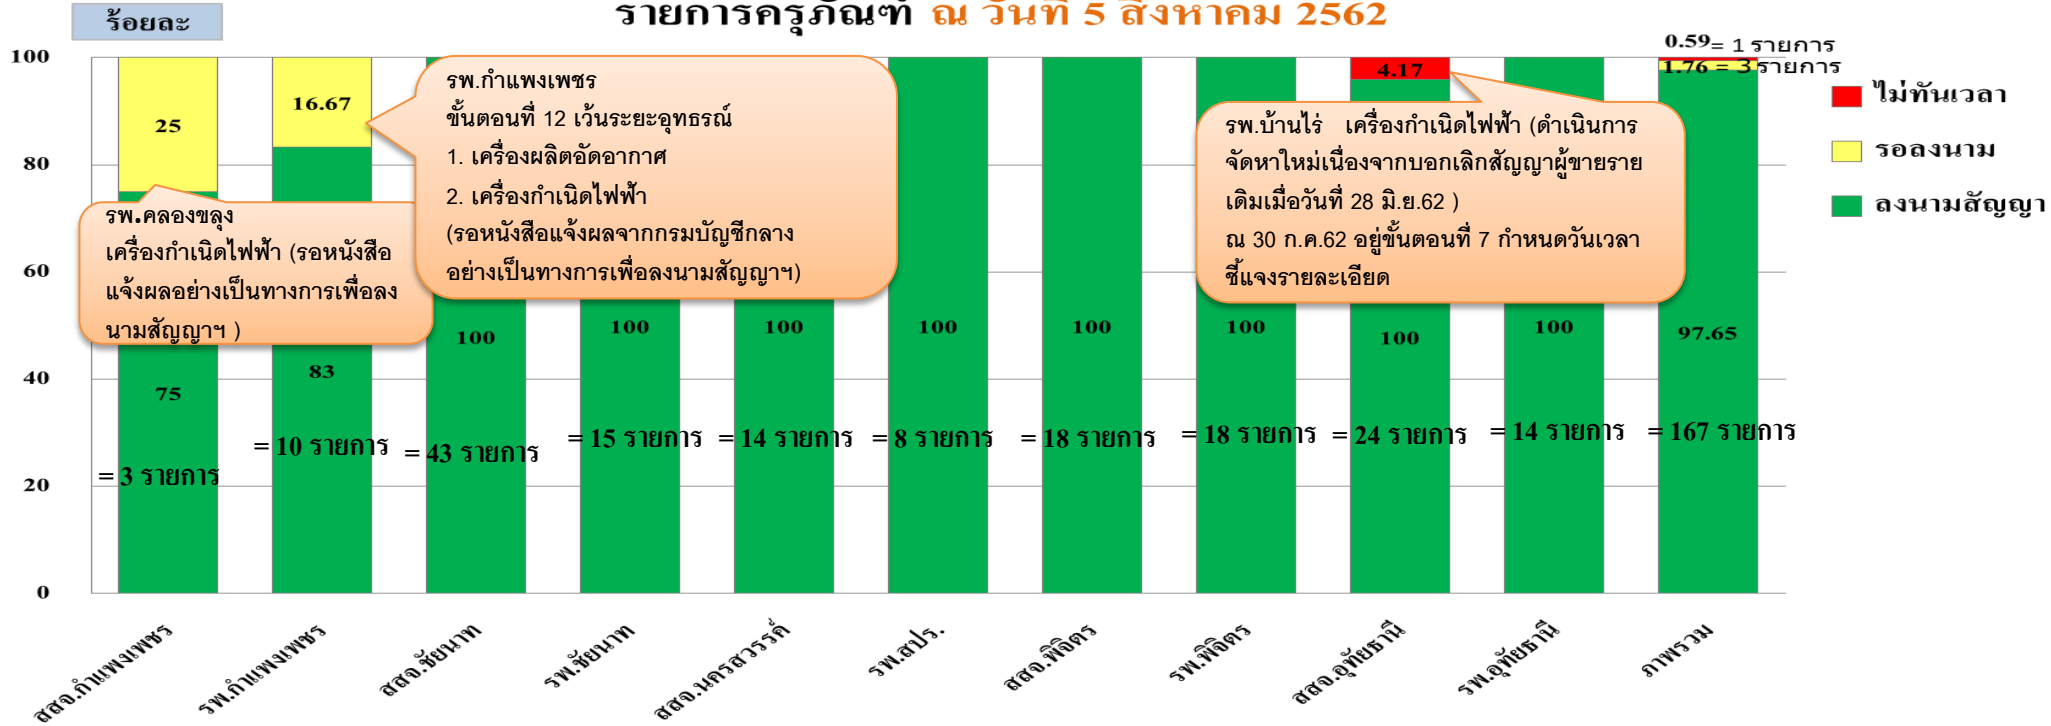

### รายการครุภัณฑ์ที่ล่าช้า และที่ขอยกเลิกสัญญา

| ลำดับ                 | รายการสิ่งก่อสร้าง/รายการครุภัณฑ์                             | วงเงินงบประมาณ       | ระบบขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง      |                 |   | สาเหตุล่าช้า   |
|-----------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|---|--|
|                       |   |                      | ขั้นตอนล่าสุดที่                   | ขั้นตอนปัจจุบัน | การดำเนินการ  |  |
| <b>กำแพงเพชร</b>      |   |                      |                                    |                 |   |  |
| 1                     | รพ.คลองขลุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  | 3,550,000            | ขั้นตอนที่ 12 ตั้งแต่เดือน พ.ค. 62 | 12              | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา/รอดลงนามสัญญา | ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง   |
| 2                     | รพ.กำแพงเพชร เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์                   | 1,400,000            |                                    |                 |   |  |
| 3                     | รพ.กำแพงเพชร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ | 3,550,000            |                                    |                 |   |  |
| <b>อุทัยธานี</b>      |   |                      |                                    |                 |   |  |
| 3                     | รพ.บ้านไร่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์   | 1,700,000            | 13                                 | 7               | กำหนดวันเวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม                 | ขอยกเลิกสัญญาเดิม และดำเนินการจัดหาใหม่เนื่องจากบอกลิขสัญญาผู้ขายรายเดิมเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 |
| <b>เขตสุขภาพที่ 3</b> |   | <b>10,200,000.00</b> |                                    |                 |   |  |

# การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562




# การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

## รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ร้อยละ

■ ร้อยละการเบิกจ่าย

\*\*\*รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

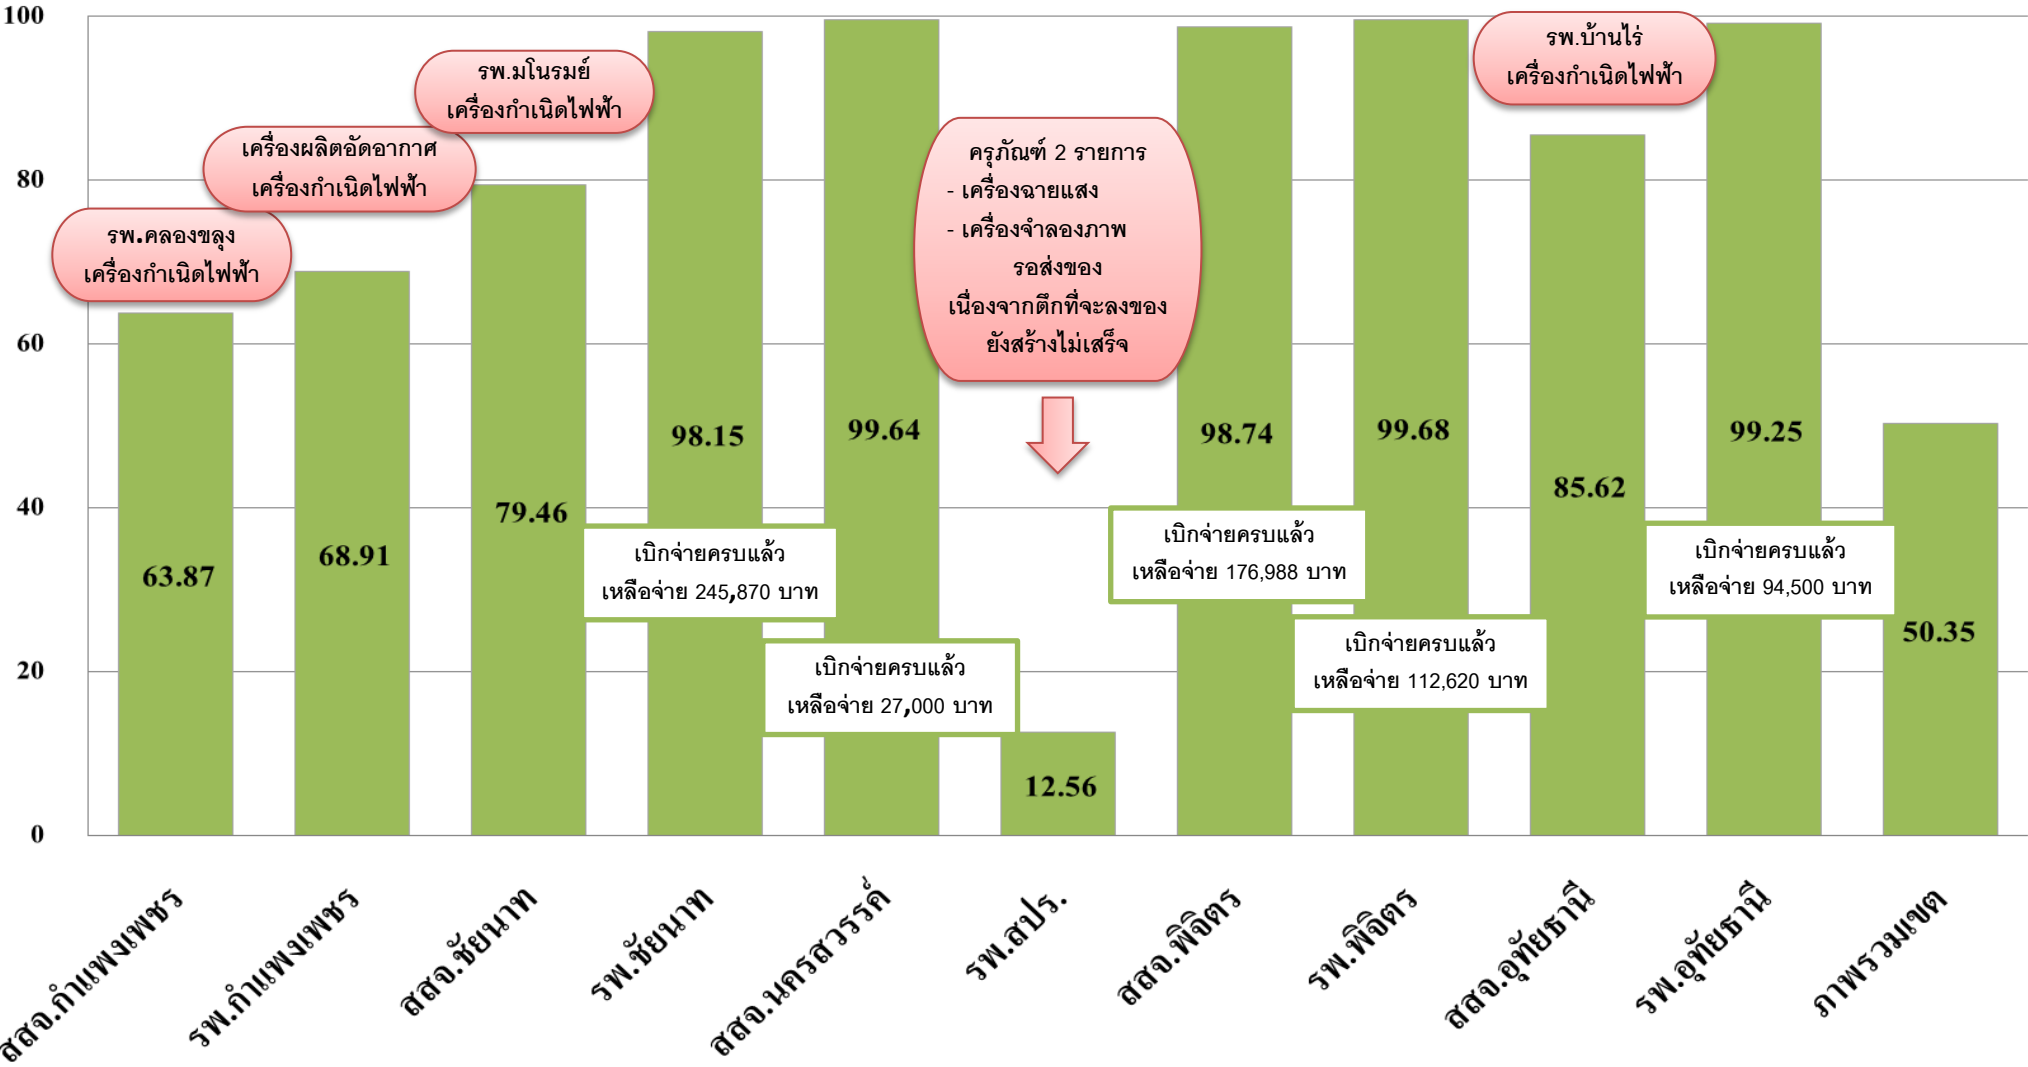

# การเบิกจ่ายงบลงทุนแยกรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

| จังหวัด       | ครุภัณฑ์       |                |        | สิ่งก่อสร้าง            |              |        |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|--------------|--------|
|               | วงเงินงบประมาณ | เบิกจ่ายจริง   |        | วงเงินงบประมาณ          | เบิกจ่ายจริง |        |
|               |                | จำนวนเงิน      | ร้อยละ |                         | จำนวนเงิน    | ร้อยละ |
| สสจ.กำแพงเพชร | 9,850,000.00   | 6,291,000.00   | 63.87  | 3,583,400               | -            | 0      |
| รพ.กำแพงเพชร  | 16,390,000.00  | 11,294,000.00  | 68.91  | ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร |              |        |
| สสจ.ชัยนาท    | 13,725,000.00  | 10,906,130.00  | 79.46  | 12,710,700              | -            | 0      |
| รพ.ชัยนาท     | 13,320,000.00  | 13,074,130.00  | 98.15  | ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร |              |        |
| สสจ.นครสวรรค์ | 7,478,000.00   | 7,451,000.00   | 99.64  | 9,380,400               | -            | 0      |
| รพ.สปร.       | 142,980,000.00 | 17,961,930.00  | 12.56  | ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร |              |        |
| สสจ.พิจิตร    | 14,080,000.00  | 13,903,012.00  | 98.74  | 21,974,600              | -            | 0      |
| รพ.พิจิตร     | 35,020,000.00  | 34,907,380.00  | 99.68  | ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร |              |        |
| สสจ.อุทัยธานี | 12,457,000.00  | 10,666,050.00  | 85.62  | 22,192,800              | -            | 0      |
| รพ.อุทัยธานี  | 14,590,000.00  | 14,480,500.00  | 99.25  | ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร |              |        |
| ภาพรวม        | 279,890,000.00 | 140,935,132.00 | 50.35  | 69,841,900              | -            | 0      |

\*หมายเหตุ ครุภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท รวมรายการ PCC

# รายการสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างล่าช้า และถูกยกเลิกสัญญา

| ลำดับ | รายการสิ่งก่อสร้าง/รายการครุภัณฑ์       | งบประมาณ<br>ปี 62<br>(บาท) | สถานที่                 | จังหวัด   | ล่าช้า | จำนวน<br>งวดงาน<br>ทั้งหมด | งวดงาน<br>ตามแผน<br>วันที่ 5 ส.ค.62 | งวดงาน<br>ปัจจุบัน<br>ที่กำลังดำเนินก | สรุปการจัดจ้าง<br>/ปัญหาอุปสรรค   |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1     | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | 1,159,400.00               | รพ.สต.กะบะเคี้ย         | ชัยนาท    | ✓      | 5                          | 5                                   | 2                                     | ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  |
| 2     | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | 1,159,400.00               | รพ.สต.บ้านดอนสนवल       | ชัยนาท    | ✓      | 5                          | 5                                   | 2                                     | ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  |
| 3     | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | 1,159,400.00               | รพ.สต.บ้านหางน้ำหนองแขม | ชัยนาท    | ✓      | 5                          | 5                                   | 3                                     | ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  |
| 4     | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) | 1,210,100.00               | รพ.สต.หนองมะโมง         | ชัยนาท    | ✓      | 5                          | 5                                   | 2                                     | ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  |
| 5     | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | 1,159,400.00               | รพ.สต.โพนางคำตก         | ชัยนาท    | ✓      | 5                          | 5                                   | 2                                     | ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  |
| 6     | อาคารพัสดุ 2 ชั้น                       | 6,863,000.00               | สสจ.ชัยนาท              | ชัยนาท    | ✓      | 6                          | 6                                   | 2                                     | ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  |
| 7     | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ             | 3,583,400.00               | สสอ.พยุหะคีรี           | นครสวรรค์ | ✓      | 6                          | 5                                   | 4                                     | ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มก่อสร้างล่าช้า และขาดสภาพคล่อง                      |
| 8     | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ             | 3,583,400.00               | สสอ.ดงเจริญ             | พิจิตร    | ✓      | 6                          | 5                                   | 4                                     | ตรวจรับงานงวดที่ 4 และ 5 (31 ก.ค.62) ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มก่อสร้างล่าช้า |
| 9     | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ             | 3,583,400.00               | สสอ.วชิรบารมี           | พิจิตร    | ✓      | 6                          | 5                                   | 4                                     | ตรวจรับงานงวดที่ 4 และ 5 (31 ก.ค.62) ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มก่อสร้างล่าช้า |
| 10    | อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)    | 13,011,000.00              | สสจ.อุทัยธานี           | อุทัยธานี | ✓      | 10                         | 0                                   | 0                                     | กำหนดเสนอราคาวันที่ 19 ส.ค.2562 และพิจารณาผลวันที่ 20 ส.ค.2562                    |
| 11    | อาคารพัสดุ 2 ชั้น                       | 6,863,000.00               | สสจ.อุทัยธานี           | อุทัยธานี | ✓      | 6                          | 2                                   | 1                                     | แก้ไขฐานราก เสร็จสิ้นแล้วประมาณ   |
|       | รวม                                     | 43,334,900.00              |                         |           |        |                            |                                     |                                       |   |



ขอบคุณครับ

