



**รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>





ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์  
รวมทั้งสิ้น 442 รายการ วงเงิน 315,687,300 บาท

1. โดยวิธี E-bidding 335 รายการ เป็นเงิน 276,794,000 บาท

2. โดยวิธีคัดเลือก 6 รายการ เป็นเงิน 14,582,400 บาท


3. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101 รายการ เป็นเงิน 24,310,900 บาท



รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3  
รายการครุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 442 รายการ


- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

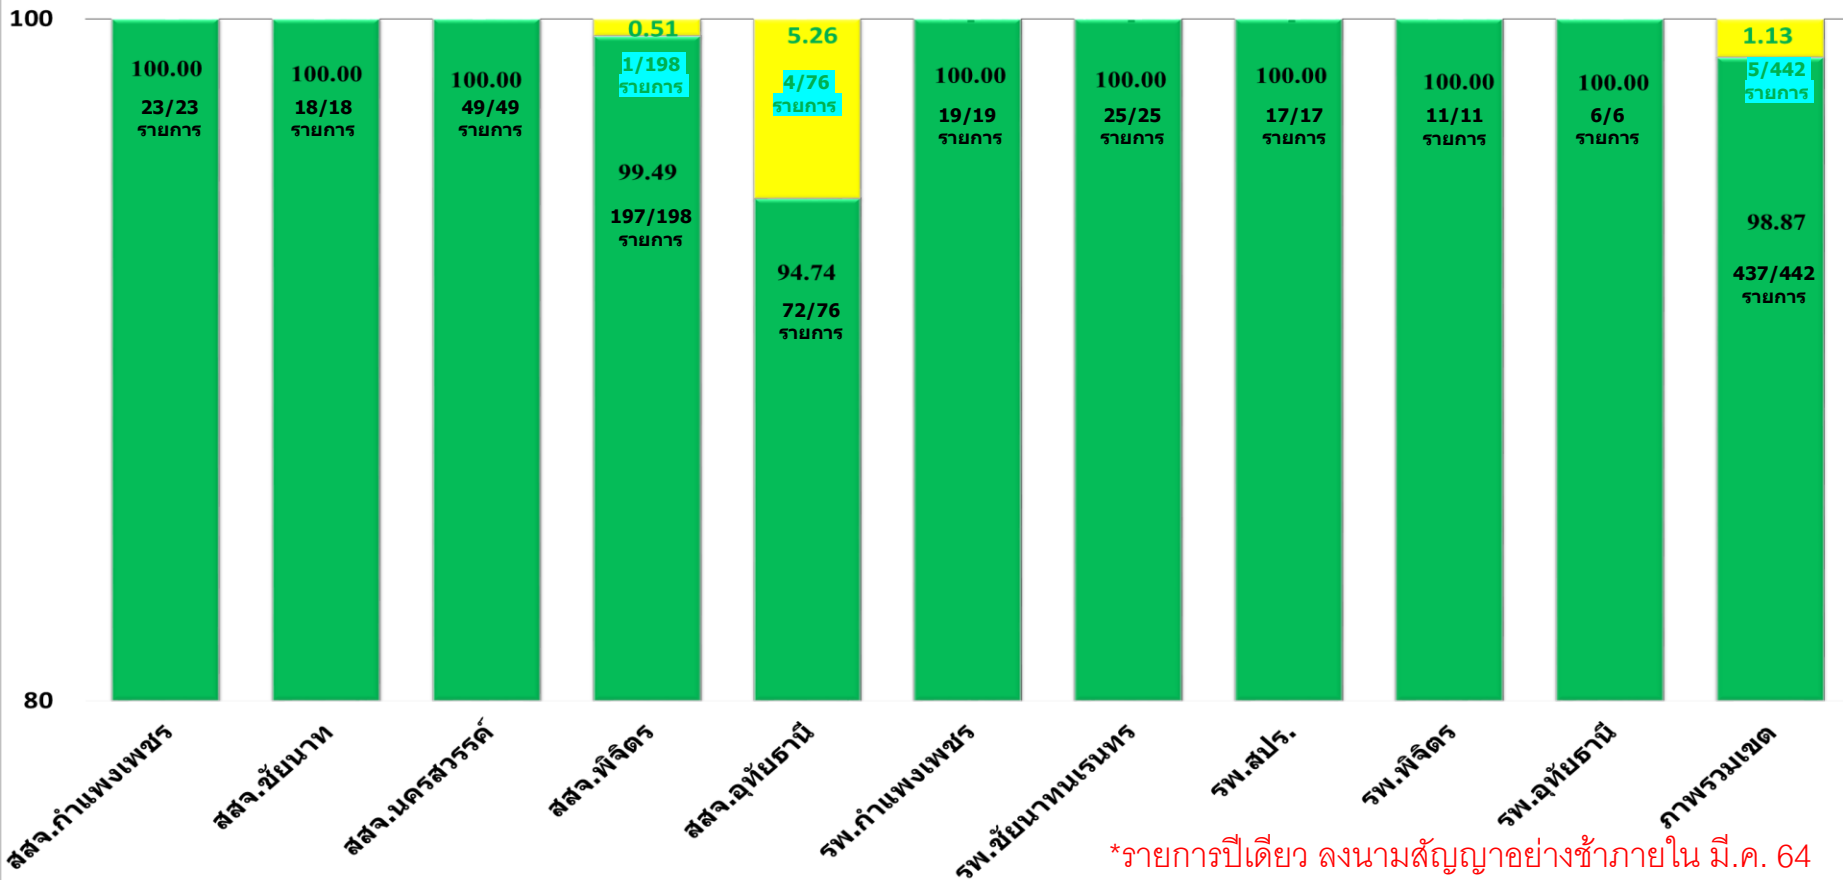



\*รายการปีเดียว ลงนามสัญญาอย่างช้าภายใน มี.ค. 64





**ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง  
รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 281,011,900 บาท**

- 
1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 73 รายการ รวมเป็นเงิน 233,222,500 บาท
    - 1.1 โดยวิธี E-bidding 64 รายการ เป็นเงิน 220,168,900 บาท
    - 1.2 โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ เป็นเงิน 9,866,000 บาท
    - 1.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ เป็นเงิน 3,187,600 บาท


- 
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน โดยวิธี E-bidding 5 รายการ  
รวมเป็นเงิน 47,789,400 บาท

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

## รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว **รวมทั้งสิ้น 73 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

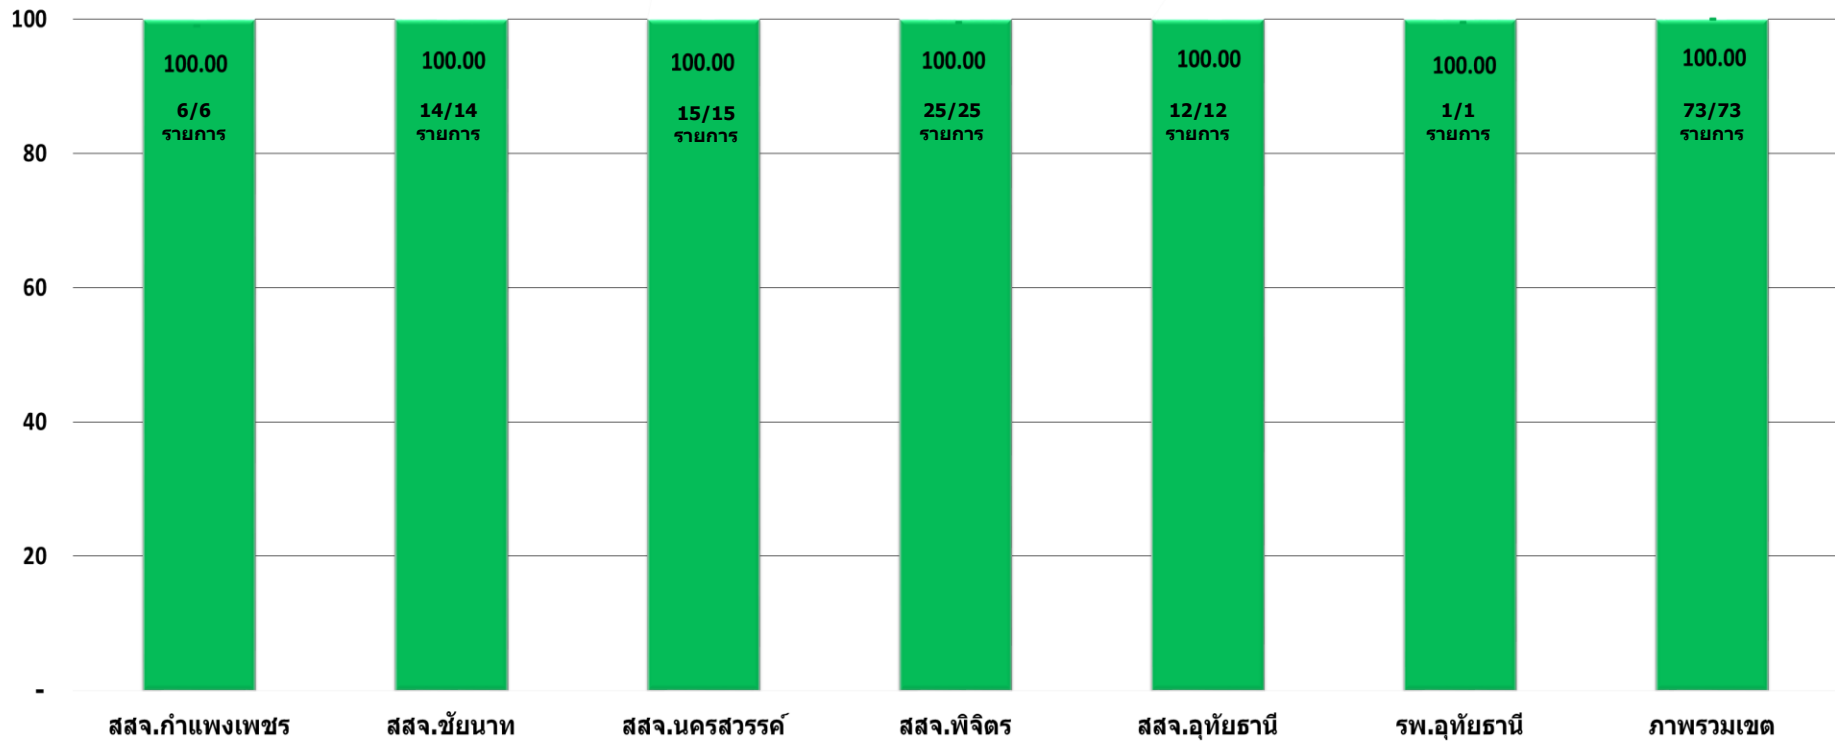


สิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างลงทุน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

## รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน **รวมทั้งสิ้น 5 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

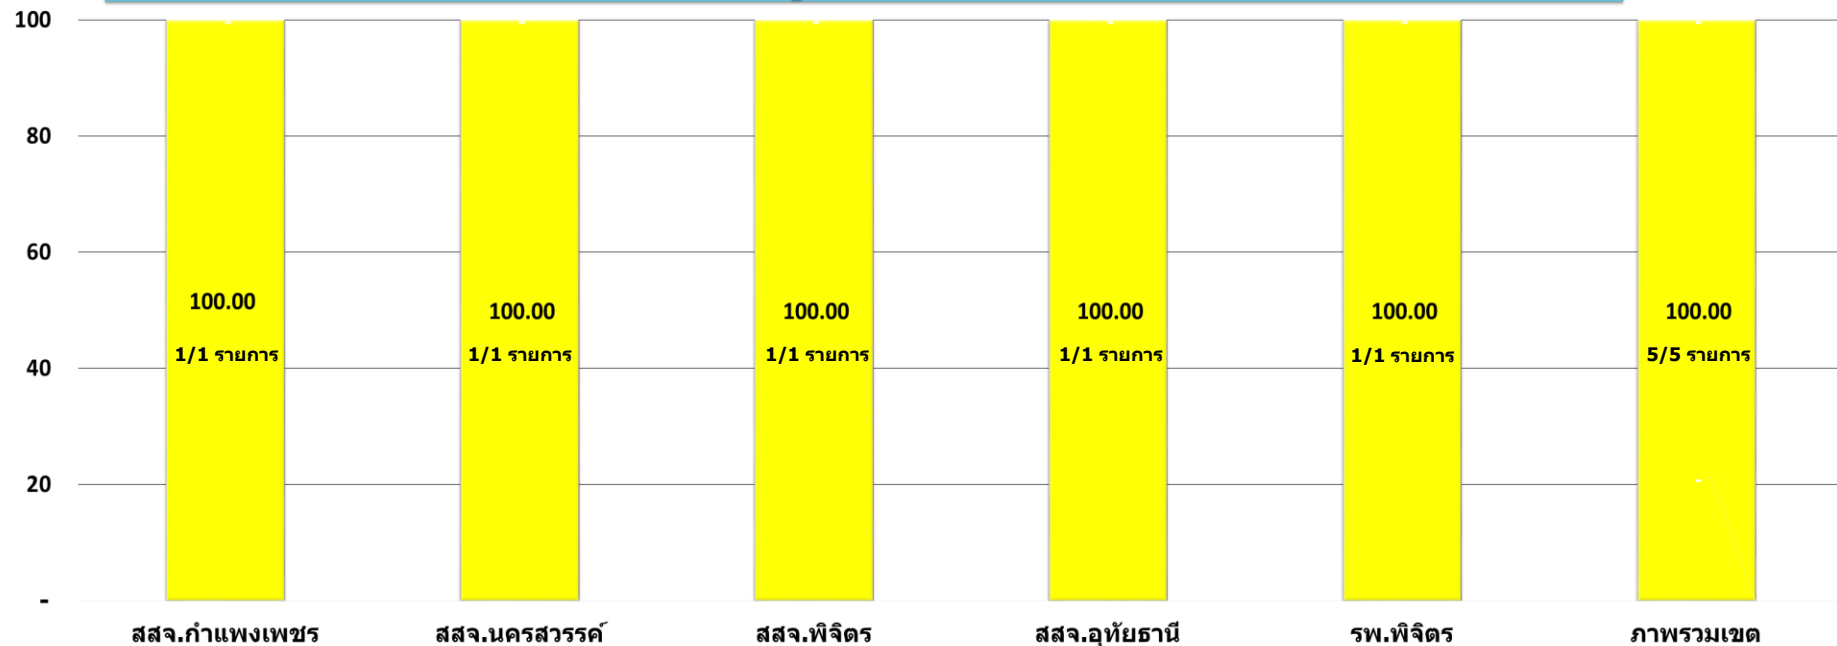

\*รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ลงนามสัญญาอย่างช้าภายใน มี.ค. 64



# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		รวมเงิน	สถานที่	จังหวัด	จัดซื้อ วิธี E-bidding	ระบุนขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง			สาเหตุความล่าช้า	ได้ผู้รับจ้าง
			งบประมาณ	ผูกพัน					ขั้นตอน สัปดาห์ที่แล้ว	ขั้นตอน ปัจจุบัน	การดำเนินการ		
1	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	1	14,848,900	59,395,300	74,244,200	รพ. พิจิตร	พิจิตร	1	8	10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/ เห็นชอบผลการพิจารณา	อยู่ระหว่างให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบราคาค่าก่อสร้าง	1
2	อาคารผู้พยาบาล-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น	1	17,820,500	71,282,000	89,102,500	รพ.คลองขลุง	กำแพงเพชร	1	9.1	10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/ เห็นชอบผลการพิจารณา	กำหนดวันเสนอราคา 23 มี.ค. 64	1
3	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น	1	5,040,000	20,160,000	25,200,000	รพ.ตากสิน	นครสวรรค์	1	9.1	10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/ เห็นชอบผลการพิจารณา		1
4	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	1	5,040,000	20,160,000	25,200,000	รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	พิจิตร	1	9.1	10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/ เห็นชอบผลการพิจารณา	ประกาศครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และประกาศใหม่ครั้งที่ 2	1
5	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น	1	5,040,000	20,160,000	25,200,000	รพ.หนองฉาง	อุทัยธานี	1	9.1	10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/ เห็นชอบผลการพิจารณา	มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างนัดต่อรองราคา ในวันที่ 30 มี.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติจ้างและประกาศผลผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 5 เม.ย. 64 ส่งเรื่องให้ สป.ขออนุมัติวงเงิน วัน 5 เม.ย.64 รอ สป. แจ้งจังหวัดฯ	1
เขตสุขภาพที่ 3		5	47,789,400	191,157,300	238,946,700			5					5



# รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>



## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 61 (บาท)	งบ ปี 62 (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารรังสีและผ่าตัดเป็นอาคารคสล.6 ชั้น	รพ. สวรรค์ประชาวิทย์	481,460,000	116,192,800	29,930,400	157,437,400	177,899,400	19	19	17	2	345,206,820	136,253,180	ตรวจรับงวดที่ 16 วันที่ 23 ก.พ. 2564

## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพง เพชร	163,500,000	10,904,150	43,161,600	69,265,500	61,584,000	22	3	1	2	-	163,500,000	ลงนาม ในสัญญา 30 ก.ย. 63
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 1 หลัง	รพ. สวรรค์ ประชา รักษ์	349,400,000	22,001,325	77,009,700	275,011,500	-	18	6	3	3	28,650,800	320,749,200	งวดที่ 2 ตรวจรับ 23 ก.พ. 2564
3. สสจ. เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น 1 หลัง	สสจ. นครสว ร์ค์	32,960,000	7,583,700	30,334,500	-	-	8	6	4	2	9,789,120	23,170,880	ลงนาม ในสัญญา 15 ก.ค. 63



## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ที่ทำสัญญาใหม่

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วย 156 เตียง คสล. 8 ชั้น	รพ.กำแพงเพชร	62,200,000	6	6	6	-	40,430,000 (งวดที่ 1-5)	21,770,000 (งวดที่ 6 งวดสุดท้าย)  (งบบุคลากร โดยผลของ กฎหมาย เนื่องจากไม่ สามารถกันเงินฯ ภายใน 30 ก.ย. 63)	ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 29 มี.ค. 64 - ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) 21 ต.ค. 63  <b>*แนวทางแก้ไข</b> <b>1. ขอสับสนับสนุนจาก รพ.สปร. 20 ล้านบาท</b> <b>2. ใช้จ่ายบำรุง รพ.กำแพงเพชร 1,770,000 บาท</b>
2. อาคารผู้ป่วย นอกและอุบัติเหตุ คสล. 9 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	309,000,000	21	7	5	2	87,691,110  (งวดที่ 1 จำนวน 11,845,515 บาท งวดที่ 2 จำนวน 10,295,880 บาท งวดที่ 3 จำนวน 9,376,605 บาท งวดที่ 4 จำนวน 9,823,110 บาท และจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท)	221,308,890	ลงนามในสัญญา 10 ส.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม 2565 - จ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท - งบบุคลากรโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถ กันเงินฯภายใน 30 ก.ย. 63 จำนวน 47,790,878 บาท  <b>* สาเหตุความล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างติดปัญหา เรื่องไม่สามารถเพิ่มแรงงานได้ เนื่องจากติดปัญหาแรงงานข้ามจังหวัดไม่ได้</b>



Thank  
you
