



**รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564**

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>





ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์  
รวมทั้งสิ้น 441 รายการ วงเงิน 315,663,700 บาท

1. โดยวิธี E-bidding 334 รายการ เป็นเงิน 276,770,400 บาท

2. โดยวิธีคัดเลือก 6 รายการ เป็นเงิน 14,582,400 บาท

3. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101 รายการ เป็นเงิน 24,310,900 บาท




รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3  
รายการครุภัณฑ์ **รวมทั้งสิ้น 441 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

100

80

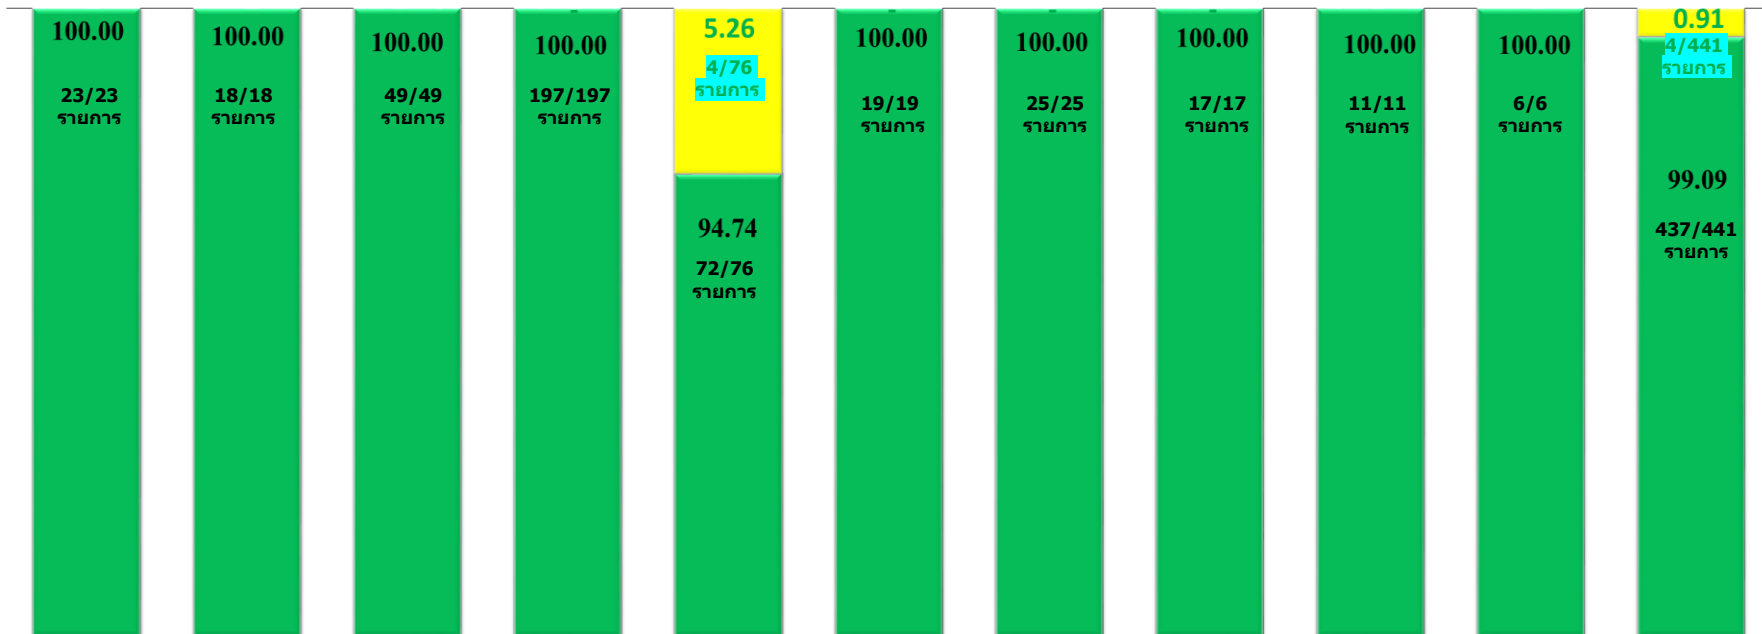

สสจ.กำแพงเพชร

สสจ.ชัยนาท

สสจ.นครสวรรค์

สสจ.พิจิตร

สสจ.อุทัยธานี

รพ.กำแพงเพชร

รพ.ชัยนาทเรนทร์

รพ.สปร.

รพ.พิจิตร


รพ.อุทัยธานี

ภาพรวมเขต





## รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ทั้งสิ้น 4 รายการ

ลำดับ	เขต	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่ขอ	ราคารวม	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้งที่	ขั้นตอน													สาเหตุความล่าช้า		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	10	11		12	13
ครุภัณฑ์ (4 รายการ)																									
1	3	อุทัยธานี	รพ.สว่างอารมณ์	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	254,800.00	1	254,800.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (ระบุ) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 ไม่มีผู้อุทธรณ์ เนื่องจากประกวดราคา รวม 3 รายการ รอผลการวินิจฉัย รายการอุทธรณ์ จึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้
2	3	อุทัยธานี	รพ.สว่างอารมณ์	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	367,500.00	1	367,500.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (ระบุ) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 ไม่มีผู้อุทธรณ์ เนื่องจากประกวดราคา รวม 3 รายการ รอผลการวินิจฉัย รายการอุทธรณ์ จึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้
3	3	อุทัยธานี	รพ.หนองขาหย่าง	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดยุคิรภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	2,450,000.00	1	2,450,000.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (ระบุ) : สิ้นสุด 2 ก.พ.64 มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย ส่งผลการอุทธรณ์ส่งกรมบัญชีกลางวินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ 0032.001/1678 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 64
4	3	อุทัยธานี	รพ.ห้วยคต	เครื่องช่วยหายใจแบบมีแรงเสียดทาน โรงพยาบาลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	509,600.00	1	509,600.00	E-bidding	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	อื่นๆ (ระบุ) : สิ้นสุดการอุทธรณ์ 3 ก.พ.64 มีผู้อุทธรณ์ผลการเสนอราคา ส่งเรื่องให้ กรมบัญชีกลางวินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ 0032.001/1677 ลงวันที่ 9 กพ.64 ได้ไม่ได้รับตอบกลับ



**ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง  
รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 281,011,900 บาท**

- 
1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 73 รายการ รวมเป็นเงิน 233,222,500 บาท
    - 1.1 โดยวิธี E-bidding 64 รายการ เป็นเงิน 220,168,900 บาท
    - 1.2 โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ เป็นเงิน 9,866,000 บาท
    - 1.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 รายการ เป็นเงิน 3,187,600 บาท


- 
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน โดยวิธี E-bidding 5 รายการ  
รวมเป็นเงิน 47,789,400 บาท

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

## รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว **รวมทั้งสิ้น 73 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

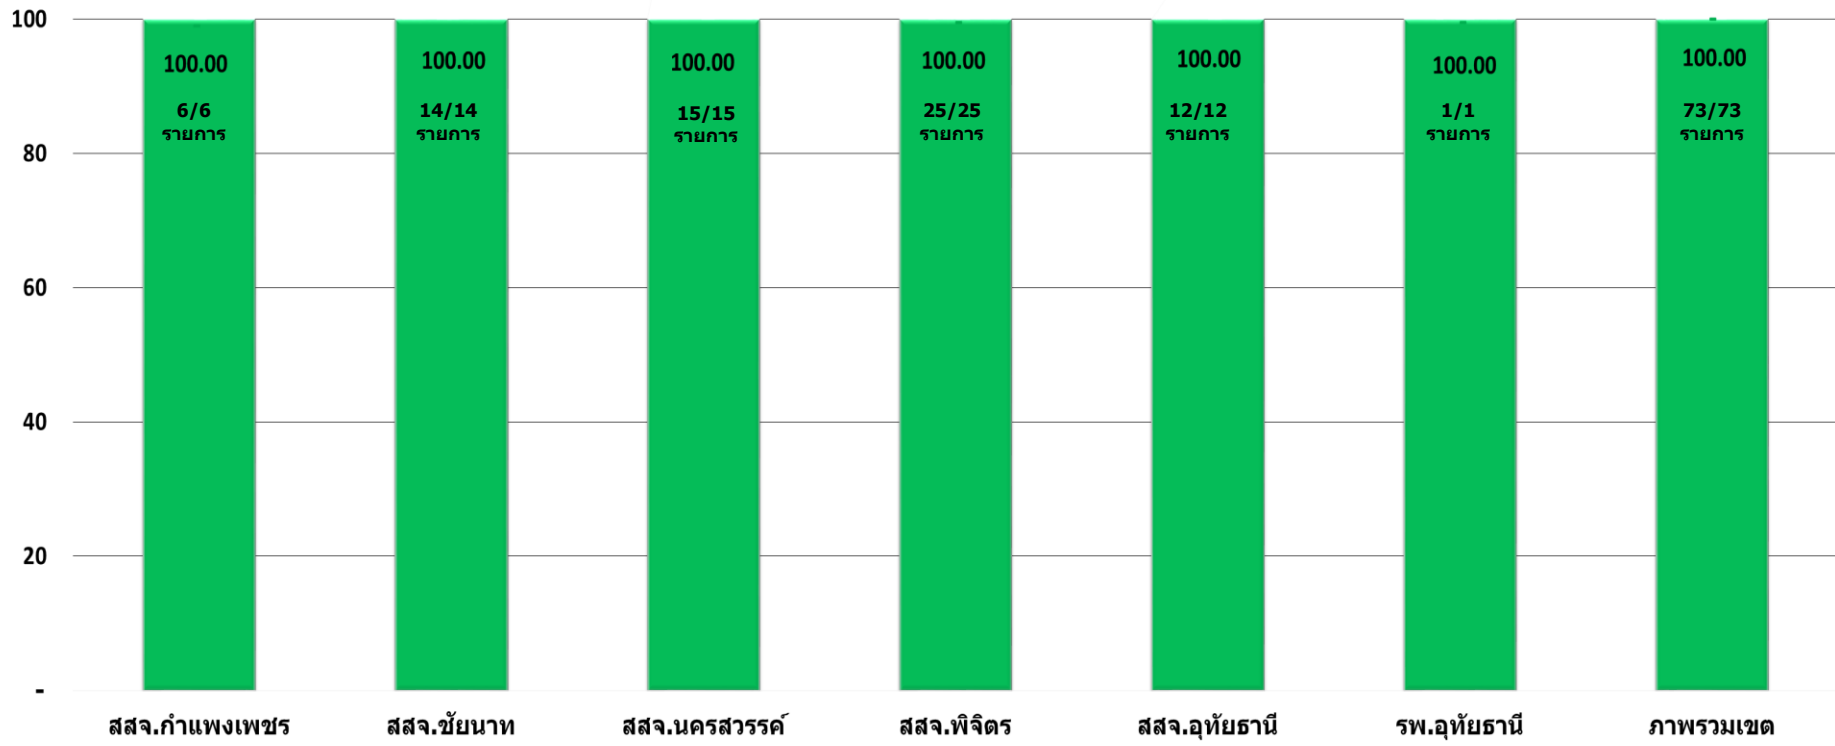


สิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

# รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

## รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน **รวมทั้งสิ้น 5 รายการ**

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ

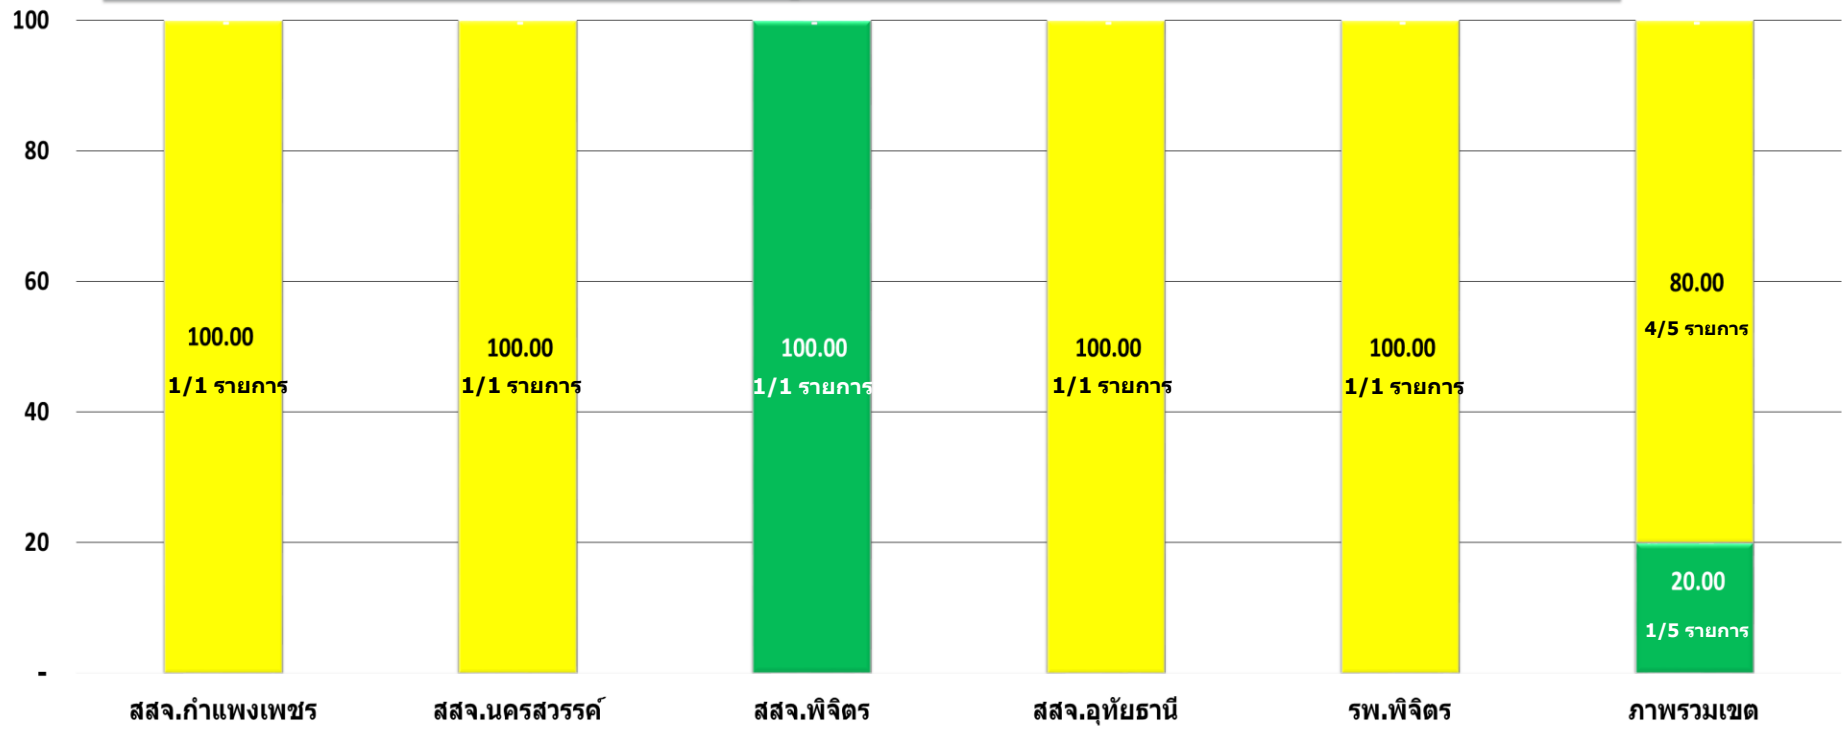





# รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กบรส. สป.  
เว็บไซต์ : <https://phdb.moph.go.th/>



## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 61 (บาท)	งบ ปี 62 (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารรังสี และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น	รพ. สวรรค์ ประชา รักษ์	481,460,000	116,192,800	29,930,400	157,437,400	177,899,400	19	19	18	1	428,499,400	56,960,600	

## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งบ ปี 63 (บาท)	งบ ปี 64 (บาท)	งบ ปี 65 (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	งวด งาน ทั้งหมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวด งาน ที่ ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารบริการและ จอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 1 หลัง	รพ. กำแพง เพชร	163,500,000	10,904,150	43,161,600	69,265,500	61,584,000	22	4	1	3	-	163,500,000	ลงนาม ในสัญญา 30 ก.ย. 63
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 1 หลัง	รพ. สวรรค์ ประชา รักษ์	349,400,000	22,001,325	77,009,700	275,011,500	-	18	7	5	2	50,243,720	299,156,280	งวดที่ 4 ตรวจรับ 14 ก.พ. 2564
3. สสจ. เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น 1 หลัง	สสจ. นครสว ร์ค์	32,960,000	7,583,700	30,334,500	-	-	8	7	7	-	22,445,760.00	10,514,240	ลงนาม ในสัญญา 15 ก.ค. 63

## รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ที่ทำสัญญาใหม่

รายการ	สถานที่	งบ ประมาณ (บาท)	งวด งานทั้ง หมด	งวด งาน ตาม แผน	งวด งาน ปัจจุ บัน	งวดงาน ที่ล่าช้า	เบิก จ่าย แล้ว (บาท)	คง เหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ช่วย นอกและ อุบัติเหตุ คสล. 9 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	309,000,000	21	7	5	2	87,691,110  (งวดที่ 1 จำนวน 11,845,515 บาท งวดที่ 2 จำนวน 10,295,880 บาท งวดที่ 3 จำนวน 9,376,605 บาท งวดที่ 4 จำนวน 9,823,110 บาท และจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท)	221,308,890	ลงนามในสัญญา 10 ส.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม 2565 - จ่ายล่วงหน้า 15% จำนวน 46,350,000 บาท - งบผูกพันโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากไม่ สามารถกับเงินภายใน 30 ก.ย. 63 จำนวน 47,790,878 บาท  * สาเหตุความล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างติดปัญหา เรื่องไม่สามารถเพิ่ม แรงงานได้ เนื่องจากติดปัญหาแรงงานข้าม จังหวัดไม่ได้



Thank  
you
