

# รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ วันที่ 23 เมษายน 2567



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบประมาณภูมิภาค กบรส. สป.สธ.  
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>



# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567


## รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		ผลรวมทั้งหมด	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	25	48,110,000	10	3,150,000	35	51,260,000
สสจ.กำแพงเพชร	17	33,200,000	1	350,000	18	33,550,000
สสจ.พิจิตร	23	30,610,000	11	3,540,000	34	34,150,000
สสจ.อุทัยธานี	14	18,180,000	7	2,716,000	21	20,896,000
สสจ.ชัยนาท	1	2,200,000	-	-	1	2,200,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	37,200,000	-	-	7	37,200,000
รพ.กำแพงเพชร	9	36,750,000	-	-	9	36,750,000
รพ.พิจิตร	17	47,818,000	-	-	17	47,818,000
รพ.อุทัยธานี	5	13,600,000	-	-	5	13,600,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	12	33,750,000	-	-	12	33,750,000
ภาพรวมเขตฯ 3	130	301,418,000	29	9,756,000	159	311,174,000

# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 67

หน่วย : รายการ

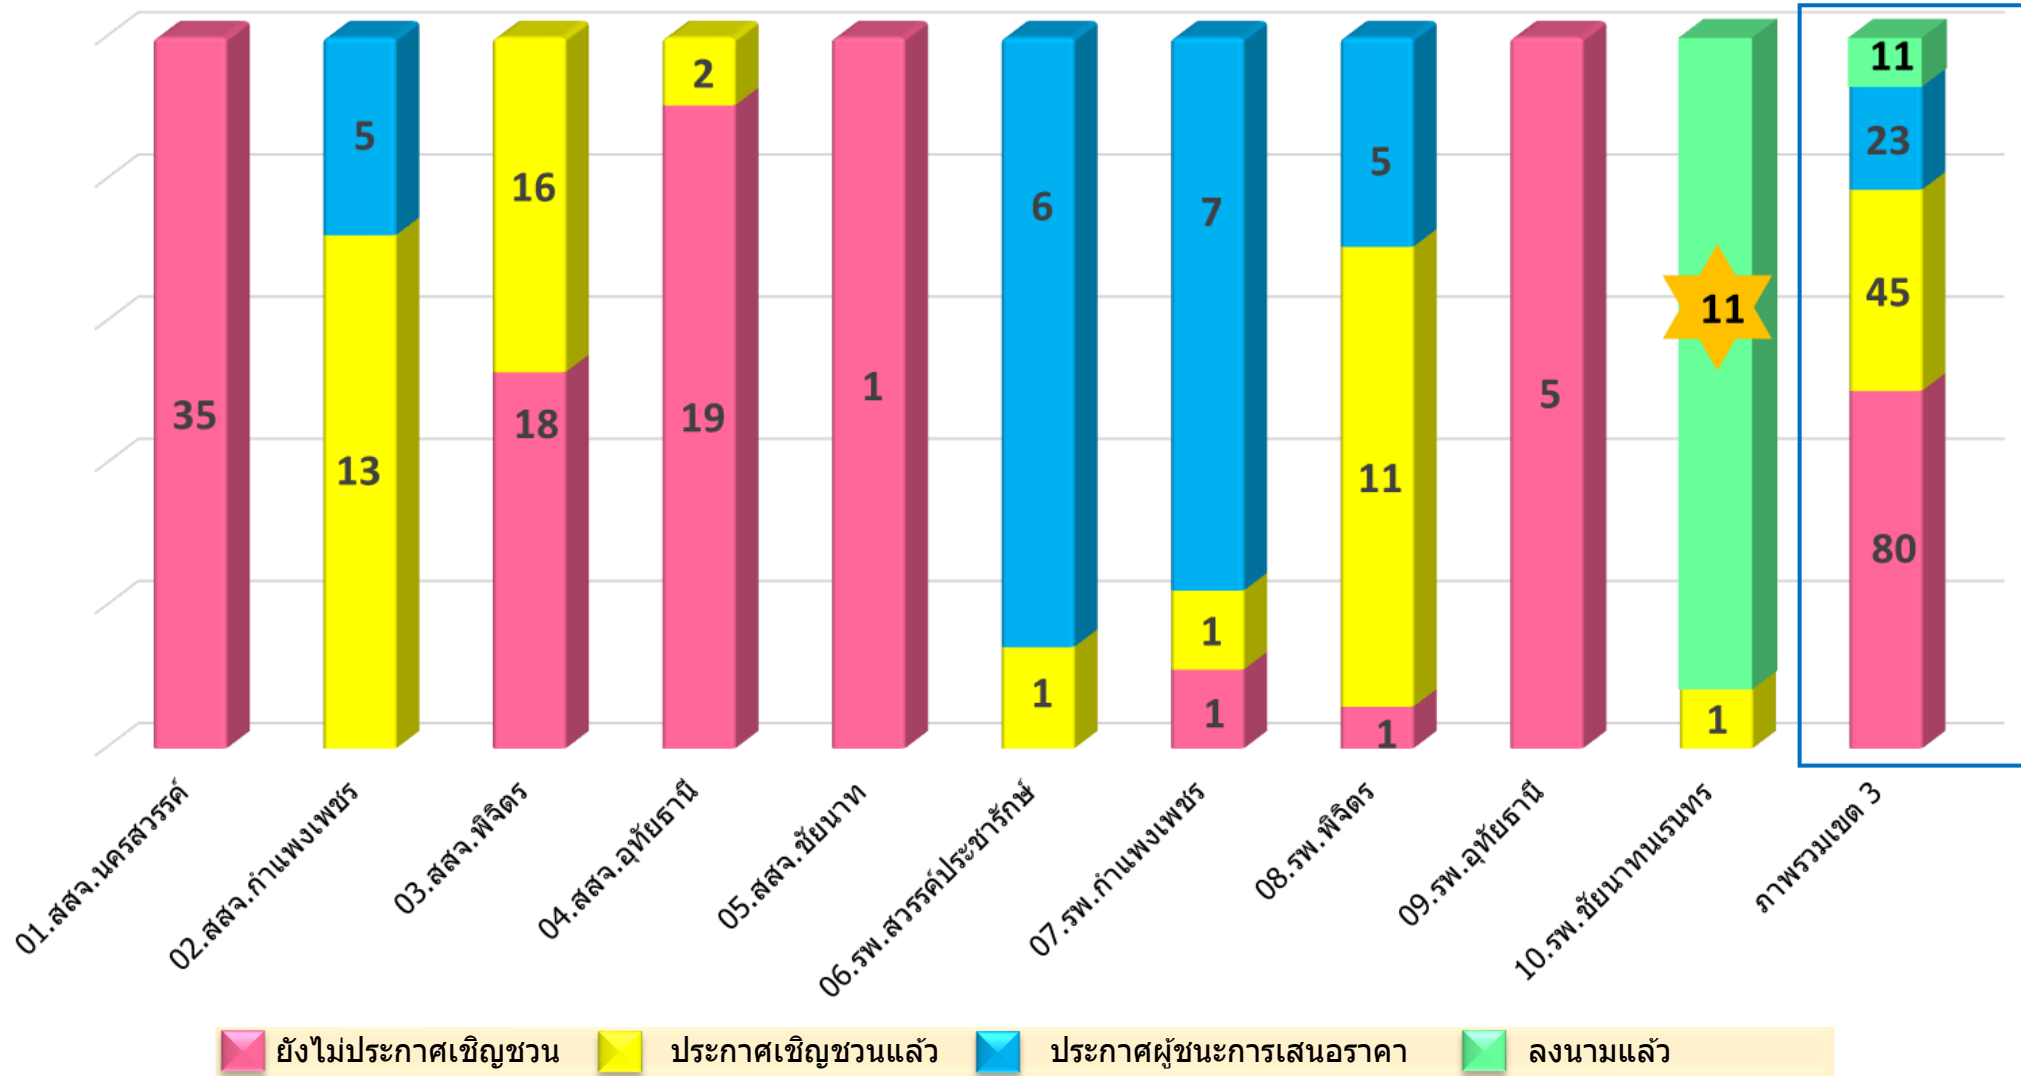

# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 32 รายการ วงเงิน 280,112,900 บาท

ประเภท  
คำขอ

1

ก่อสร้างปีเดียว

จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

2

ก่อสร้างผูกพัน

จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท



# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567



ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 67

## 1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท


- วิธี E-bidding                                   จำนวน 27 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง                               จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		แต่งตั้ง คกก. จัดทำร่าง (TOR)		จัดทำเอกสารซื้อ/จ้าง พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอขอความเห็นชอบ		ผลรวมทั้งหมด	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	10	50,136,300	-	-	-	-	10	50,136,300
สสจ.กำแพงเพชร	6	32,260,000	-	-	-	-	6	32,260,000
สสจ.พิจิตร	-	-	2	4,534,500	1	1,919,600	3	6,454,100
สสจ.อุทัยธานี	2	10,994,000	-	-	-	-	2	10,994,000
สสจ.ชัยนาท	8	47,518,500	1	404,000	-	-	9	47,922,500
ภาพรวมเขตฯ 3	26	140,908,800	3	4,938,500	1	1,919,600	30	147,766,900

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 67

# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : รายการ

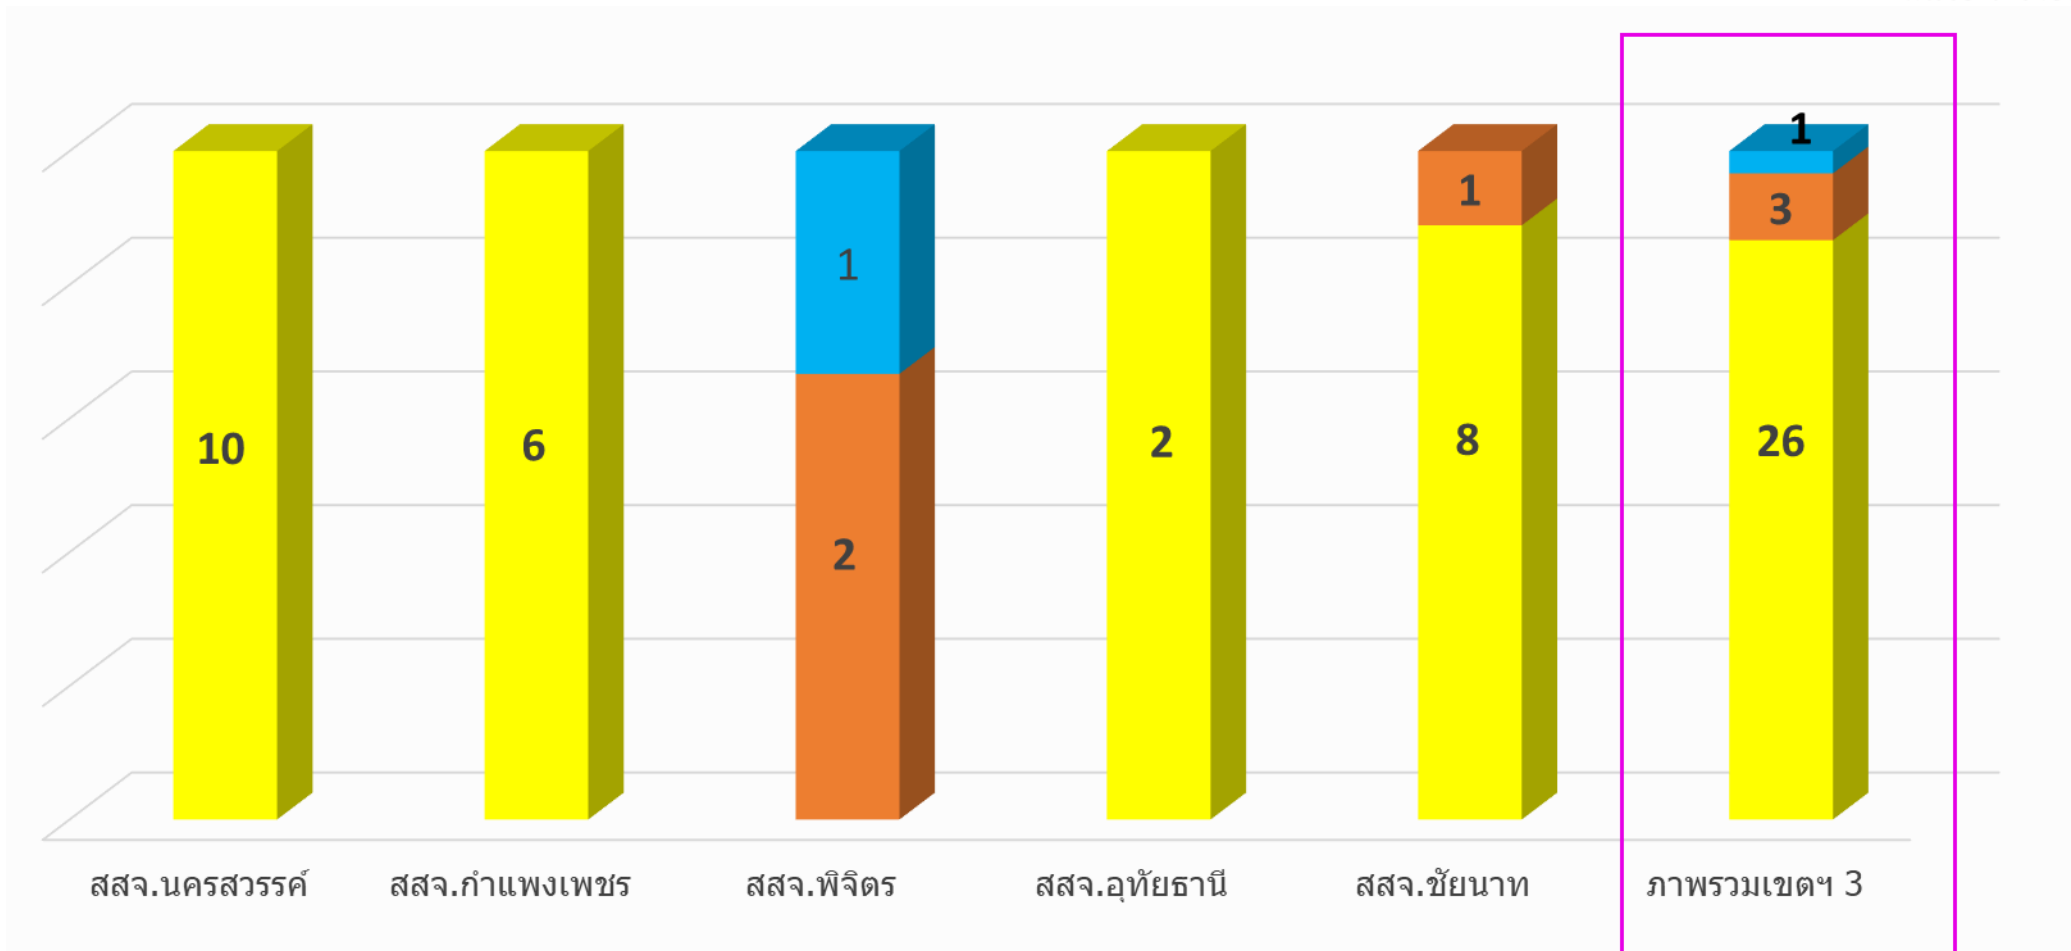

■ 1-จัดทำแผนซื้อ/จ้าง 
 ■ 2-แต่งตั้ง คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
 ■ 3-จัดทำเอกสารซื้อ/จ้าง ด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ

# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 67

## 2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 22 มี.ค. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 23 เม.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.สุวรรณประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
	ตั้งในปี 2567		26,472,500				
	ตั้งในปี 2568		75,005,200				
	ตั้งในปี 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และ นวัตกรรมรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	0-ยังไม่ได้ดำเนินการ	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
	ตั้งในปี 2567		105,873,500				
	ตั้งในปี 2568		289,065,400				
	ตั้งในปี 2569		289,065,400				

# รายงานติดตามความก้าวหน้าการลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567 (งบปี 66 ไปพลางก่อน)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2567



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.  
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>




# รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566 ที่กันเงินเหลือในปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567 (งบปี 66 ไปพลางก่อน)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 67

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน  
■ ประกาศเชิญชวนแล้ว  
■ ลงนามแล้ว

หน่วย : รายการ

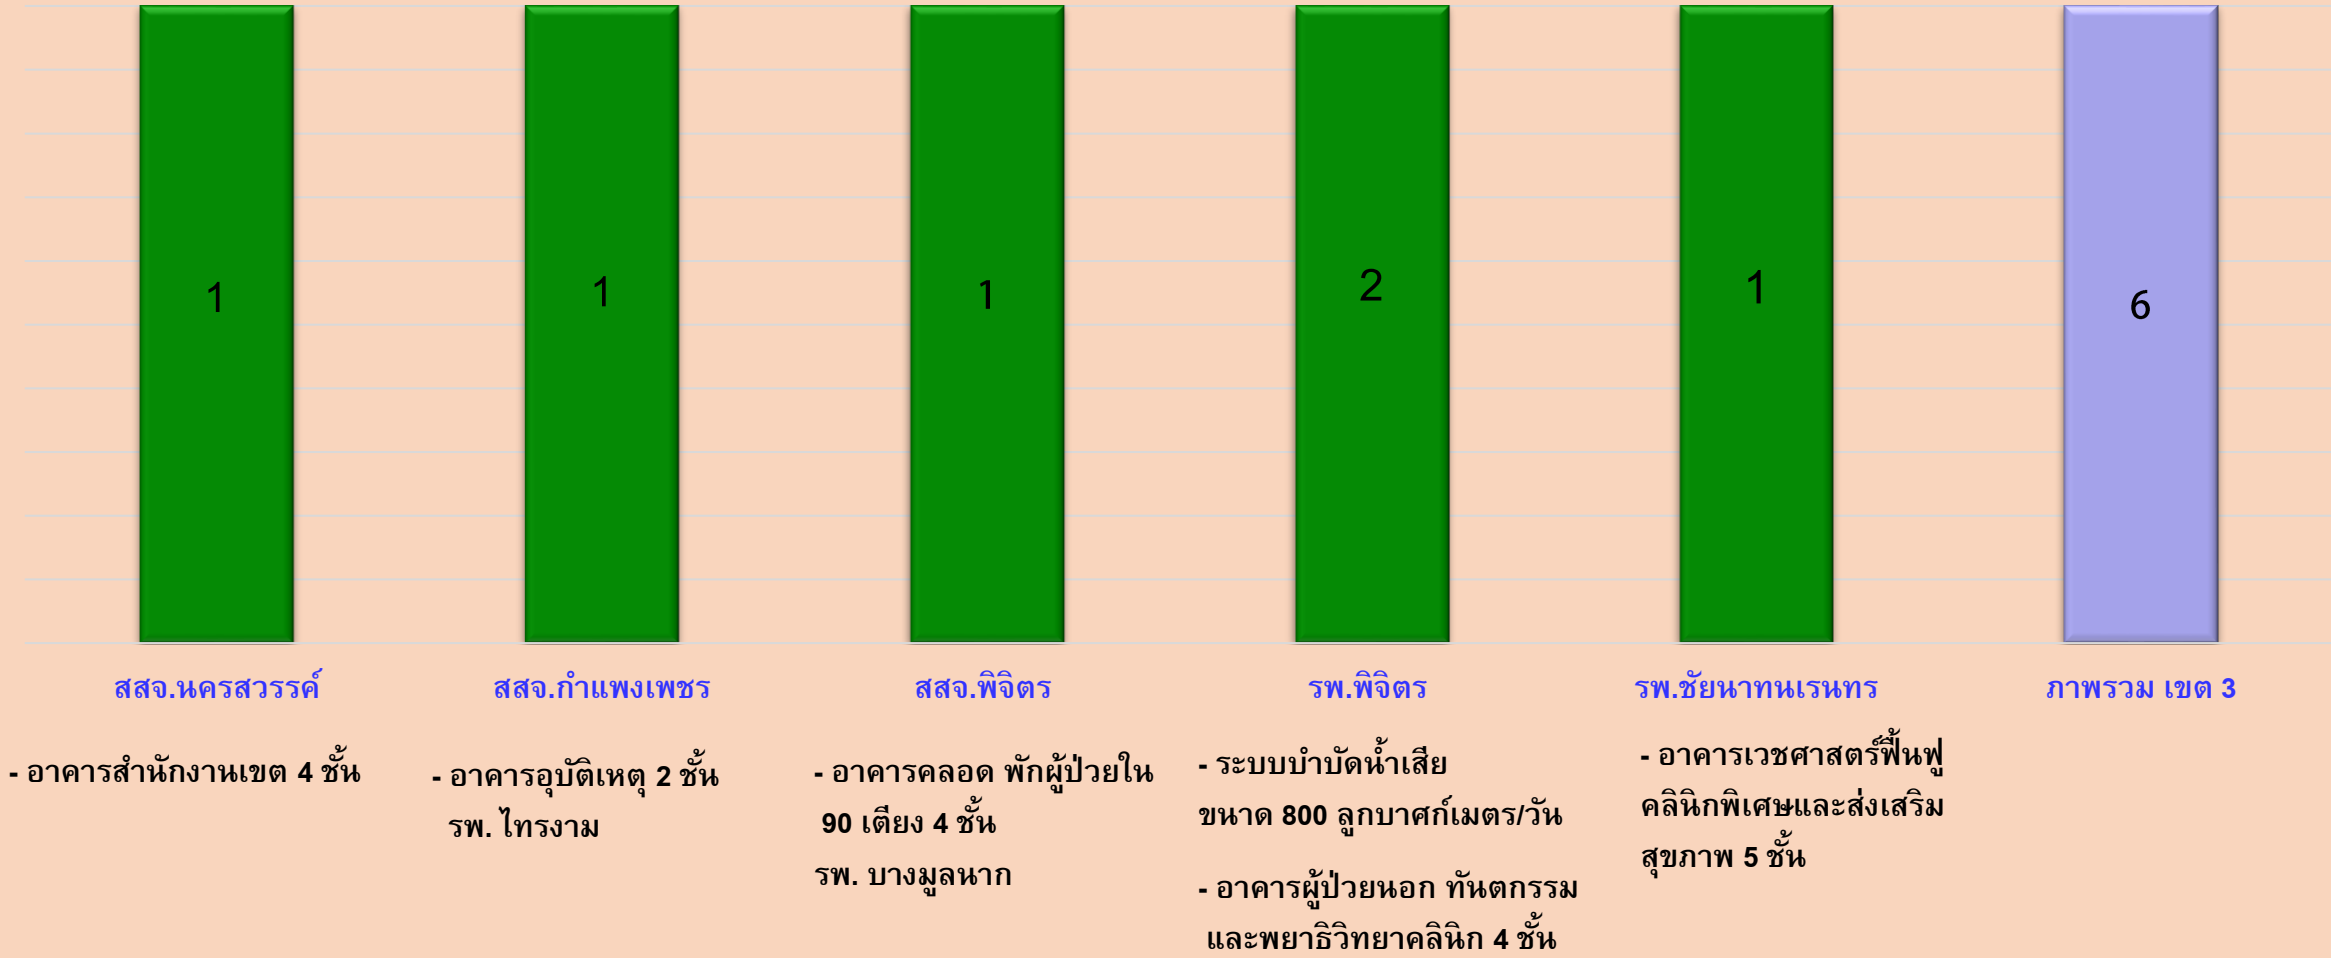

# รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566

## ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567 (งบปี 66 ไปพลางก่อน)

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้งหมด	ตามแผน	ปัจจุบัน	ที่ล่าช้า	งบ ปี 66	งบ ปี 67					
สสจ.นครสวรรค์	อาคารสำนักงาน เขตสุขภาพ 4 ชั้น	41,000,000	32,883,800	26 ก.ย. 67	8	5	4	1	5,166,000.00	7,011,000.00	12,177,000.00	30%	28,823,000.00	70%	งวดงานที่ 5 วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา - วันที่ 19 เม.ย. 67
รพ. ไทรงาม	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น	31,890,000	25,326,300	1 ก.ค. 67	9	7	8	-	5,918,591.77	9,069,708.23	14,988,300.00	47%	16,901,700.00	53%	
รพ. พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก หันดกรรรม และพยาธิวิทยา คลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	10	5	-	5	-	-	-	0%	187,002,500.00	100%	- คกก.ตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่างพิจารณา แก้ไขสัญญา เพื่อเสนอ พวจ. พิจารณานุมัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 1. ความยาวเสาเข็ม ตาม BOQ กำหนดไว้ 15 เมตร เป็น 20 เมตร 2. พื้น จากระบบคาน เป็นระบบ post tension
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	34,950,000	27,950,000	10 พ.ค. 67	9	6	4	2	3,495,000.00	10,485,000.00	13,980,000.00	40%	20,970,000.00	60%	- คนงานน้อย/รอวัสดุ - คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 4 ปลายเดือน เม.ย. - ต้นเดือน พ.ค. 67
รพ. บางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น	68,150,000	54,503,100	18 มี.ย. 67	9	8	7	1	13,646,900.00	11,568,600.00	25,215,500.00	30%	42,934,500.00	63%	วันที่แล้วเสร็จตาม สัญญางวดงานที่ 7 - วันที่ 30 มี.ค. 67
รพ. ชัยนาทนเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	34,100,000	28 มี.ค. 68	10	6	5	1	6,123,874.36	3,045,020.40	9,168,894.76	5%	159,998,905.24	95%	วันที่แล้วเสร็จตาม สัญญางวดงานที่ 6 - วันที่ 22 เม.ย. 67

Thank You!

**CFO**

