

รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ วันที่ 18 กันยายน 2567





ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567


รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		ผลรวมทั้งหมด	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	25	48,110,000	10	3,150,000	35	51,260,000
สสจ.กำแพงเพชร	17	33,200,000	1	350,000	18	33,550,000
สสจ.พิจิตร	23	30,610,000	11	3,540,000	34	34,150,000
สสจ.อุทัยธานี	14	18,180,000	7	2,716,000	21	20,896,000
สสจ.ชัยนาท	1	2,200,000	-	-	1	2,200,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	37,200,000	-	-	7	37,200,000
รพ.กำแพงเพชร	9	36,750,000	-	-	9	36,750,000
รพ.พิจิตร	17	47,818,000	-	-	17	47,818,000
รพ.อุทัยธานี	5	13,600,000	-	-	5	13,600,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	12	33,750,000	-	-	12	33,750,000
ภาพรวมเขตฯ 3	130	301,418,000	29	9,756,000	159	311,174,000

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 67

หน่วย : รายการ

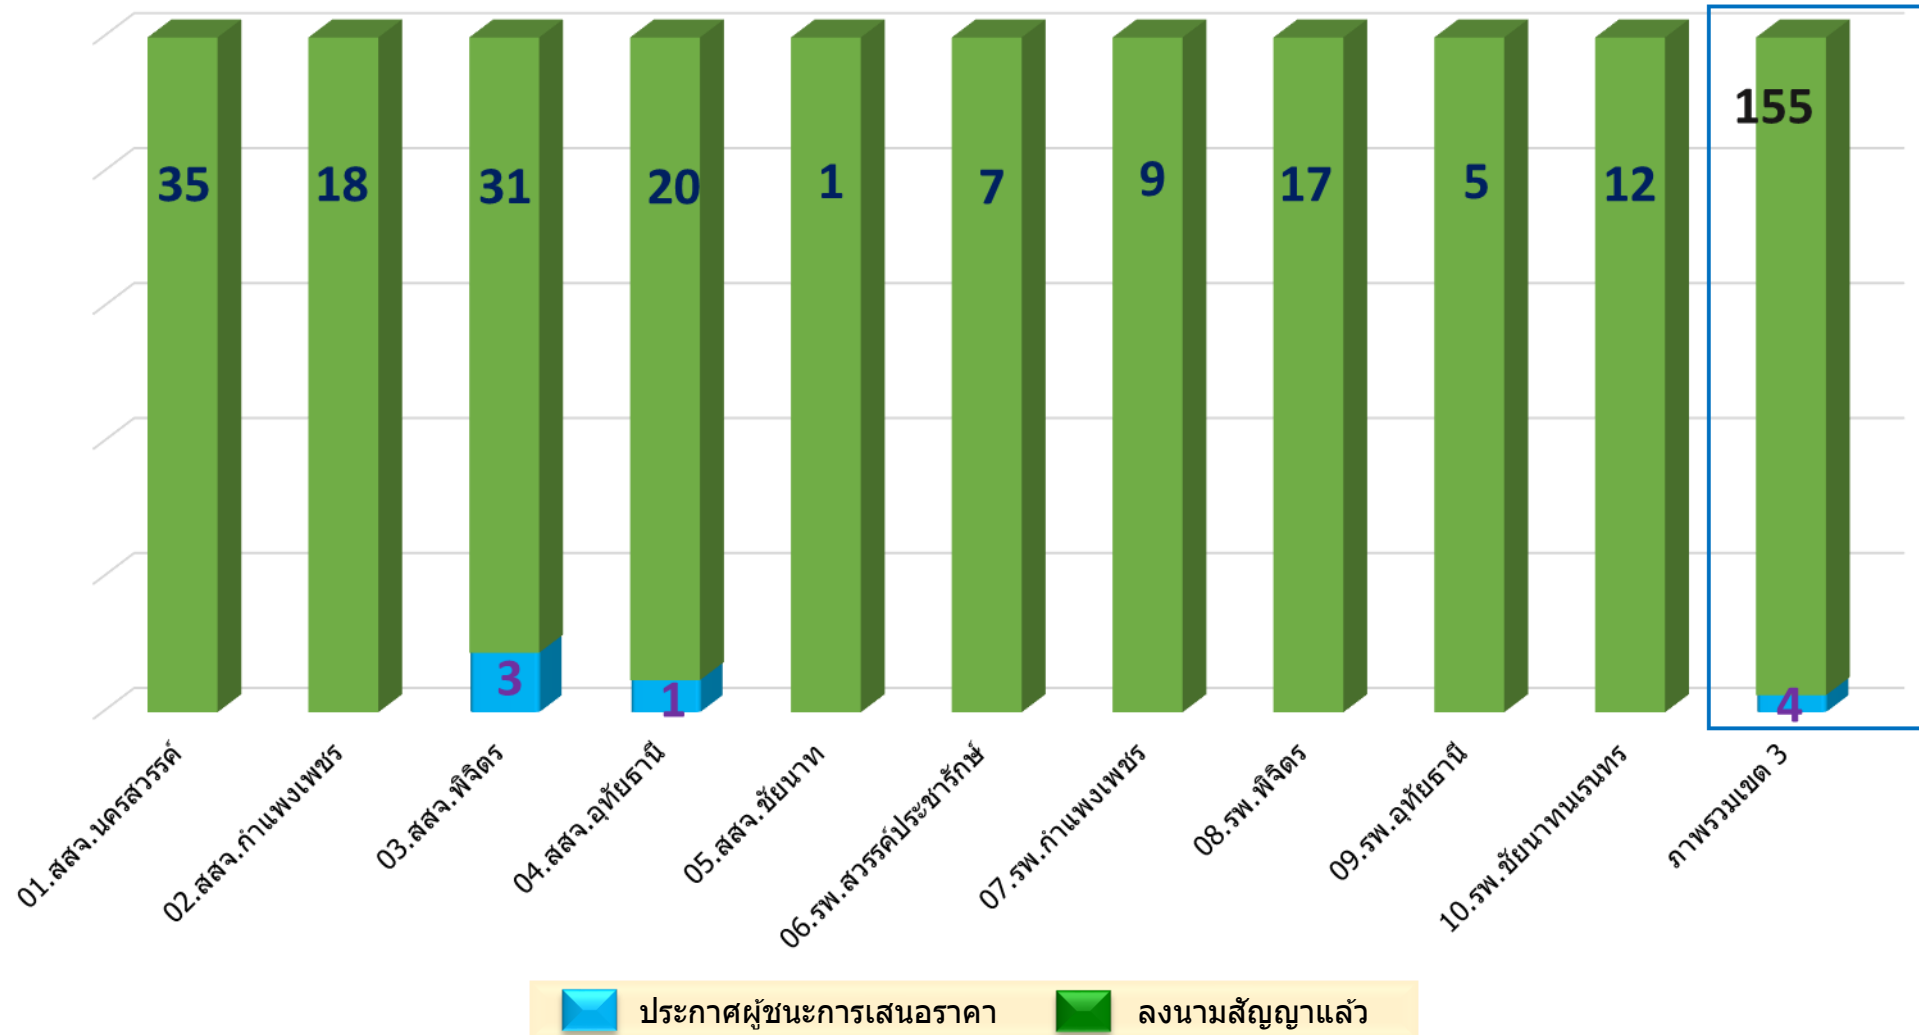

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รพ.ตะพานหิน	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน	2,200,000.00	14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
	คอมไฟฟ้าตัดใหญ่คอมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	1,450,000.00	
รพ.ทับคล้อ	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการหดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	1,500,000.00	15. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา

สสจ.อุทัยธานี

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รพ.บ้านไร่	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะนอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,500,000.00	15. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 32 รายการ วงเงิน 280,112,900 บาท

ประเภท
คำขอ

1

ก่อสร้างปีเดียว

จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

2

ก่อสร้างผูกพัน

จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 67

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท


- วิธี E-bidding จำนวน 27 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ลงนามสัญญาแล้ว		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์					1	1,232,100.00	9	48,904,200.00	10	50,136,300.00
สสจ.กำแพงเพชร							6	32,260,000.00	6	32,260,000.00
สสจ.พิจิตร							3	6,454,100.00	3	6,454,100.00
สสจ.อุทัยธานี	1	9,393,800.00					1	1,600,200.00	2	10,994,000.00
สสจ.ชัยนาท			1	5,925,600.00	1	4,500,000.00	7	37,496,900.00	9	47,922,500.00
ภาพรวมเขตฯ 3	1	9,393,800.00	1	5,925,600.00	2	5,732,100.00	26	126,715,400.00	30	147,766,900.00

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 67

หน่วย : รายการ

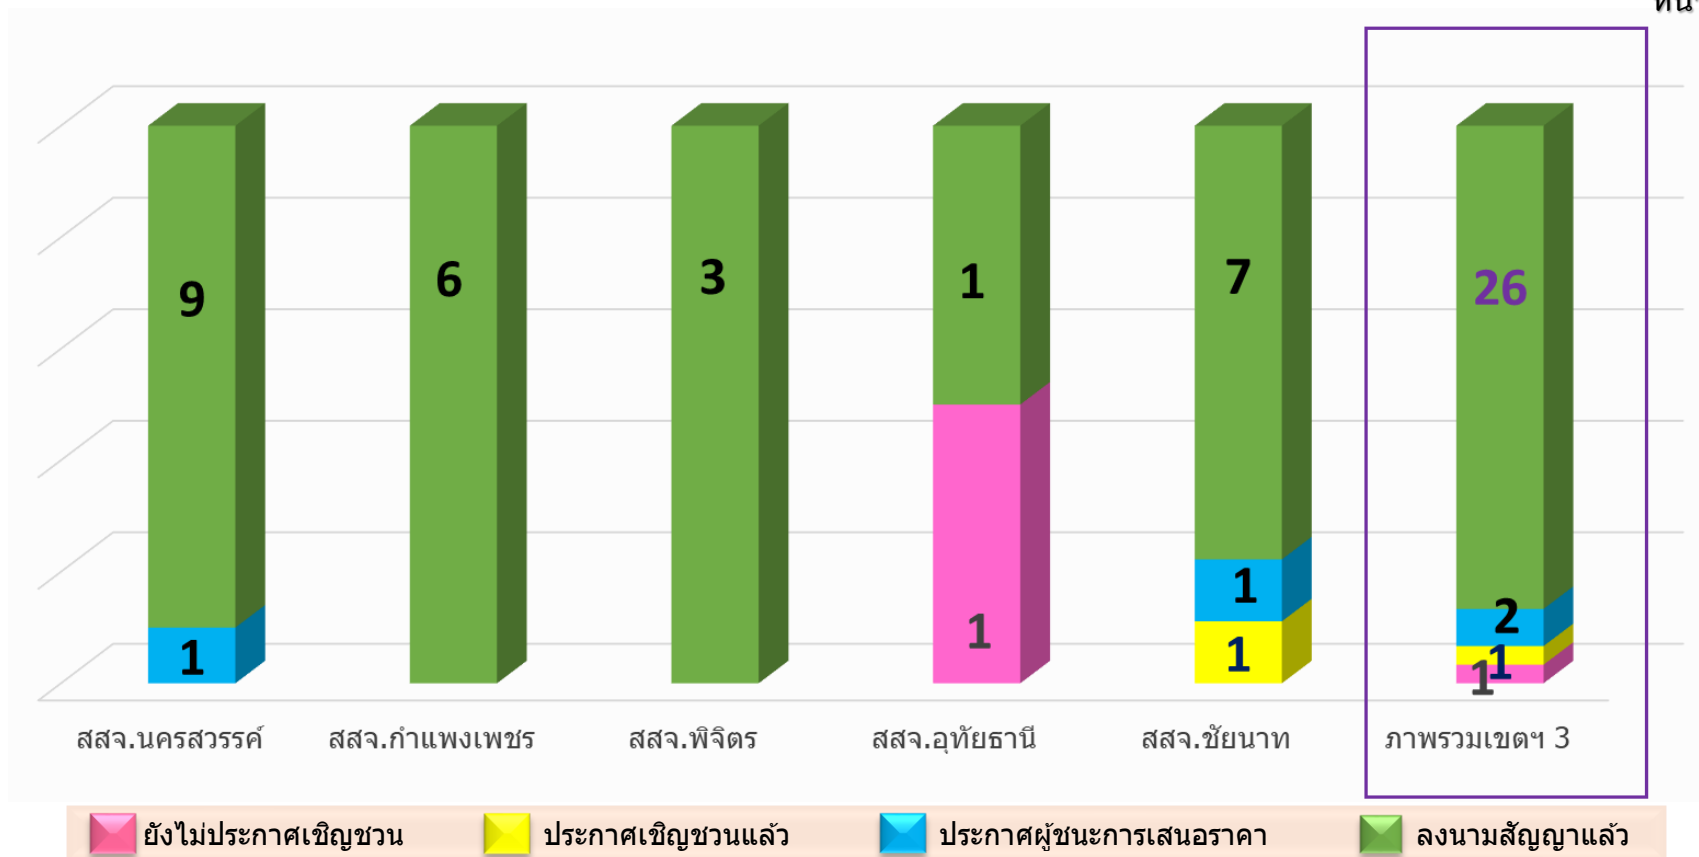

หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน

- รายการอาคารจ่ายกลาง รพ.ทัพทัน วงเงิน 9,393,800 บาท (คืบหน้ากลับส่วนกลาง)

หมายเหตุ : รายการประกาศเชิญชวนแล้ว

- ปรับปรุงระบบร่อนน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดสิงห์ วงเงิน 5,925,600 บาท (คืบหน้า เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2567)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 67

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบปี 2567	1-วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 8 ส.ค. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 18 ก.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.สุวรรณประชารักษ์แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	10.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ	10.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ	อยู่ระหว่าง กบรส. เสนอ ขอให้ รัฐมนตรี อนุมัติ ให้ขยาย ปีงบประมาณ จาก ปี 67 ถึงปี 69 เป็น ปี 68 ถึงปี 70 ตามความเห็นชอบของ สำนังบฯ
	ตั้งงบปี 2567		26,472,500				
	ตั้งงบปี 2568		75,005,200				
	ตั้งงบปี 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	7.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง. ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	11.ขออนุมัติแบบรูป รายการ วงเงินและ ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน จาก สำนังบฯ (กรณี รายการก่อสร้างผูกพัน)	
	ตั้งงบปี 2567		105,873,500				
	ตั้งงบปี 2568		289,065,400				
	ตั้งงบปี 2569		289,065,400				

รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2567



รายงานความก้าวหน้างบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566

ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 67

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	วันที่ สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน งบ ปี 67				เบิกจ่ายแล้ว งบ ปี 67	เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้งหมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า						
สสจ.นครสวรรค์	อาคารสำนักงาน เขตสุขภาพ 4 ชั้น	41,000,000	32,883,800	26 ก.ย. 67	8	7	7	-	27,921,000.00	27,921,000.00	68%	13,079,000.00	32%	- ตรวจสอบงวดงาน ที่ 5-6 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 67
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิวิทยา คลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	10	8	8	-	41,140,550.00	41,140,550.00	22%	145,861,950.00	78%	- ตรวจสอบ งวดงานที่ 7 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 67 - งวดงานที่ 7 - 10 รอเงินงบประมาณ ปี 68
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริม สุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	34,100,000	28 มี.ค. 68	10	10	9	1	31,126,875.20	31,126,875.20	18%	138,040,924.80	82%	- ตรวจสอบ งวดงานที่ 9 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 67 ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน เนื่องจากเป็นเงินงบปี 68

Thank You!

CFO

