

รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567





ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567


รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		ผลรวมทั้งหมด	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	25	48,110,000	10	3,150,000	35	51,260,000
สสจ.กำแพงเพชร	17	33,200,000	1	350,000	18	33,550,000
สสจ.พิจิตร	23	30,610,000	11	3,540,000	34	34,150,000
สสจ.อุทัยธานี	14	18,180,000	7	2,716,000	21	20,896,000
สสจ.ชัยนาท	1	2,200,000	-	-	1	2,200,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	37,200,000	-	-	7	37,200,000
รพ.กำแพงเพชร	9	36,750,000	-	-	9	36,750,000
รพ.พิจิตร	17	47,818,000	-	-	17	47,818,000
รพ.อุทัยธานี	5	13,600,000	-	-	5	13,600,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	12	33,750,000	-	-	12	33,750,000
ภาพรวมเขตฯ 3	130	301,418,000	29	9,756,000	159	311,174,000

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 67

หน่วย : รายการ

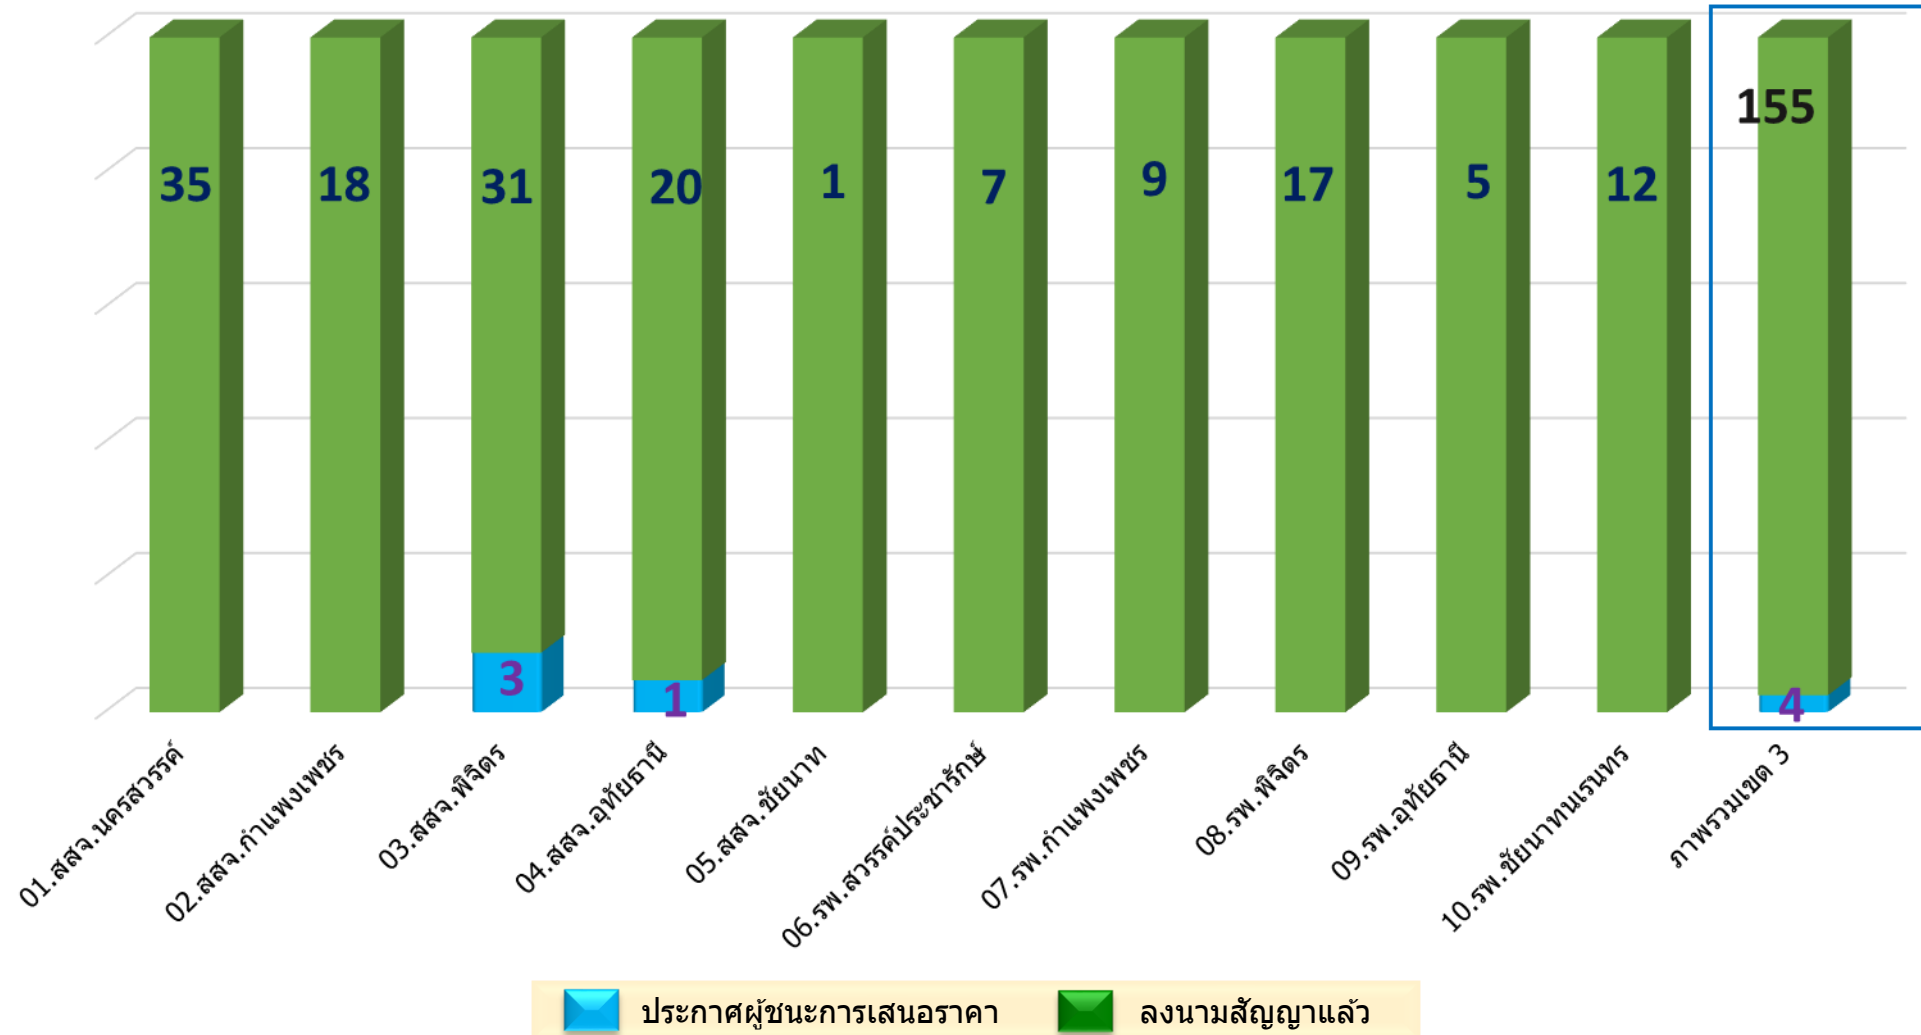

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รพ.ตะพานหิน	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน	2,200,000.00	14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
	คอมพิวเตอร์ตัดใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	1,450,000.00	
รพ.ทับคล้อ	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการหดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	1,500,000.00	15. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา

สสจ.อุทัยธานี

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รพ.บ้านไร่	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะนอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,500,000.00	15. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 32 รายการ วงเงิน 280,112,900 บาท

ประเภท
คำขอ

1

ก่อสร้างปีเดียว

จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

2

ก่อสร้างผูกพัน

จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 67

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท


- วิธี E-bidding จำนวน 27 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ลงนามสัญญาแล้ว		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์							10	48,904,200.00	10	50,136,300.00
สสจ.กำแพงเพชร							6	32,260,000.00	6	32,260,000.00
สสจ.พิจิตร							3	6,454,100.00	3	6,454,100.00
สสจ.อุทัยธานี	1	9,393,800.00					1	1,600,200.00	2	10,994,000.00
สสจ.ชัยนาท			1	5,925,600.00	1	4,500,000.00	7	37,496,900.00	9	47,922,500.00
ภาพรวมเขตฯ 3	1	9,393,800.00	1	5,925,600.00	2	5,732,100.00	27	127,947,500.00	30	147,766,900.00

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 67

หน่วย : รายการ

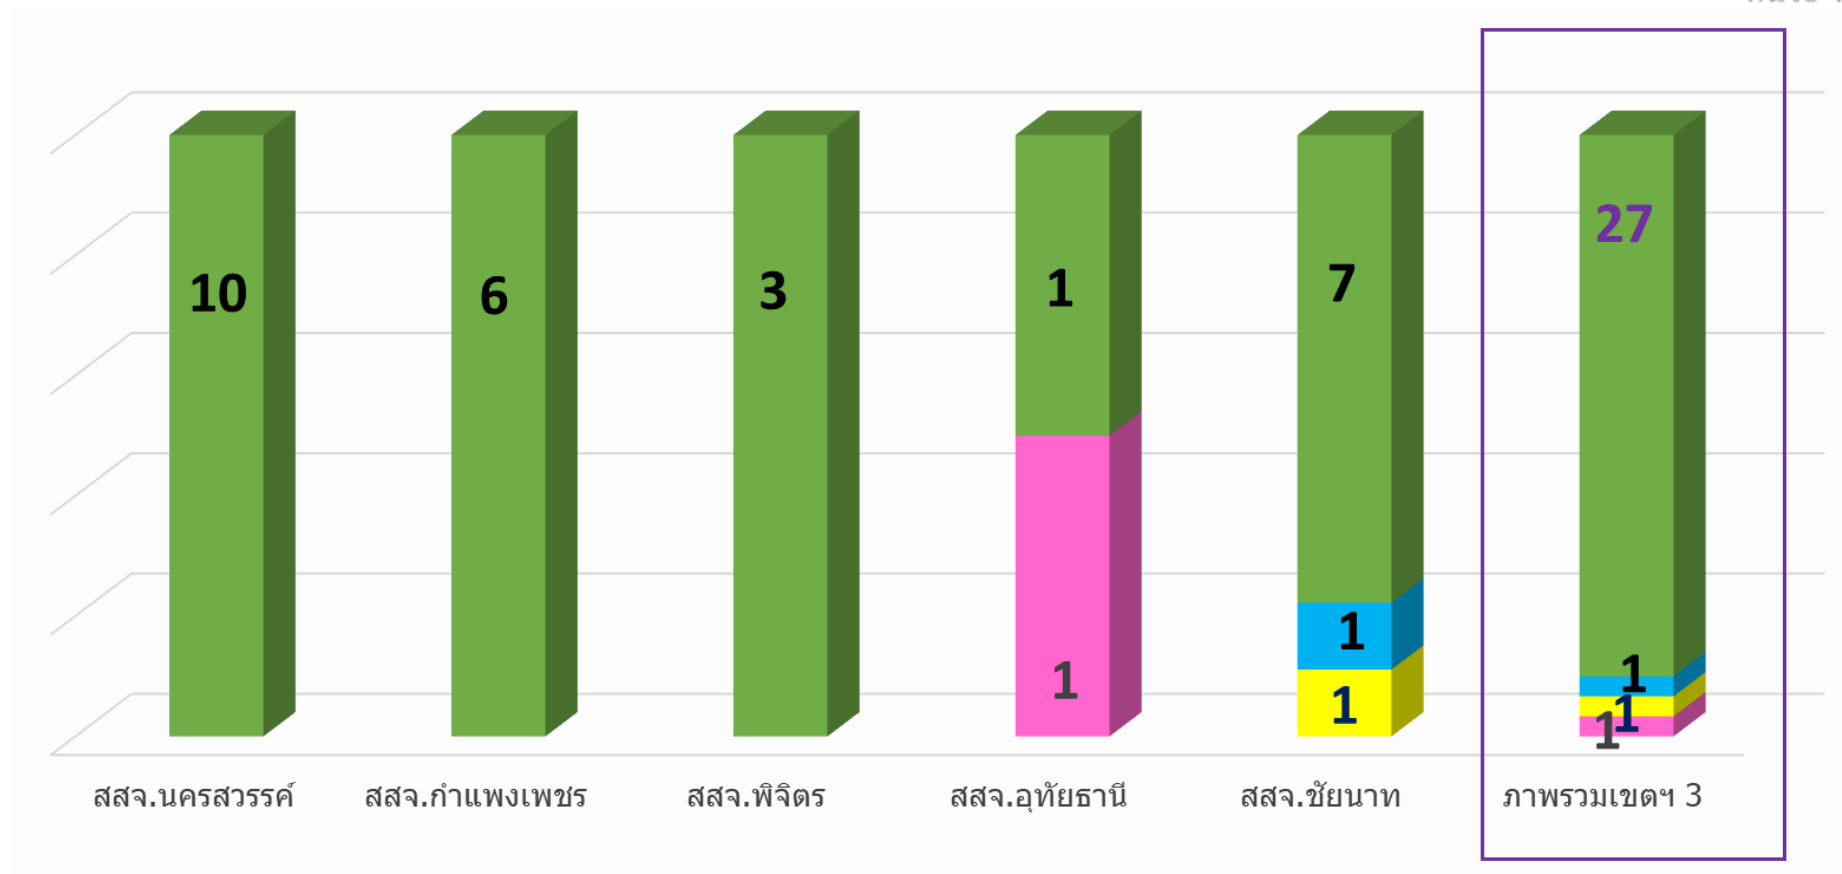

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน
 ■ ประกาศเชิญชวนแล้ว
 ■ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ■ ลงนามสัญญาแล้ว



รายละเอียดเพิ่มเติม: รายการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน

	รายการ	หมายเหตุ
สสจ.อุทัยธานี	อาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลทัพทัน วงเงิน 9,393,800 บาท	- แฉ่งคีนงบ เนื่องจกสถนทก่อสร้งไม่พร้ม

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายการที่ประกาศเชิญชวนแล้ว

	รายการ	หมายเหตุ
สสจ.ชัยนาท	ปรับปรุงระบบรwmน้ำเสยและระบบบ้ำบัดน้ำเสย รพยบมลว้ดสยงห์ วงเงิน 5,925,600 บาท	- คีนเงิน เนื่องจกไม่สามารถดำนยการจ้ดซ้จ้ดจ้ง และเบยจ่ายได้ท้นนยปีงบ 2567)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 67

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบ ปี 2567	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 18 ก.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 10 ต.ค. 67	หมายเหตุ
รพ.สุวรรณประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	10.คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาฯ	10.คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาฯ	อยู่ระหว่าง กบรส. เสนอ ขอให้ รัฐมนตรี อนุมัติ ให้ขยาย ปีงบ ผูกพัน จาก ปี 67 ถึงปี 69 เป็น ปี 68 ถึงปี 70 ตามความเห็นชอบของ สำนักงานฯ
	ตั้งงบปี 2567		26,472,500				
	ตั้งงบปี 2568		75,005,200				
	ตั้งงบปี 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	11.ขออนุมัติแบบรูป รายการ วงเงินและ ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันจาก สำนักงานฯ (กรณีรายการ ก่อสร้างผูกพัน)	11.ขออนุมัติแบบรูป รายการ วงเงินและ ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน จากสำนักงานฯ (กรณี รายการก่อสร้างผูกพัน)	
	ตั้งงบปี 2567		105,873,500				
	ตั้งงบปี 2568		289,065,400				
	ตั้งงบปี 2569		289,065,400				

รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567



รายงานความก้าวหน้างบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566

ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 67

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 66 (บาท)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน งบ ปี 67				เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้งหมด	ตามแผน	ปัจจุบัน	ที่ล่าช้า					
รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ คสล. 10 ชั้น	163,500,000	84,725,600	31 ต.ค. 66	22	22	21	1	125,012,100.00	76%	38,487,900.00	24%	- งวดที่ 22 (สุดท้าย) ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทัน ตามแผนการทำงานที่ได้แจ้งไว้กับ คกก. ตรวจสอบพัสดุ (ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67) ทำให้งบประมาณถูกพับไป
สสจ.นครสวรรค์	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพ 4 ชั้น	41,000,000	32,883,800	26 ก.ย. 67	8	8	8	-	27,921,000.00	68%	13,079,000.00	32%	ส่งมอบงาน งวดที่ 7 - 8 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 67 (รอ คกก.ตรวจสอบรับงาน)
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก หันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	10	8	8	-	41,140,550.00	22%	145,861,950.00	78%	- ตรวจสอบ งวดงานที่ 7 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 67 - งวดงานที่ 7 - 10 รอเงินงบประมาณ ปี 68
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	34,100,000	28 มี.ค. 68	10	10	9	1	31,126,875.20	18%	138,040,924.80	82%	- ตรวจสอบ งวดงานที่ 9 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 67 ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน เนื่องจากเป็นเงินงบประมาณปี 68

Thank You!

CFO

