

รายงานติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2567

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 67


ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า					
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิ วิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	18	9	8	1	41,140,550.00	22%	145,861,950.00	78%	เนื่องจากแก้ไขแบบ
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	135,067,800	28 มี.ค. 68	16	10	10	-	39,889,767.24	24%	129,278,032.76	76%	เนื่องจากวัสดุไม่เพียงพอ ต่อการทำงาน วัสดุเข้า หน้างานล่าช้า

รายการงบลงทุน ปี 2567 ที่กันเงินเลื่อนปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

(ได้รับจัดสรรปี 2567 ครุภัณฑ์ 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท และสิ่งปลูกสร้าง 32 รายการ วงเงิน 280,112,900 บาท)

หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์		ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน		ภาพรวม	
	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)
สสจ.นครสวรรค์	8	21,288,960.00	10	47,121,023.08			18	68,409,983.08
สสจ.กำแพงเพชร			6	29,663,000.00			6	29,663,000.00
สสจ.พิจิตร	8	11,370,500.00	3	5,622,888.00			11	16,993,388.00
สสจ.อุทัยธานี	1	2,500,000.00	1	1,520,000.00			2	4,020,000.00
สสจ.ชัยนาท			6	36,461,609.00			6	36,461,609.00
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	6,999,000.00			1	26,472,500.00	2	33,471,500.00
รพ.กำแพงเพชร					1	105,873,500.00	1	105,873,500.00
รพ.พิจิตร	4	14,722,000.00					4	14,722,000.00
รพ.อุทัยธานี	1	6,995,000.00					1	6,995,000.00
ภาพรวมเขตฯ 3	23	63,875,460.00	26	120,388,520.08	2	132,346,000.00	51	316,609,980.08

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568
รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

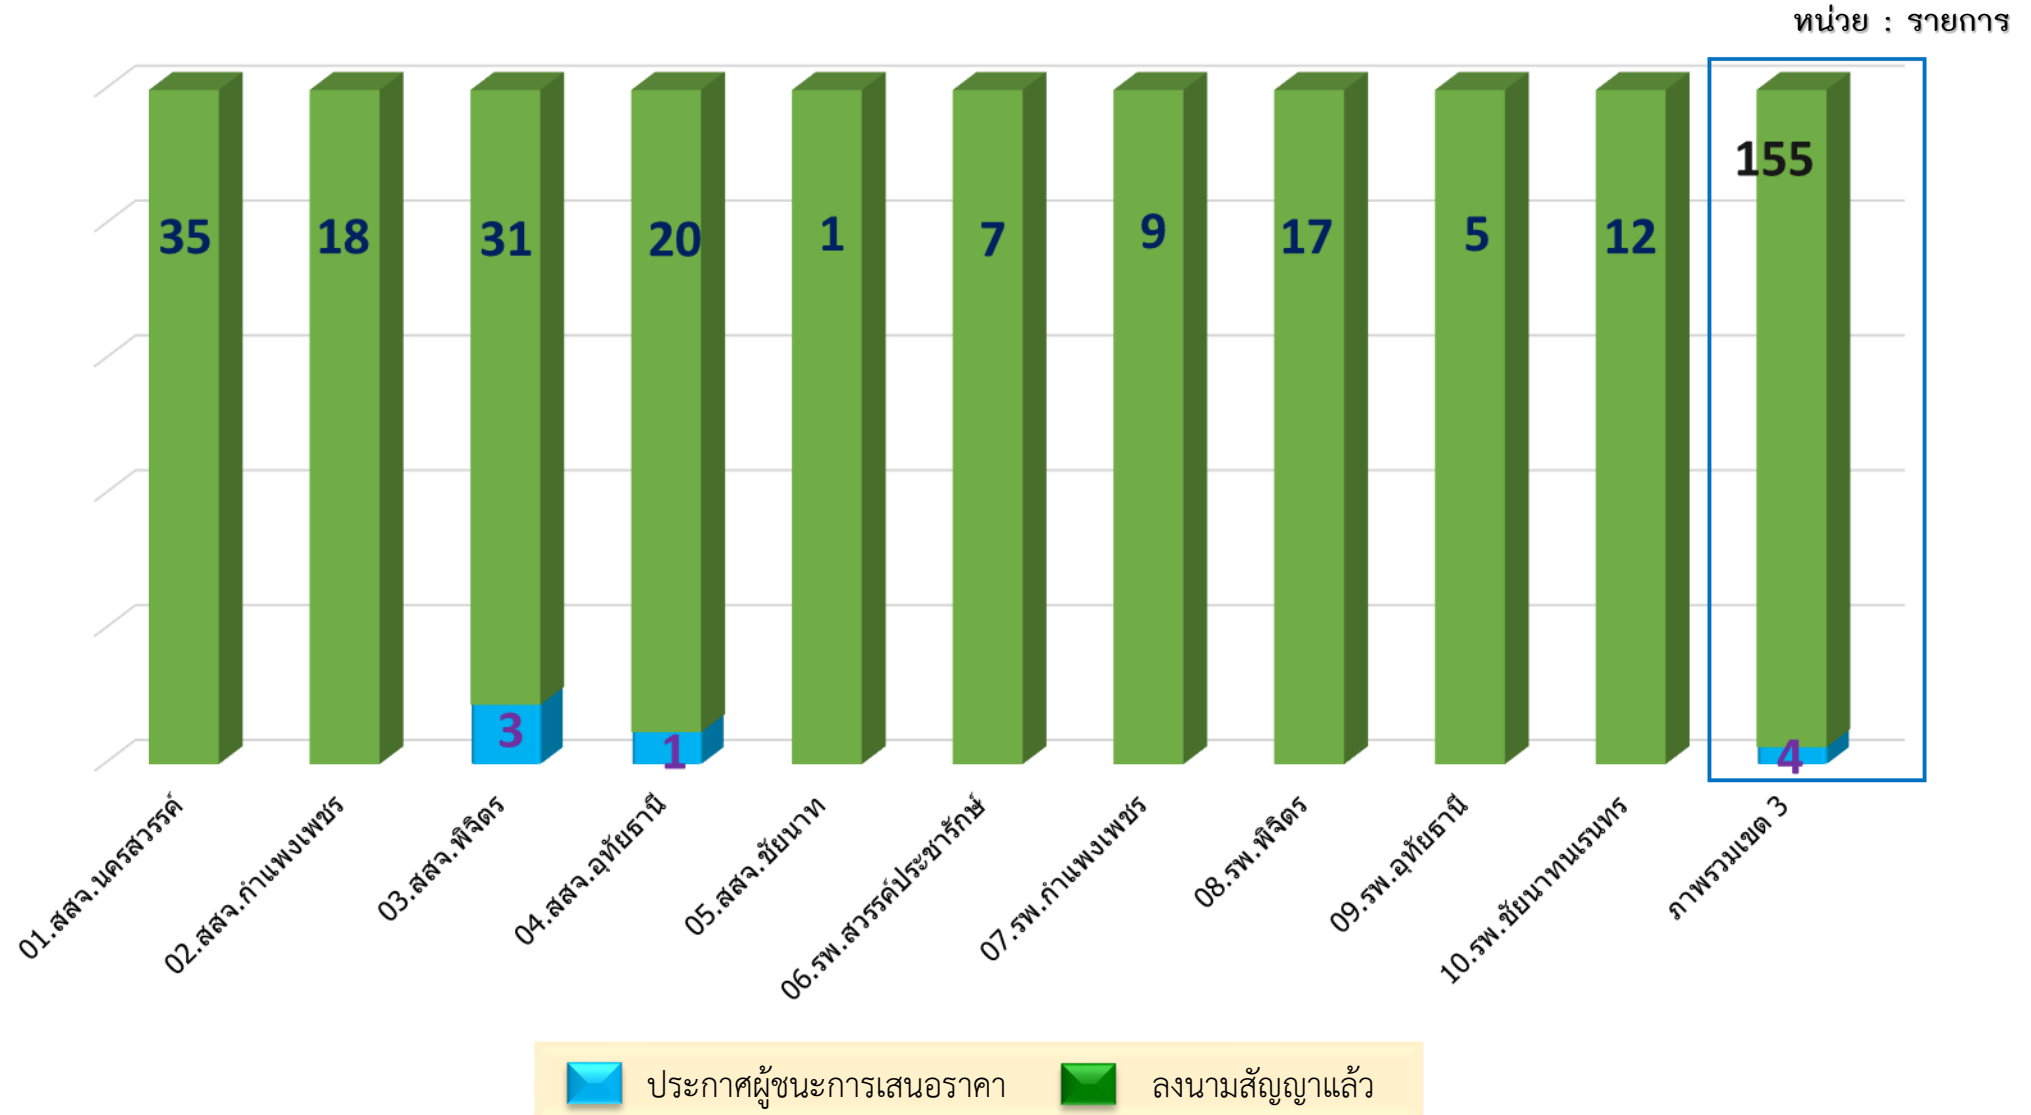

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รพ.ตะพานหิน	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน	2,200,000.00	14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
	คอมพิวเตอร์ตัดใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	1,450,000.00	
รพ.ทับคล้อ	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการหดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	1,500,000.00	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา

สสจ.อุทัยธานี

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รพ.บ้านไร่	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,500,000.00	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

- วิธี E-bidding จำนวน 27 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	รวมจัดสรร		ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ลงนามสัญญาแล้ว		คืบหน้าประมาณ		หมายเหตุ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	
สสจ.นครสวรรค์	10	50,136,300					10	50,136,300			
สสจ.กำแพงเพชร	6	32,260,000					6	32,260,000			
สสจ.พิจิตร	3	6,454,100					3	6,454,100			
สสจ.อุทัยธานี	2	10,994,000	1	9,393,800			1	1,600,200	1	9,393,800	อาคารจ่ายกลาง รพ.ทัพทัน
สสจ.ชัยนาท	9	47,922,500			1	5,925,600	8	41,996,900	1	5,925,600	ปรับปรุงระบบรณมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดสิงห์
ภาพรวมเขตฯ 3	30	147,766,900	1	9,393,800	1	5,925,600	28	132,447,500	2	15,319,400	

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

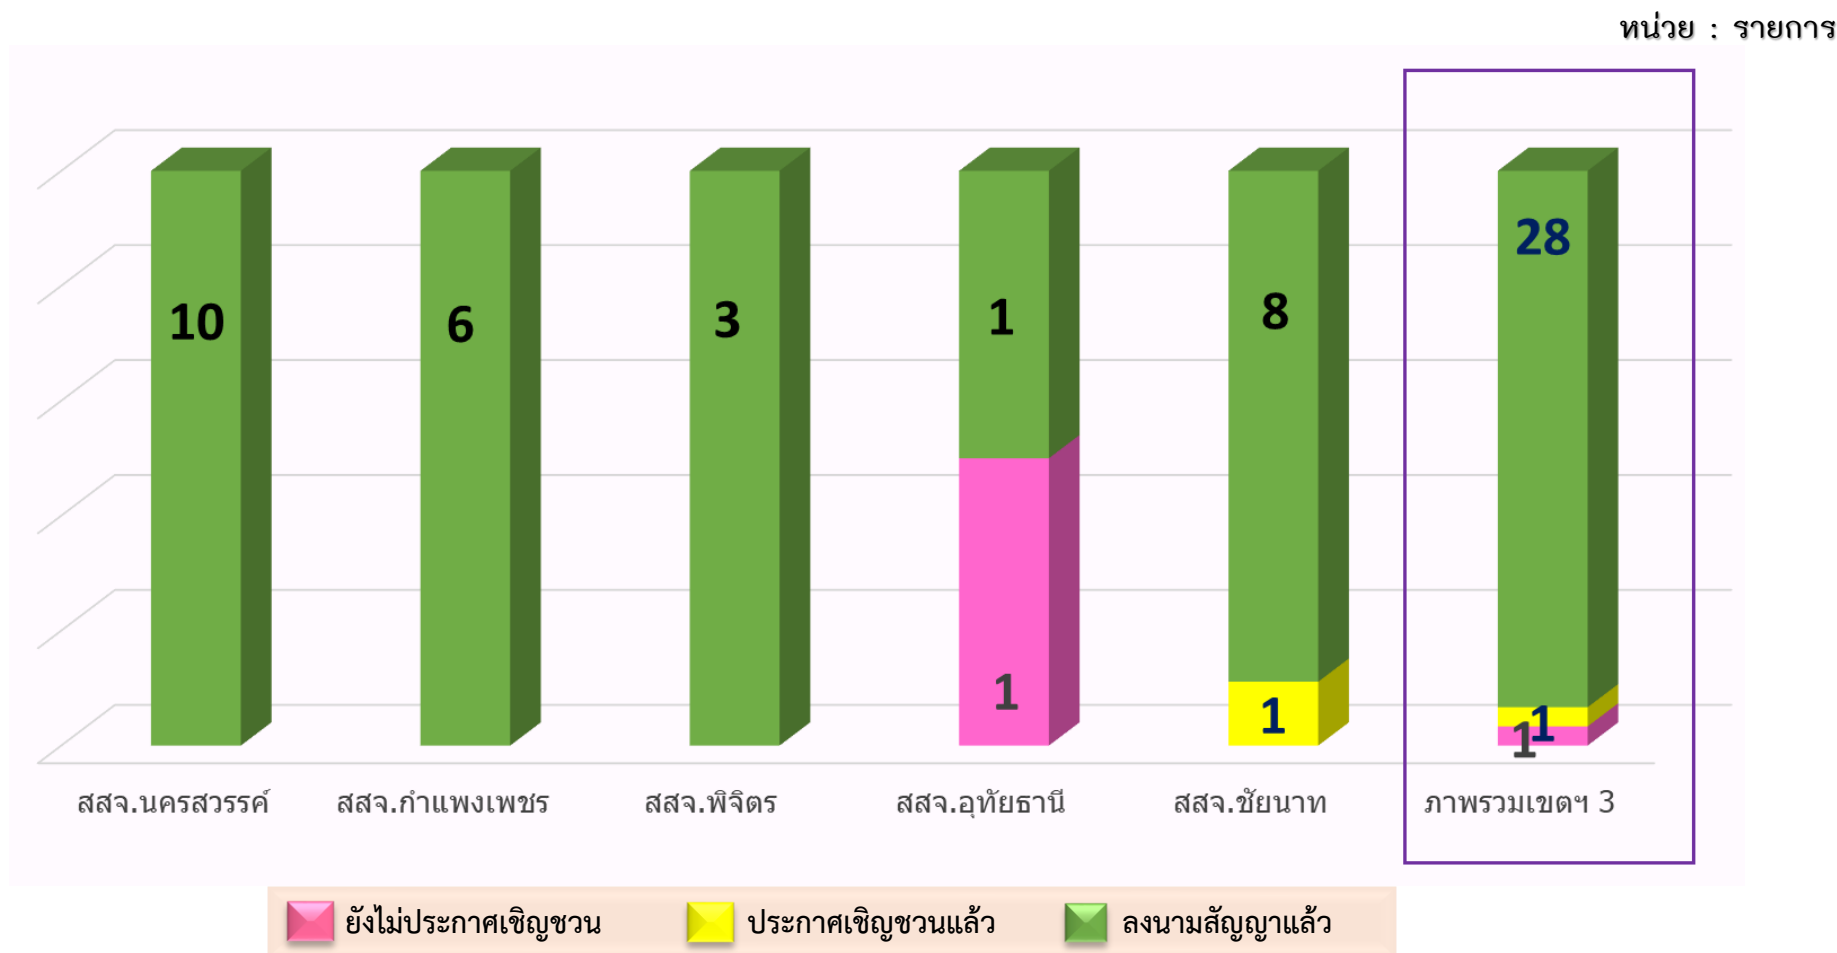

หมายเหตุ : 1. อาคารจ่ายกลาง รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี วงเงิน 9,393,800 บาท (คืบหน้า)
 2. ปรับปรุงระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท วงเงิน 5,925,600 บาท
 (คืบหน้า เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2567)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567 - 2568

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบ ปี 2567	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 10 ต.ค. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 25 ต.ค. 67	หมายเหตุ
รพ.สุวรรณประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	16.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนดภายหลัง พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	
	ตั้งงบปี 2567		26,472,500				
	ตั้งงบปี 2568		75,005,200				
	ตั้งงบปี 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	11.ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อน ผูกพันจากสำนักงานฯ (กรณี รายการก่อสร้างผูกพัน)	11.ขออนุมัติแบบรูป รายการ วงเงินและ ระยะเวลาก่อนผูกพัน จากสำนักงานฯ (กรณี รายการก่อสร้างผูกพัน)	
	ตั้งงบปี 2567		105,873,500				
	ตั้งงบปี 2568		289,065,400				
	ตั้งงบปี 2569		289,065,400				


9

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ของ สสจ.พิจิตร จำนวน 12 รายการ อยู่ขั้นตอน
การพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะประกาศผู้ชนะในสัปดาห์หน้า

หน่วย : รายการ

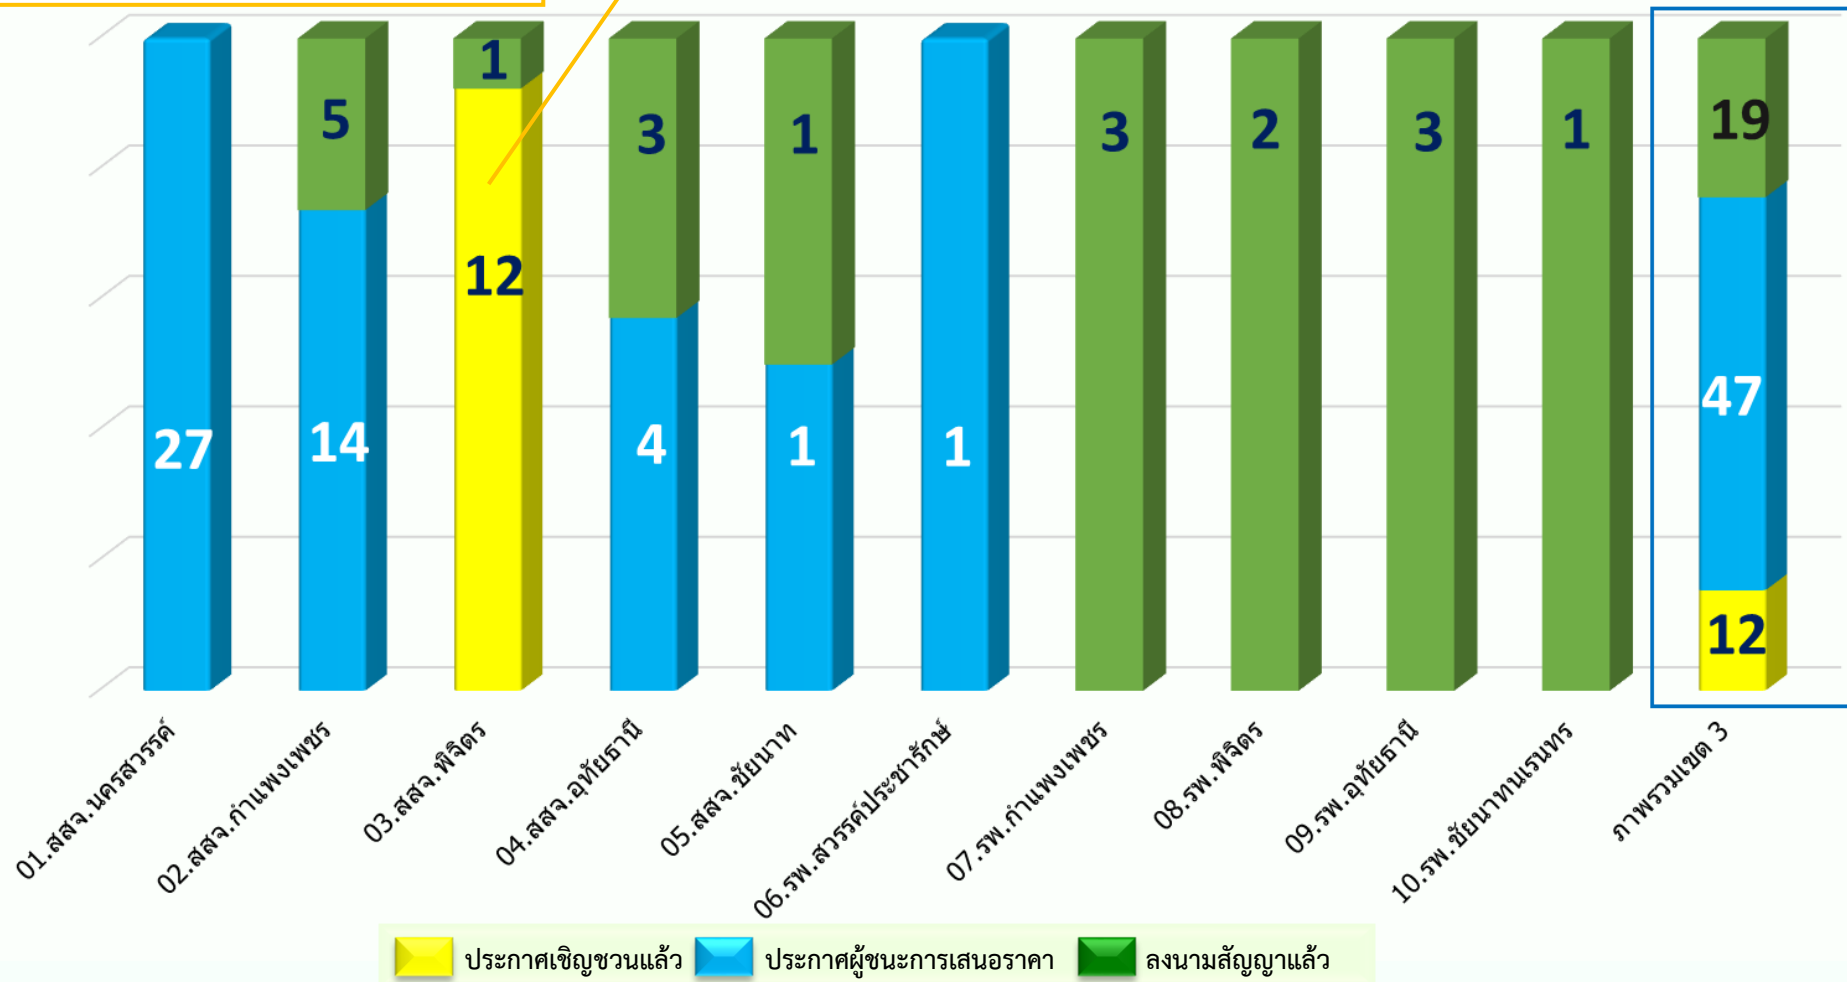

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568


รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	22	30,700,000	7	2,492,000	29	33,192,000
สสจ.กำแพงเพชร	20	25,110,000	4	880,000	24	25,990,000
สสจ.พิจิตร	26	28,630,000	15	4,051,000	41	32,681,000
สสจ.อุทัยธานี	23	21,470,000	4	1,045,000	27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	10	11,400,000	13	3,461,000	23	14,861,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	60,920,000	1	400,000	8	61,320,000
รพ.กำแพงเพชร	8	16,750,000	1	400,000	9	17,150,000
รพ.พิจิตร	14	29,260,000	1	400,000	15	29,660,000
รพ.อุทัยธานี	8	14,090,000	1	400,000	9	14,490,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	9	22,400,000	2	2,900,000	11	25,300,000
ภาพรวมเขตฯ 3	147	260,730,000	49	16,429,000	196	277,159,000

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท

หน่วย : รายการ

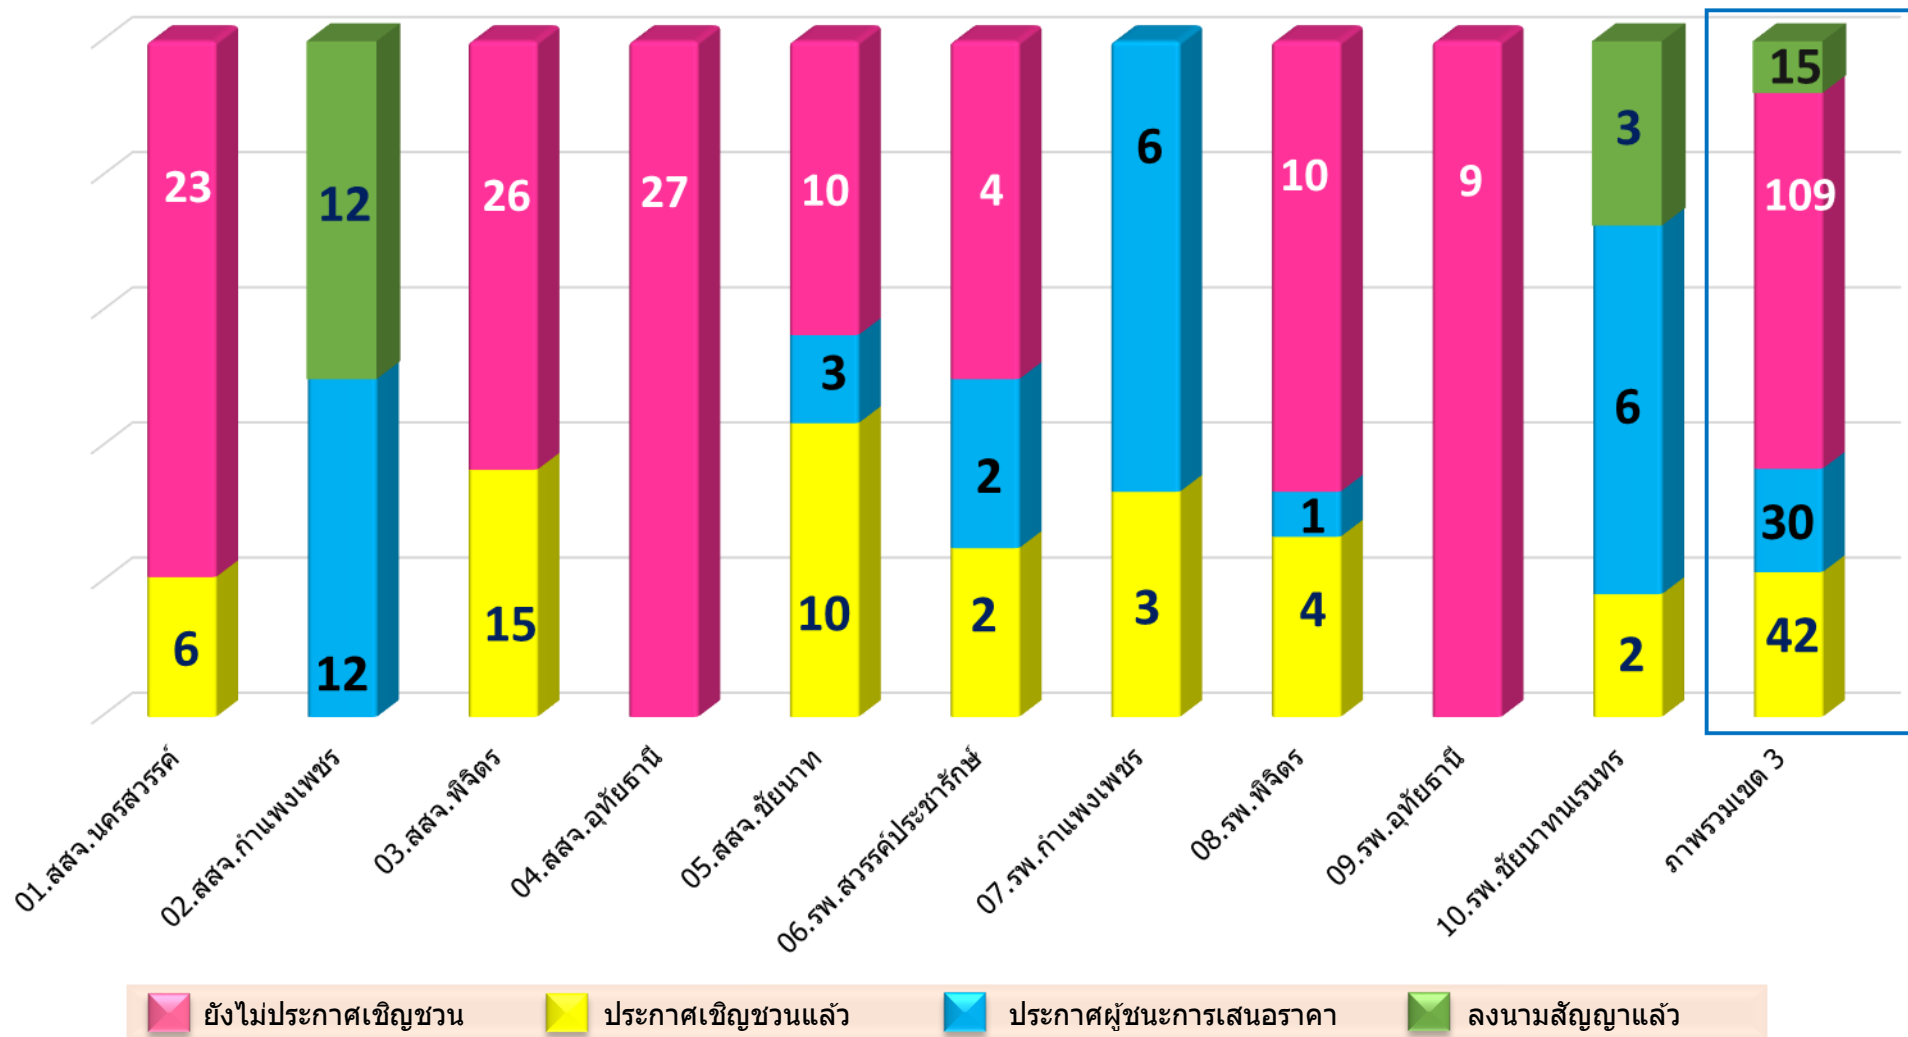

รายงานงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

หน่วยบริการ	ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	7	26,984,100	2	81,013,400	9	107,997,500
สสจ.กำแพงเพชร	3	25,789,200	1	158,438,400	4	184,227,600
สสจ.พิจิตร	9	35,999,100			9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	5	24,461,500			5	24,461,500
รพ.สวรรค์ประชารักษ์			1	558,798,300	1	558,798,300
รพ.อุทัยธานี			1	371,145,100	1	371,145,100
ภาพรวมเขตฯ 3	24	113,233,900	5	1,169,395,200	29	1,282,629,100

รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 (งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 67

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน		เงินกันเหลื่อมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 67	คงเหลือ (บาท)
				ทั้งหมด	ปัจจุบัน			
รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ คสล. 10 ชั้น (งบผูกพันข้ามปี 63 - 66)	163,500,000	31 ต.ค. 66	22	21	70,942,650	32,454,750	38,487,900

รายละเอียด

- ผลการเบิกจ่าย ปี 63 - 66 งวด 1 - 21 จำนวนเงิน 125,012,100 บาท
- งบประมาณถูกพับไปฯ งวดที่ 22 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 38,487,900 บาท

รพ.กำแพงเพชร ได้ดำเนินการส่งข้อมูลรายงานสาเหตุงบประมาณถูกพับไปฯ ให้ กบรส. สป.สร. ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ
