

รายงานติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

01

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2566 - 2568

02

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567
ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

03

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

04

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2567 - 2569

05

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง)
ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

06

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

07

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

08

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2568 - 2570

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2566 - 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 67

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า					
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิ วิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	18	10	8	2	41,140,550.00	22%	145,861,950.00	78%	เนื่องจากแก้ไขแบบ
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	135,067,800	28 มี.ค. 68	16	11	10	1	39,889,767.24	24%	129,278,032.76	76%	ตรวจรับ งวดงานที่ 10 วันที่ 19 พ.ย. 67 - งวดงานที่ 10 ล่าช้า เพราะไม่สามารถเทพื้นที่ คอนกรีตให้แล้วเสร็จได้ ตามแผนงาน เนื่องจาก ขาดสภาพคล่อง

หน้า 3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 ที่กันเงินหลัอมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568


รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	25	48,110,000	10	3,150,000	35	51,260,000
สสจ.กำแพงเพชร	17	33,200,000	1	350,000	18	33,550,000
สสจ.พิจิตร	23	30,610,000	11	3,540,000	34	34,150,000
สสจ.อุทัยธานี	14	18,180,000	7	2,716,000	21	20,896,000
สสจ.ชัยนาท	1	2,200,000			1	2,200,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	37,200,000			7	37,200,000
รพ.กำแพงเพชร	9	36,750,000			9	36,750,000
รพ.พิจิตร	17	47,818,000			17	47,818,000
รพ.อุทัยธานี	5	13,600,000			5	13,600,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	12	33,750,000			12	33,750,000
ภาพรวมเขตฯ 3	130	301,418,000	29	9,756,000	159	311,174,000



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

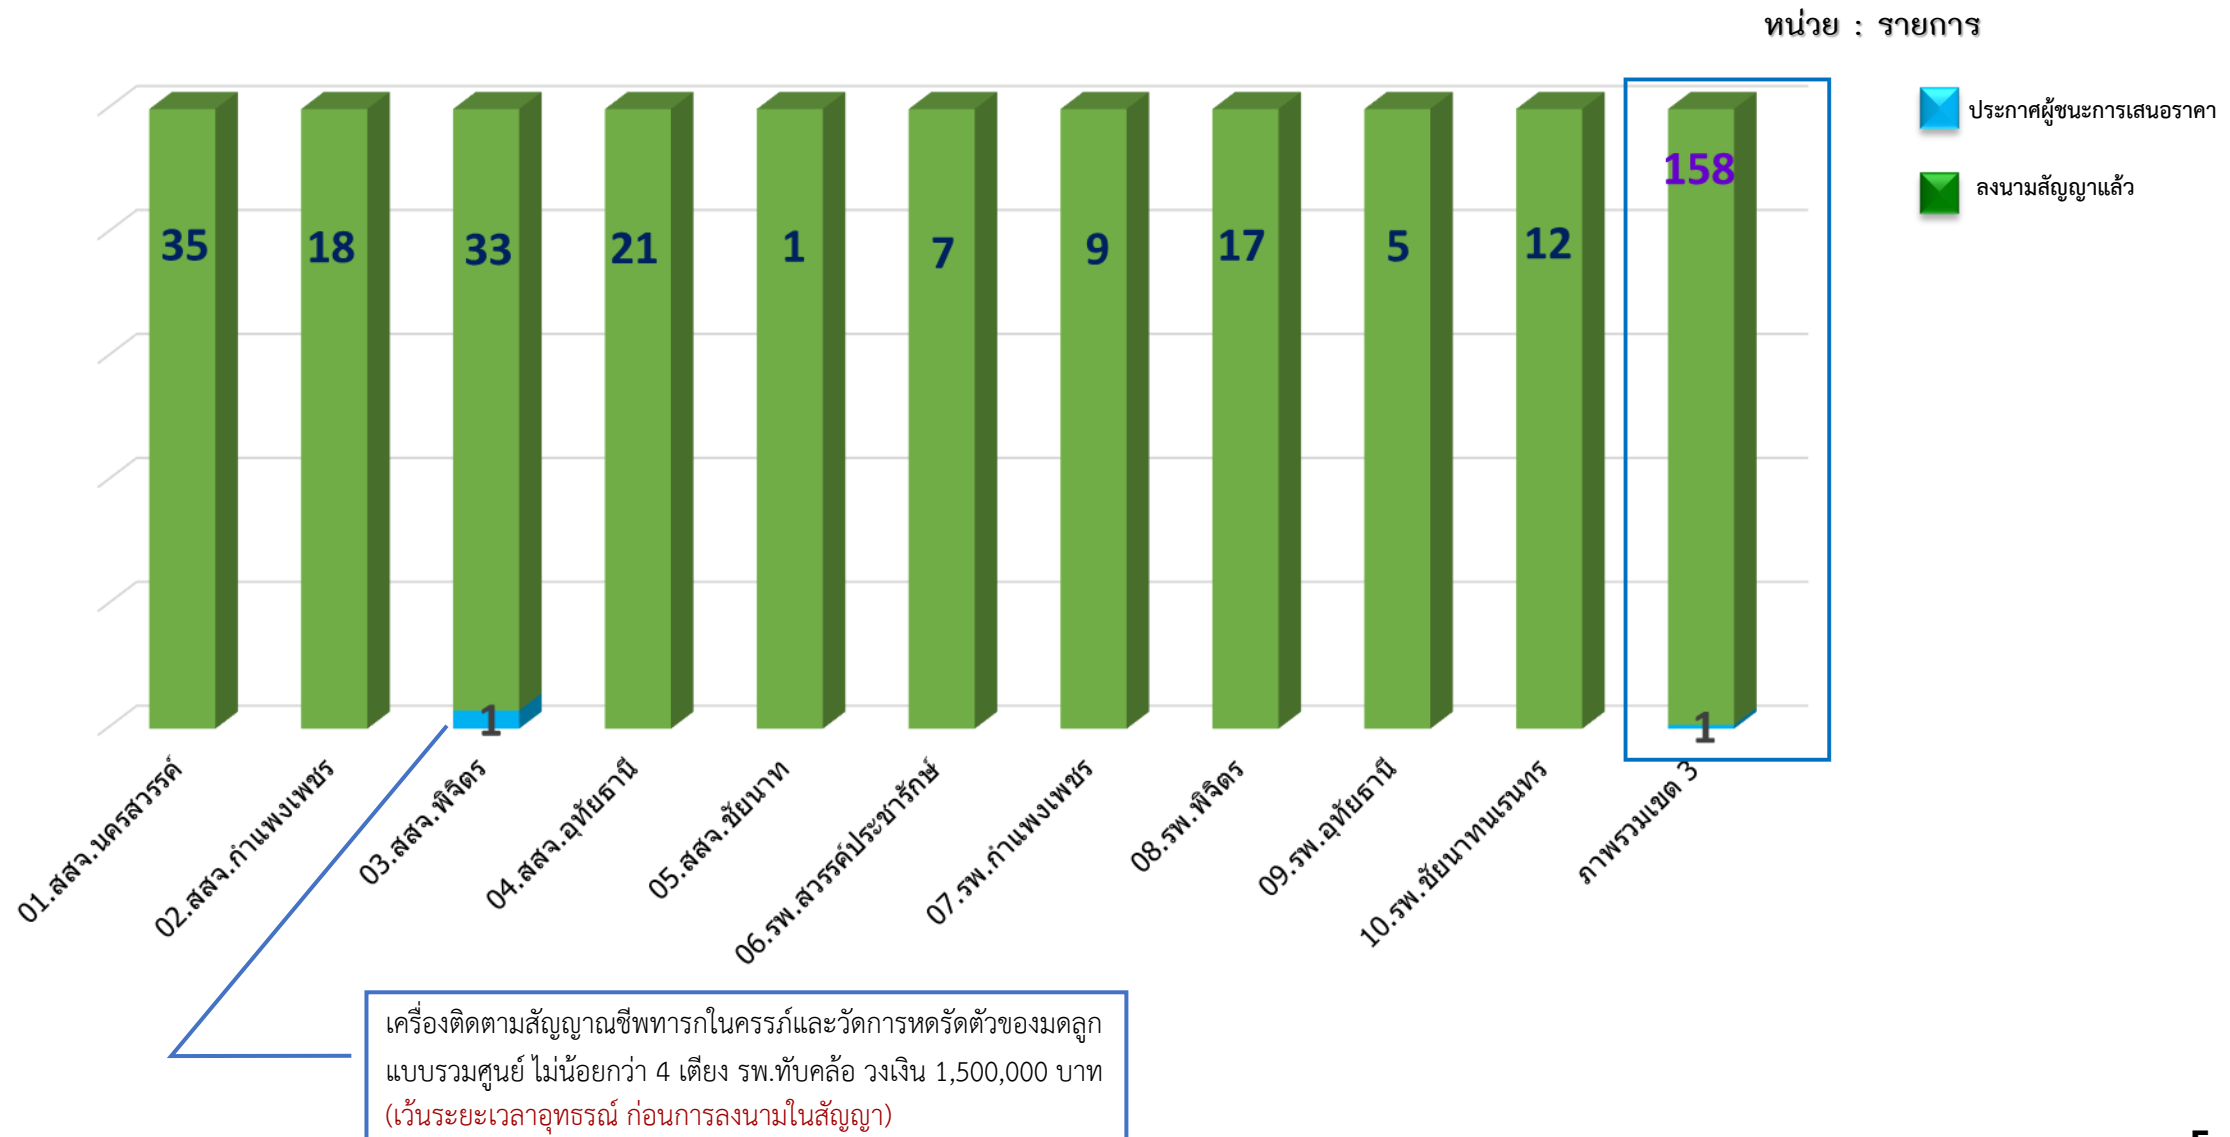

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567


ที่กั้นเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

- วิธี E-bidding จำนวน 27 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	รวมจัดสรร		ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ลงนามสัญญาแล้ว		คืบหน้าประมาณ		หมายเหตุ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	
สสจ.นครสวรรค์	10	50,136,300					10	50,136,300			
สสจ.กำแพงเพชร	6	32,260,000					6	32,260,000			
สสจ.พิจิตร	3	6,454,100					3	6,454,100			
สสจ.อุทัยธานี	2	10,994,000	1	9,393,800			1	1,600,200	1	9,393,800	อาคารจ่ายกลาง รพ.ทัพทัน
สสจ.ชัยนาท	9	47,922,500			1	5,925,600	8	41,996,900	1	5,925,600	ปรับปรุงระบบรณมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดสิงห์
ภาพรวมเขตฯ 3	30	147,766,900	1	9,393,800	1	5,925,600	28	132,447,500	2	15,319,400	

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

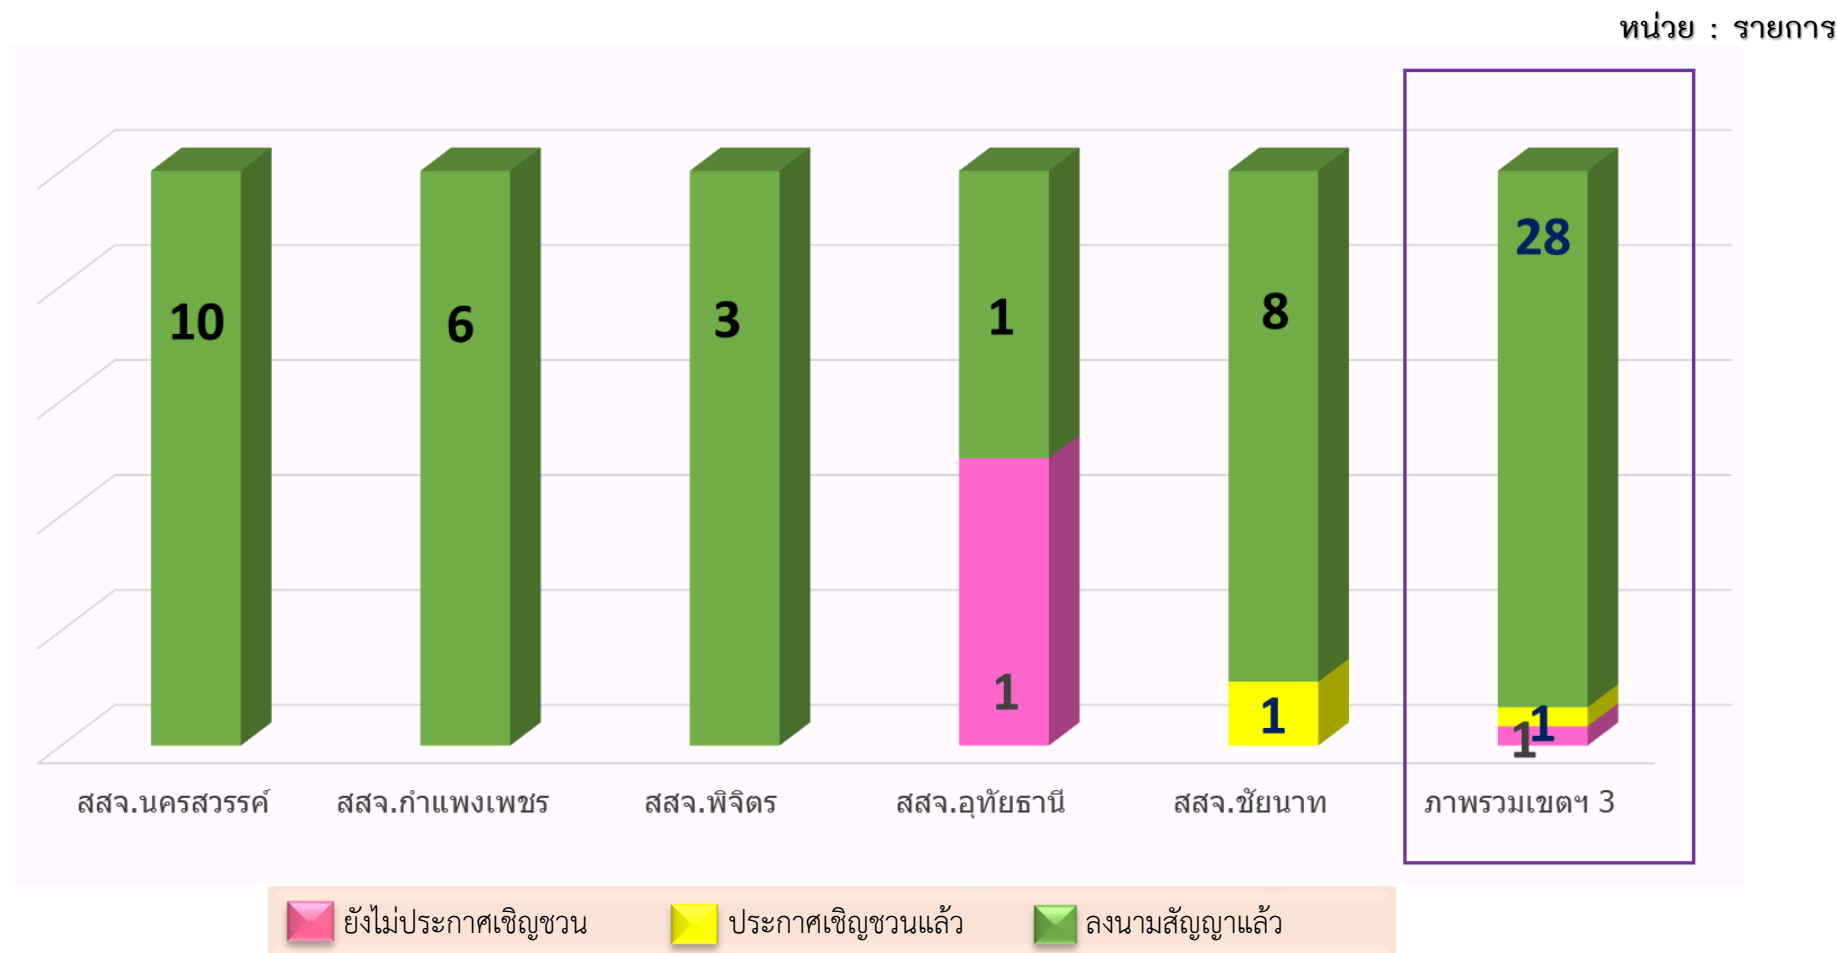

- หมายเหตุ :
1. อาคารจ่ายกลาง รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี วงเงิน 9,393,800 บาท (คืบงบ)
 2. ปรับปรุงระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท วงเงิน 5,925,600 บาท (คืบเงิน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2567)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567 - 2569

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบ ปี 2567	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.สุวรรณประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	16.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	16.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบายกำหนดภายหลังพ้นจาก ระยะเวลาอุทธรณ์	
	ตั้งงบปี 2567		26,472,500				
	ตั้งงบปี 2568		75,005,200				
	ตั้งงบปี 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และ จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และ จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	
	ตั้งงบปี 2567		105,873,500				
	ตั้งงบปี 2568		289,065,400				
	ตั้งงบปี 2569		289,065,400				

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568


รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 67

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	27	40,500,000			27	40,500,000
สสจ.กำแพงเพชร	14	9,250,000	5	550,000	19	9,800,000
สสจ.พิจิตร	12	4,000,000	1	50,000	13	4,050,000
สสจ.อุทัยธานี	4	10,000,000	3	950,000	7	10,950,000
สสจ.ชัยนาท	1	1,000,000	1	350,000	2	1,350,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	1,000,000			1	1,000,000
รพ.กำแพงเพชร			3	1,250,000	3	1,250,000
รพ.พิจิตร	2	2,050,000			2	2,050,000
รพ.อุทัยธานี			3	1,350,000	3	1,350,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร			1	450,000	1	450,000
ภาพรวมเขตฯ 3	61	67,800,000	17	4,950,000	78	72,750,000

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท

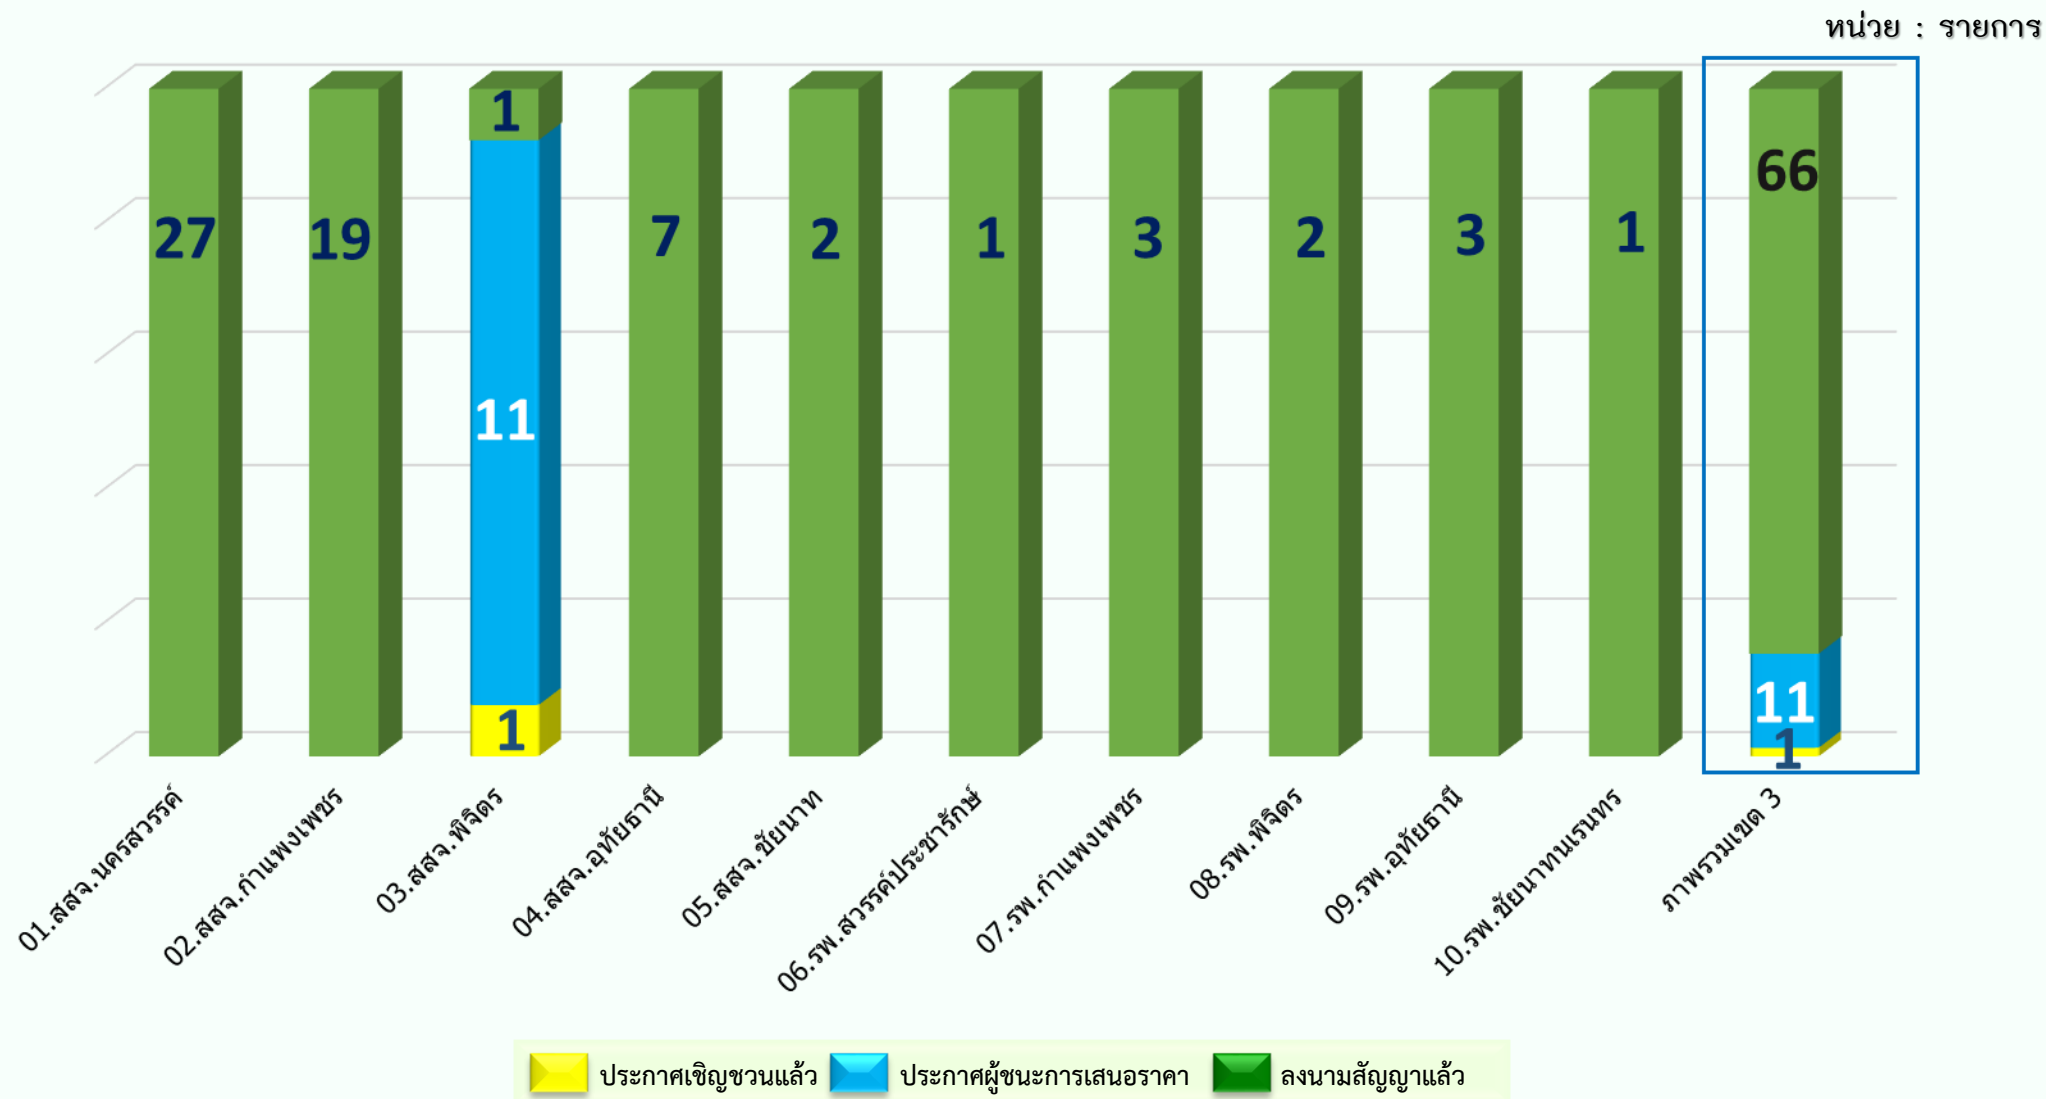

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท


ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 67

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	22	30,700,000	7	2,492,000	29	33,192,000
สสจ.กำแพงเพชร	20	25,110,000	4	880,000	24	25,990,000
สสจ.พิจิตร	26	28,630,000	15	4,051,000	41	32,681,000
สสจ.อุทัยธานี	23	21,470,000	4	1,045,000	27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	10	11,400,000	13	3,461,000	23	14,861,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	60,920,000	1	400,000	8	61,320,000
รพ.กำแพงเพชร	8	16,750,000	1	400,000	9	17,150,000
รพ.พิจิตร	14	29,260,000	1	400,000	15	29,660,000
รพ.อุทัยธานี	8	14,090,000	1	400,000	9	14,490,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	9	22,400,000	2	2,900,000	11	25,300,000
ภาพรวมเขตฯ 3	147	260,730,000	49	16,429,000	196	277,159,000

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท

หน่วย : รายการ

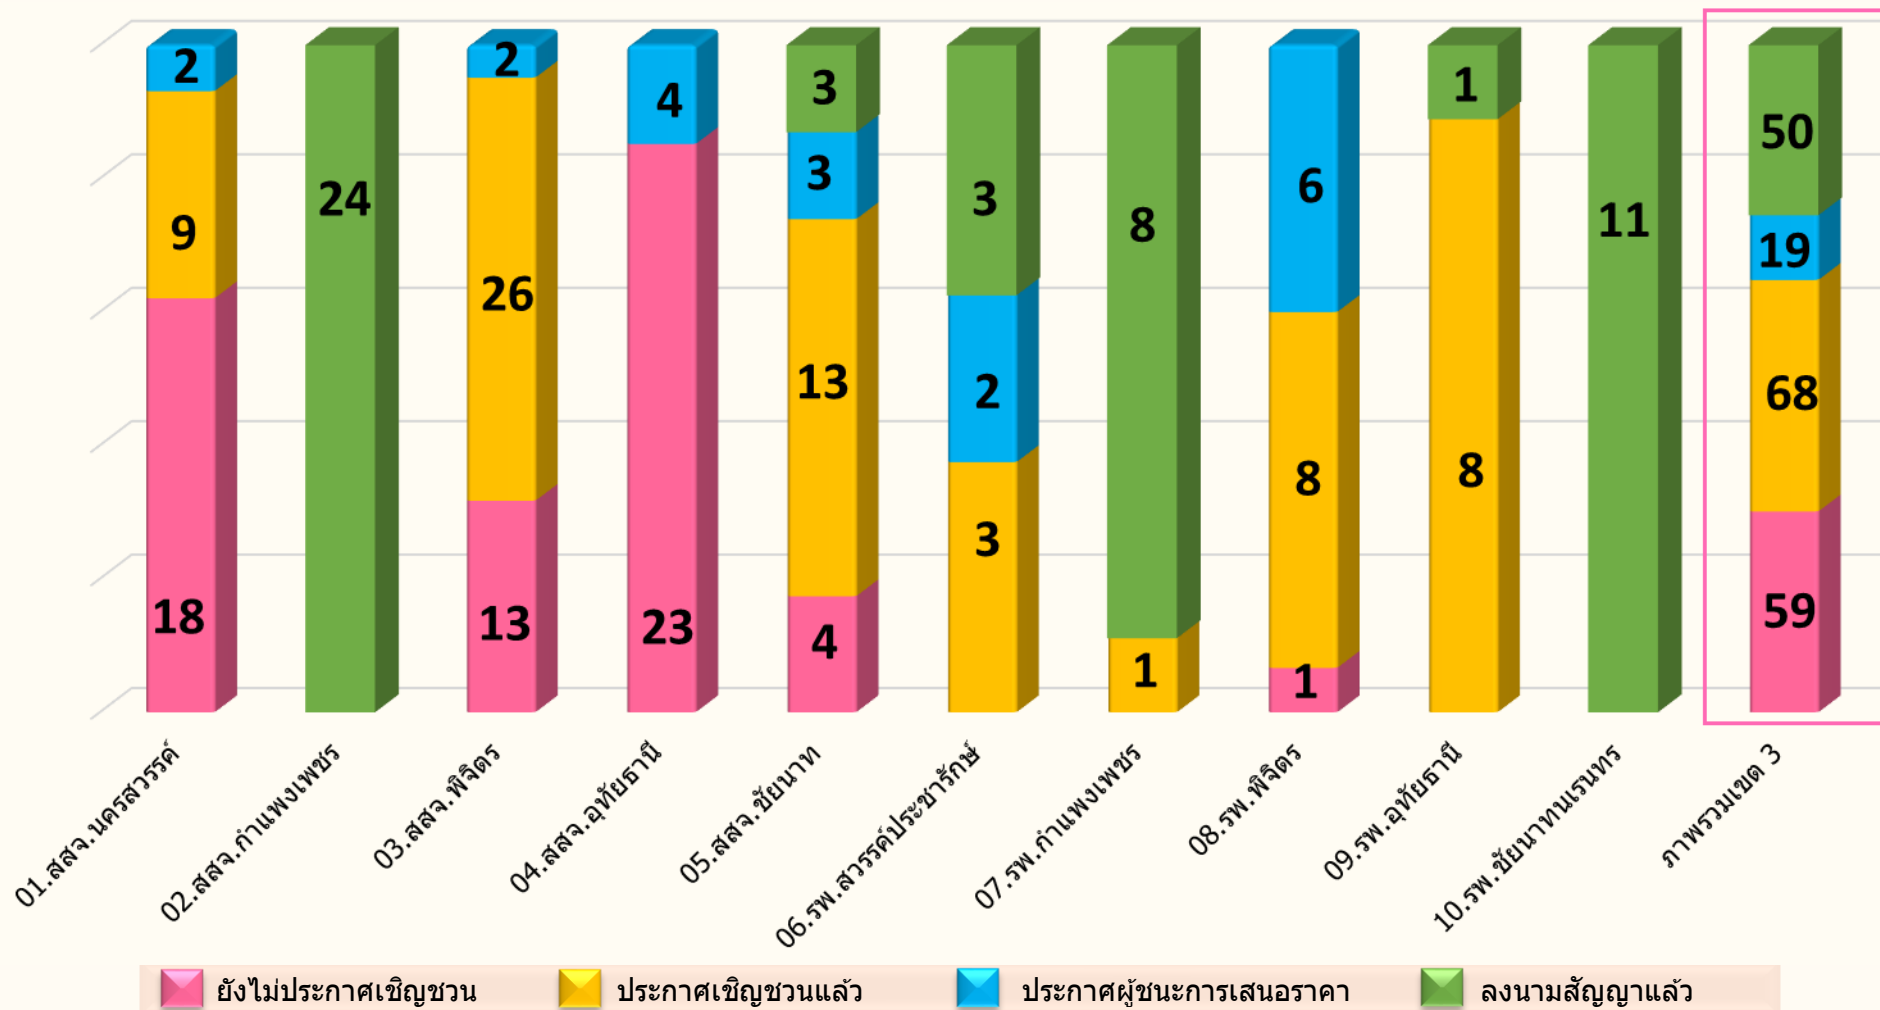

รายงานงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 67

หน่วยบริการ	ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	7	26,984,100	2	81,013,400	9	107,997,500
สสจ.กำแพงเพชร	3	25,789,200	1	158,438,400	4	184,227,600
สสจ.พิจิตร	9	35,999,100			9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	5	24,461,500			5	24,461,500
รพ.สวรรค์ประชารักษ์			1	558,798,300	1	558,798,300
รพ.อุทัยธานี			1	371,145,100	1	371,145,100
ภาพรวมเขตฯ 3	24	113,233,900	5	1,169,395,200	29	1,282,629,100



สังก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งสิ้น 24 รายการ รวมเป็นเงิน 113,233,900 บาท


- วิธี E-bidding จำนวน 22 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	7	26,984,100					7	26,984,100
สสจ.กำแพงเพชร	3	25,789,200					3	25,789,200
สสจ.พิจิตร	7	34,655,500	1	845,000	1	498,600	9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	4	24,259,500			1	202,000	5	24,461,500
ภาพรวมเขตฯ 3	21	111,688,300	1	845,000	1	700,600	24	113,233,900



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568
 รวมทั้งสิ้น 24 รายการ รวมเป็นเงิน 113,233,900 บาท

หน่วย : รายการ

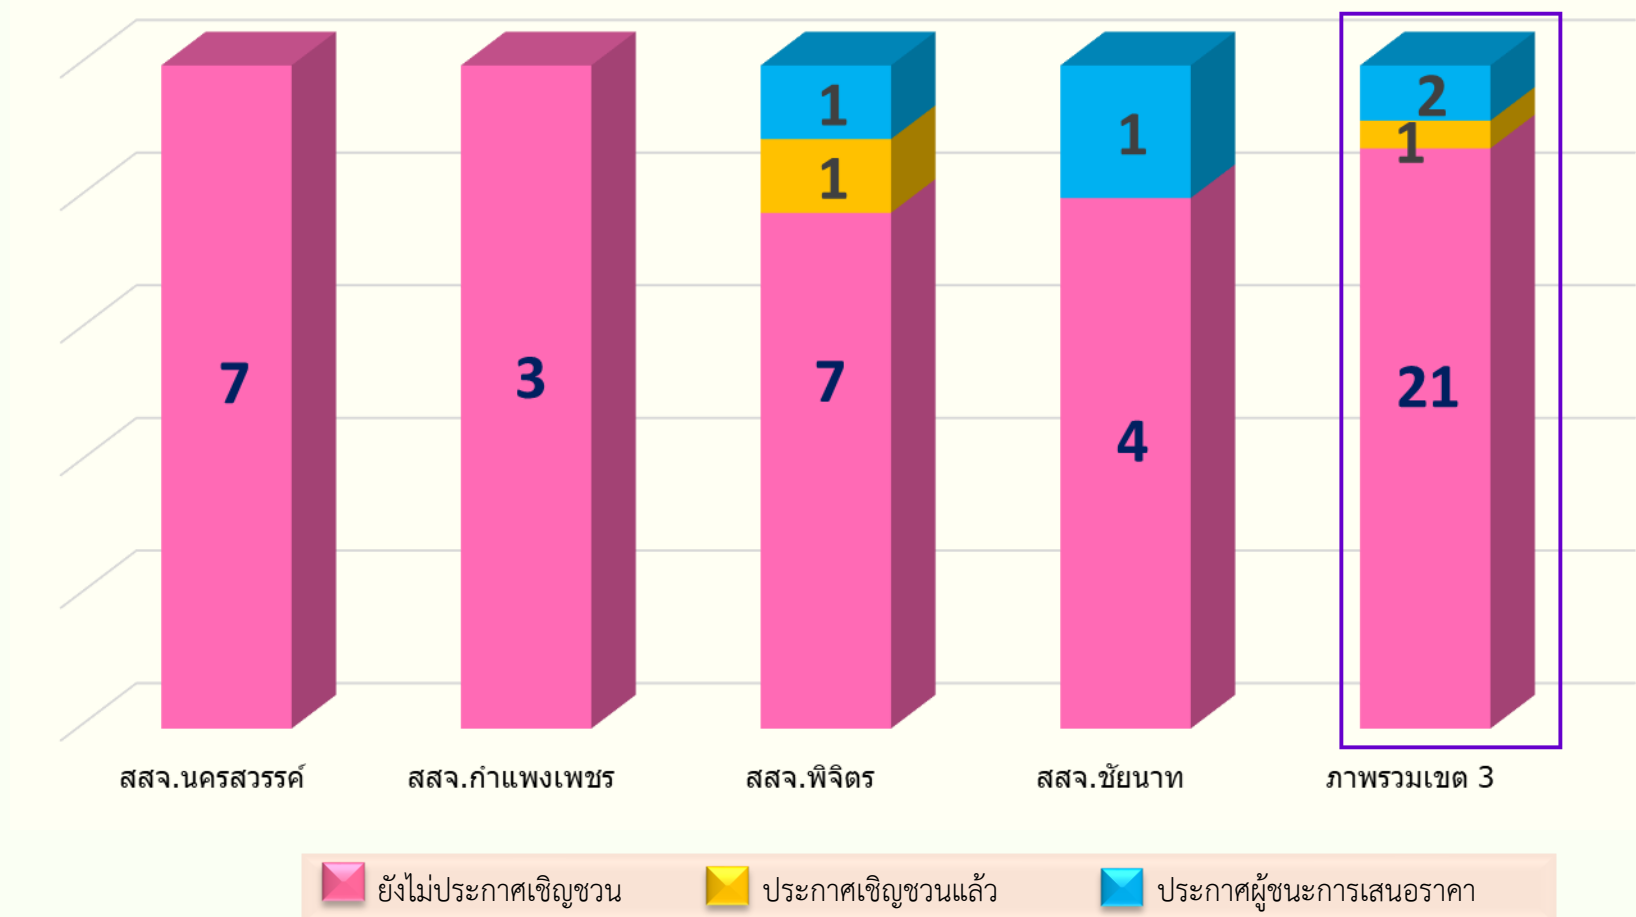



สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 - 2570 จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,169,395,200 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,397 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	74,229,100	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอแบบ แปลน และ BOQ จาก กองแบบแผน
	ตั้งปี 2568		74,229,100				
	ตั้งปี 2569		148,458,100				
	ตั้งปี 2570		148,457,900				
รพ.ชาณุวรลักษบุรี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,682 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	31,687,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอแบบ จากกองแบบแผน
	ตั้งปี 2568		31,687,700				
	ตั้งปี 2569		63,375,400				
	ตั้งปี 2570		63,375,300				
รพ.แม่เปิน	อาคารผู้ป่วยนอก (รพช.) พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,696 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	13,157,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอแบบ แปลน และ BOQ จาก กองแบบแผน
	ตั้งปี 2568		13,157,700				
	ตั้งปี 2569		52,630,800				
	ตั้งปี 2570		-				



สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 - 2570 จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,169,395,200 บาท (ต่อ)

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.แม่เปิน	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	3,045,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอแบบ แปลน และ BOQ จาก กองแบบแผน
	ตั้งปี 2568		3,045,000				
	ตั้งปี 2569		12,179,900				
	ตั้งปี 2570		-				
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,111 ตารางเมตร	1	22,352,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบเงินกู้ ไม่สามารถ ทำได้ เนื่องจาก กบรส. ยังไม่มีที่ ปรึกษา
	ตั้งปี 2568		22,352,000				
	ตั้งปี 2569		44,703,900				
	ตั้งปี 2570		44,703,800				



Thank you





รายละเอียดเพิ่มเติม: รายการครุภัณฑ์ และก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568
ขั้นตอนยังไม่ประกาศเชิญชวน

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

สสจ.นครสวรรค์

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.ลาดยาว	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	1	800,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานขอซื้อคาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ภายในเดือน พ.ย. 67
	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	1	3,800,000	E-bidding			
	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	1	2,500,000	E-bidding			
รพ.ท่าตะโก	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	2,500,000	E-bidding			
	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลในช่องปาก	1	400,000	วิธีเฉพาะเจาะจง			
	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	2	1,280,000	E-bidding			
รพ.ชุมแสง	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	2,500,000	E-bidding			
รพ.โกรกพระ	ยูนิตทำฟัน	2	920,000	E-bidding			
รพ.หนองบัว	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน	1	1,700,000	E-bidding			
รพ.ตากฟ้า	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	1	272,000	วิธีเฉพาะเจาะจง			
รพ.ชุมตาบง	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000	E-bidding			
รพ.ตากถ้ำ	ยูนิตทำฟัน	2	920,000	E-bidding			
	เครื่องส่องรักษาทางทันตกรรมแบบสองด้าน	1	160,000	วิธีเฉพาะเจาะจง			
	ชุดเครื่องมือทันตกรรม	2	400,000	วิธีเฉพาะเจาะจง			
	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	2	300,000	วิธีเฉพาะเจาะจง			

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

สสจ.นครสวรรค์ (ต่อ)

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.หนองบัว	ยูนิตทำฟัน	2	920,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานขอซื้อ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ภายใน เดือนพฤศจิกายน 2567
	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000	E-bidding			
รพ.พยุหะคีรี	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขนเพดาน	1	1,700,000	E-bidding			

สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.ร.ตะพานหิน	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล	1	1,760,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อ รับฟังคำวิจารณ์
รพ.โพทะเล	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	1	2,500,000	E-bidding			
	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	1	640,000	E-bidding			
	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู	1	840,000	E-bidding			
รพ.สามง่าม	เครื่องให้การรักษาทางกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1	900,000	E-bidding			
รพ.ทับคล้อ	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ	2	800,000	E-bidding			
	เครื่องตรวจสแกนหาหลอดเลือดดำต้นไต้ผิวหนัง	4	720,000	E-bidding			

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

สสจ.พิจิตร (ต่อ)

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.บึงนาราง	กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง	1	1,500,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์
	เครื่องจัดตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบสองความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน	1	1,400,000	E-bidding			
	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	1	1,000,000	E-bidding			
	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว	1	500,000	E-bidding			
รพ.ดงเจริญ	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	1	1,000,000	E-bidding			
	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	1	600,000	E-bidding			

สสจ.อุทัยธานี

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.บ้านไร่	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	1	450,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	1	640,000	E-bidding			
	เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ	1	2,800,000	E-bidding			
รพ.ทัพทัน	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000	E-bidding			คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคاب้างจริงวันที่ 14 - 15 พ.ย. 67
	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	1	350,000	E-bidding			
	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	790,000	E-bidding			

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

สสจ.อุทัยธานี (ต่อ)

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.หนองฉาง	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	1	640,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาฉบับจริง วันที่ 14 - 15 พ.ย. 67
	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	1	2,000,000	E-bidding			
	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000	E-bidding			
	เครื่องให้การรักษาทายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1	900,000	E-bidding			
	เครื่องสแกนในช่องปาก 3 มิติ	1	1,600,000	E-bidding			
	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนั่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู	1	840,000	E-bidding			
รพ.สว่างอารมณ์	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	1	450,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	
	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial	1	900,000	E-bidding			
	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	790,000	E-bidding			
	ยูนิตทำฟัน	1	460,000	E-bidding			
	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000	E-bidding			

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

สสจ.อุทัยธานี (ต่อ)

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.ลานสัก	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคามบ้จจริงวันที่ 14 - 15 พ.ย. 67
	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล	1	1,200,000	E-bidding			
รพ.ห้วยคต	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000	E-bidding			
	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	1	350,000	E-bidding			
	ยูนิตทำฟัน	1	460,000	E-bidding			
รพ.หนองขาหย่าง	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล	1	1,200,000	E-bidding			

สสจ.ชัยนาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.วัดสิงห์	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial	1	900,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิก พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	2	900,000	E-bidding			
	เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบห่อตัว	1	250,000	วิธีเฉพาะเจาะจง			
	ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด	1	550,000	E-bidding			

รพ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.พิจิตร	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาคมชัดสูง พร้อมระบบบันทึกวีดิทัศน์	1	3,000,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

สสจ.นครสวรรค์

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม (บาท)	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.ตาคลี	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	1	1,600,500	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ เพื่อเผยแพร่ คาดว่าจะขึ้น ประกาศได้ภายในสัปดาห์นี้
รพ.แม่วงก์	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	1	1,600,500	E-bidding			
	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ข้าราชการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร	1	1,277,700	E-bidding			
รพ.ตากฟ้า	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร	1	2,083,400	E-bidding			อยู่ระหว่างรออนุมัติ และBOQ จาก กองแบบแผน
	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	1	1,600,500	E-bidding			
	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร	1	8,972,000	E-bidding			
รพ.หนองบัว	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร	1	9,849,500	E-bidding			อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการเป็น รพ.ลาดยาว

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

สสจ.กำแพงเพชร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม (บาท)	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.โกสัมพีนคร	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	1	8,596,400	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างรอแบบ และ BOQ จากกองแบบแผน
รพ.ทรายทองวัฒนา	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	1	8,596,400	E-bidding			
รพ.บึงสามัคคี	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	1	8,596,400	E-bidding			

สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม (บาท)	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
รพ.ร.ตะพานหิน	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด	1	2,200,000	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างรอแบบ และ BOQ จากกองแบบแผน
รพ.บางมูลนาก	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	1	8,596,400	E-bidding			
รพ.บึงนาราง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร	1	10,097,300	E-bidding			
รพ.สากเหล็ก	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร	1	10,097,300	E-bidding			
รพ.สามง่าม	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร	1	1,221,500	E-bidding			
รพ.โพทะเล	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร	1	1,221,500	E-bidding			
รพ.วชิรบำรุง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร	1	1,221,500	E-bidding			

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

สสจ.ชัยนาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 11 พ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 12 พ.ย. 67	หมายเหตุ
สสจ.ชัยนาท	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักรักษาพยาบาล 20 ห้อง 10 ครอบครัว (แฟลต 1)	1	3,947,900	E-bidding	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	ยังไม่ประกาศเชิญชวน	อยู่ระหว่างช่างโยธา สสจ. จัดทำแบบรูปรายการ BOQ และงวดเงินงวดงาน
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักรักษาพยาบาล 20 ห้อง 10 ครอบครัว (แฟลต 2)	1	3,947,900	E-bidding			
รพ.สรรพยา	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 295 ตารางเมตร	1	7,633,200	E-bidding			อยู่ระหว่างรอแบบ และ BOQ จากกองแบบแผน
รพ.เนินขาม	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	1	8,730,500	E-bidding			
