

รายงานติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

01

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567
ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

02

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง)
ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 78 รายการ)

03

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

04

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2566 - 2568

05

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

06

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2567 - 2569

07

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

08

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2568 - 2570




รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

3

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 ที่กันเงินเหลือปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

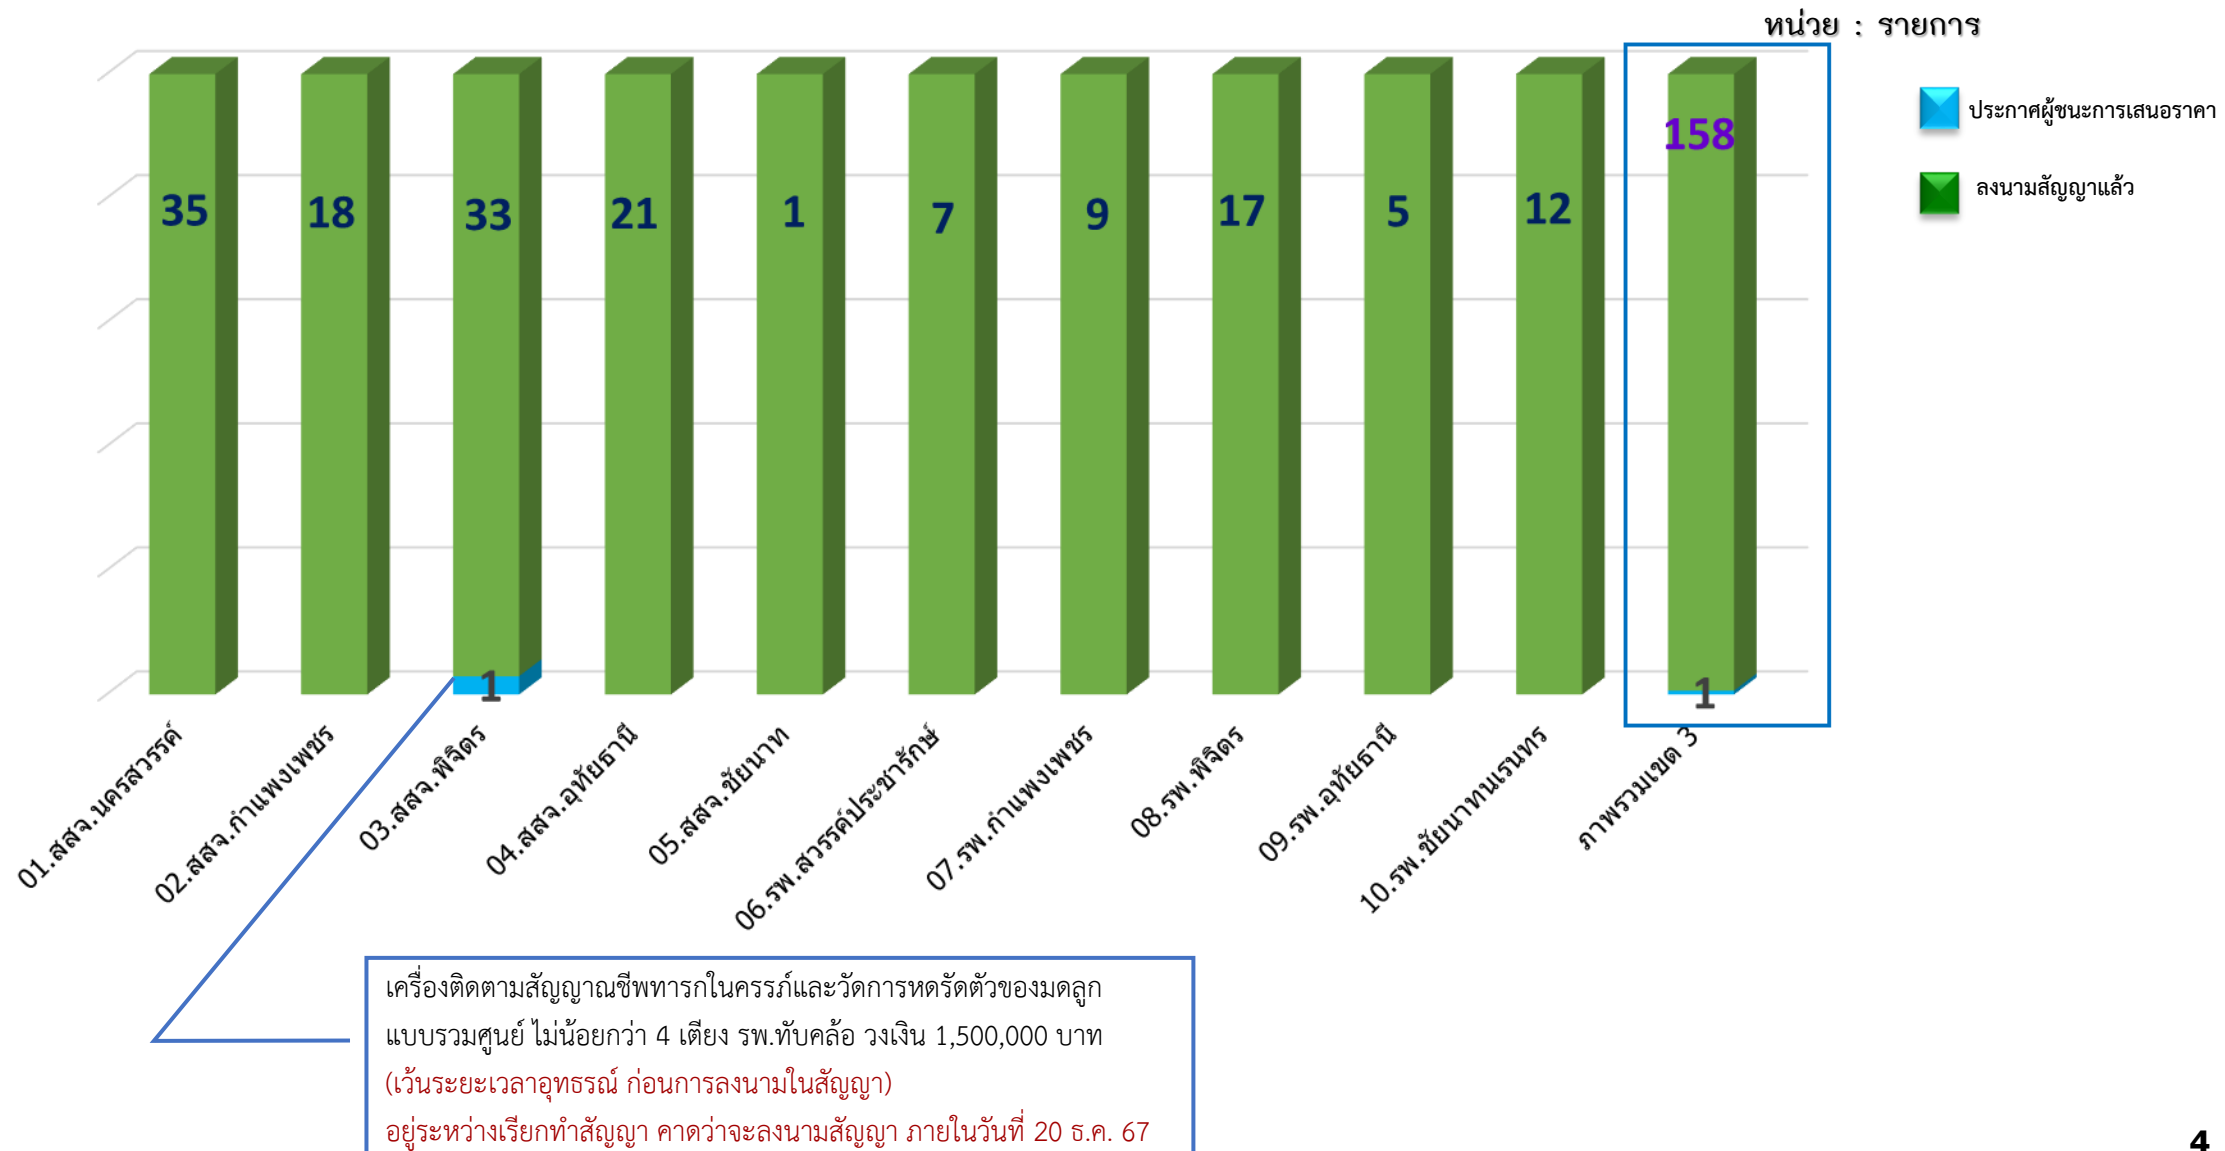

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568


รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 67

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	27	40,500,000			27	40,500,000
สสจ.กำแพงเพชร	14	9,250,000	5	550,000	19	9,800,000
สสจ.พิจิตร	12	4,000,000	1	50,000	13	4,050,000
สสจ.อุทัยธานี	4	10,000,000	3	950,000	7	10,950,000
สสจ.ชัยนาท	1	1,000,000	1	350,000	2	1,350,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	1,000,000			1	1,000,000
รพ.กำแพงเพชร			3	1,250,000	3	1,250,000
รพ.พิจิตร	2	2,050,000			2	2,050,000
รพ.อุทัยธานี			3	1,350,000	3	1,350,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร			1	450,000	1	450,000
ภาพรวมเขตฯ 3	61	67,800,000	17	4,950,000	78	72,750,000

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท

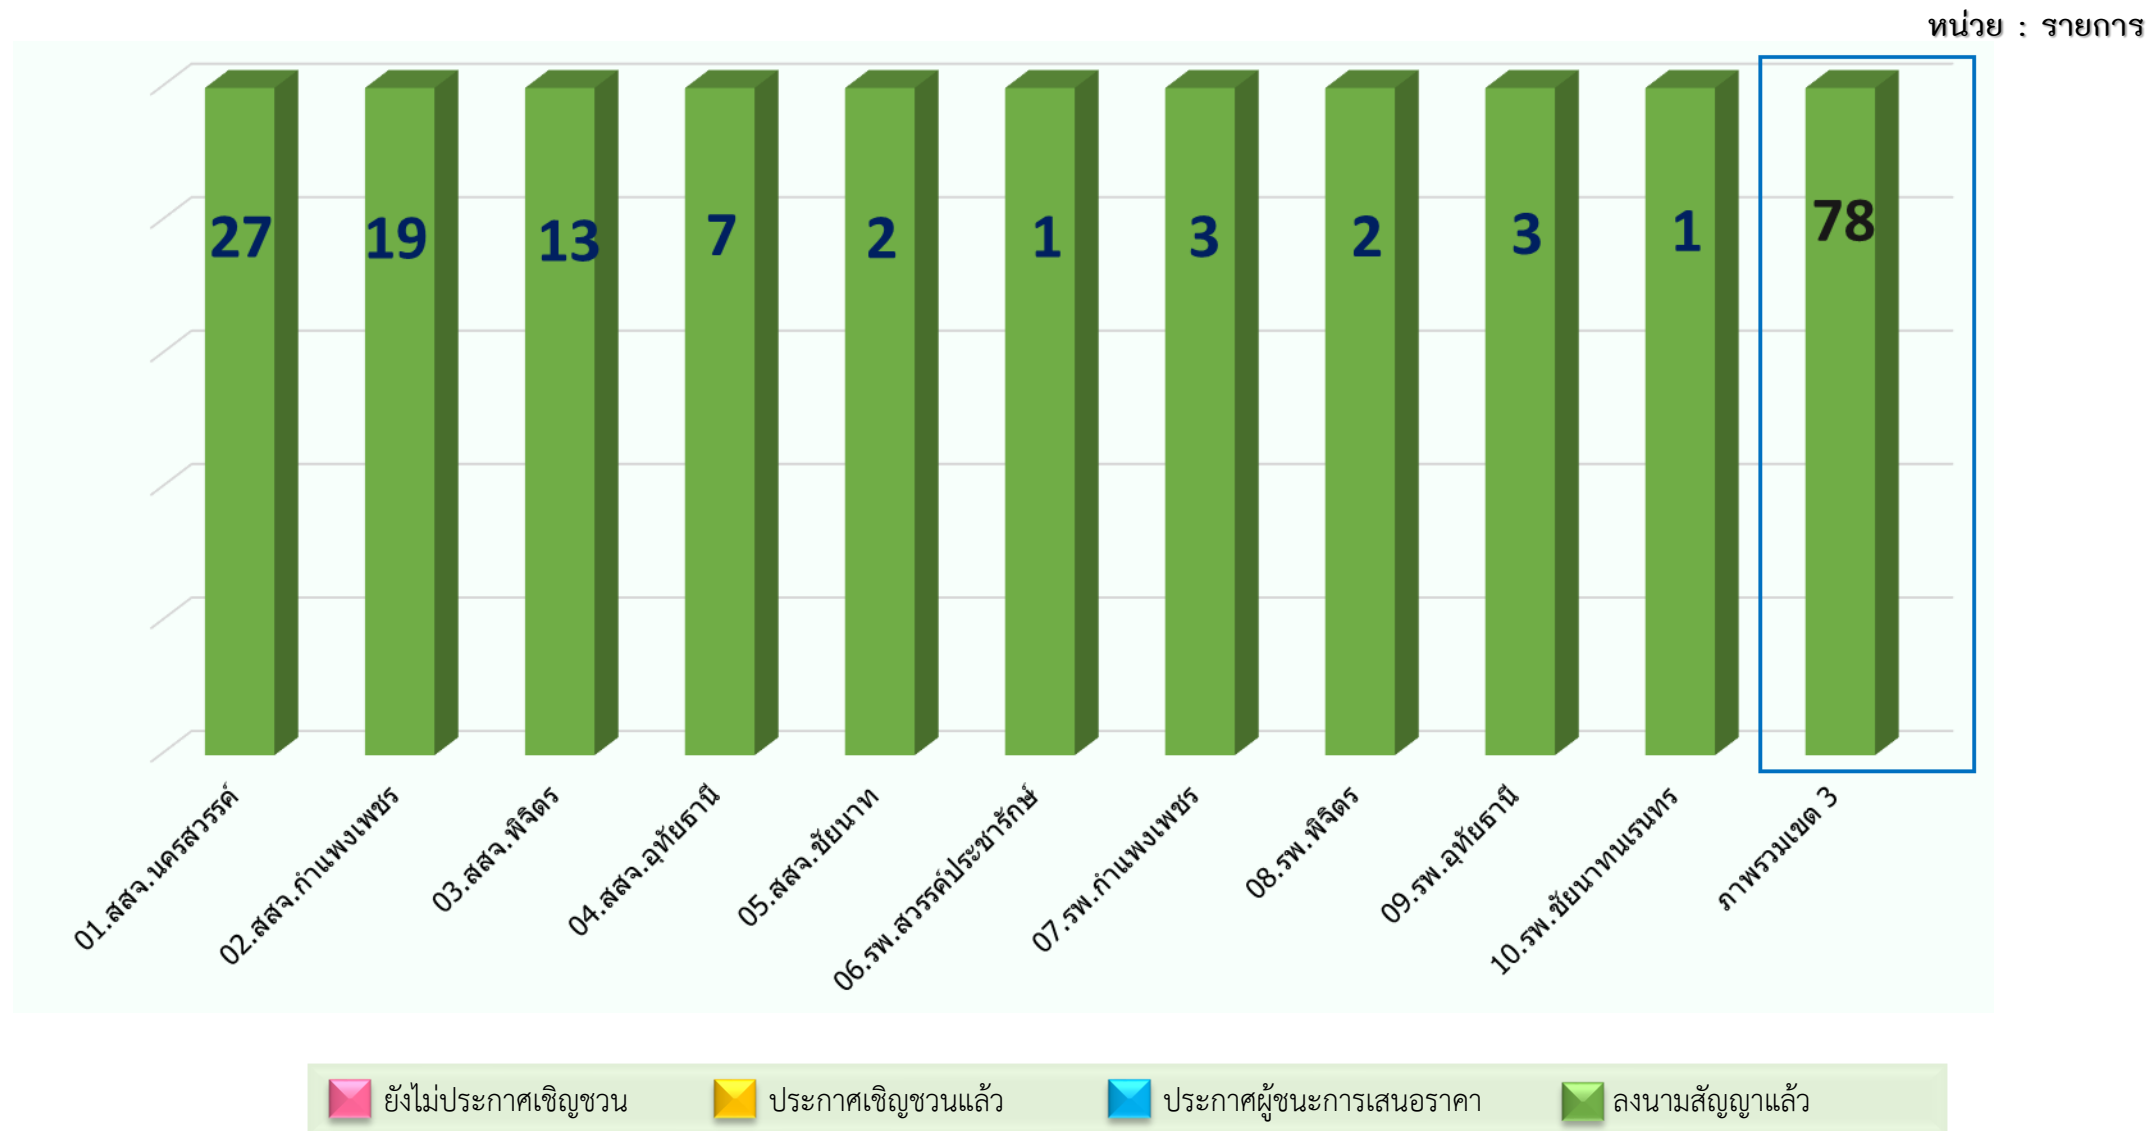

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 67

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	22	30,700,000	7	2,492,000	29	33,192,000
สสจ.กำแพงเพชร	20	25,110,000	4	880,000	24	25,990,000
สสจ.พิจิตร	26	28,630,000	15	4,051,000	41	32,681,000
สสจ.อุทัยธานี	23	21,470,000	4	1,045,000	27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	10	11,400,000	13	3,461,000	23	14,861,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	60,920,000	1	400,000	8	61,320,000
รพ.กำแพงเพชร	8	16,750,000	1	400,000	9	17,150,000
รพ.พิจิตร	14	29,260,000	1	400,000	15	29,660,000
รพ.อุทัยธานี	8	14,090,000	1	400,000	9	14,490,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	9	22,400,000	2	2,900,000	11	25,300,000
ภาพรวมเขตฯ 3	147	260,730,000	49	16,429,000	196	277,159,000


รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท

หน่วย : รายการ

- อยู่ระหว่างรายงาน
คุณลักษณะเฉพาะ
เสนออนุมัติสั่งซื้อ
(15 รายการ)
- คาดว่าจะประกาศเชิญชวน
เสนอราคา 16 ธ.ค. 67
(1 รายการ)

เผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคา
เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 2
สิ้นสุดวันที่ 9 ธ.ค. 67

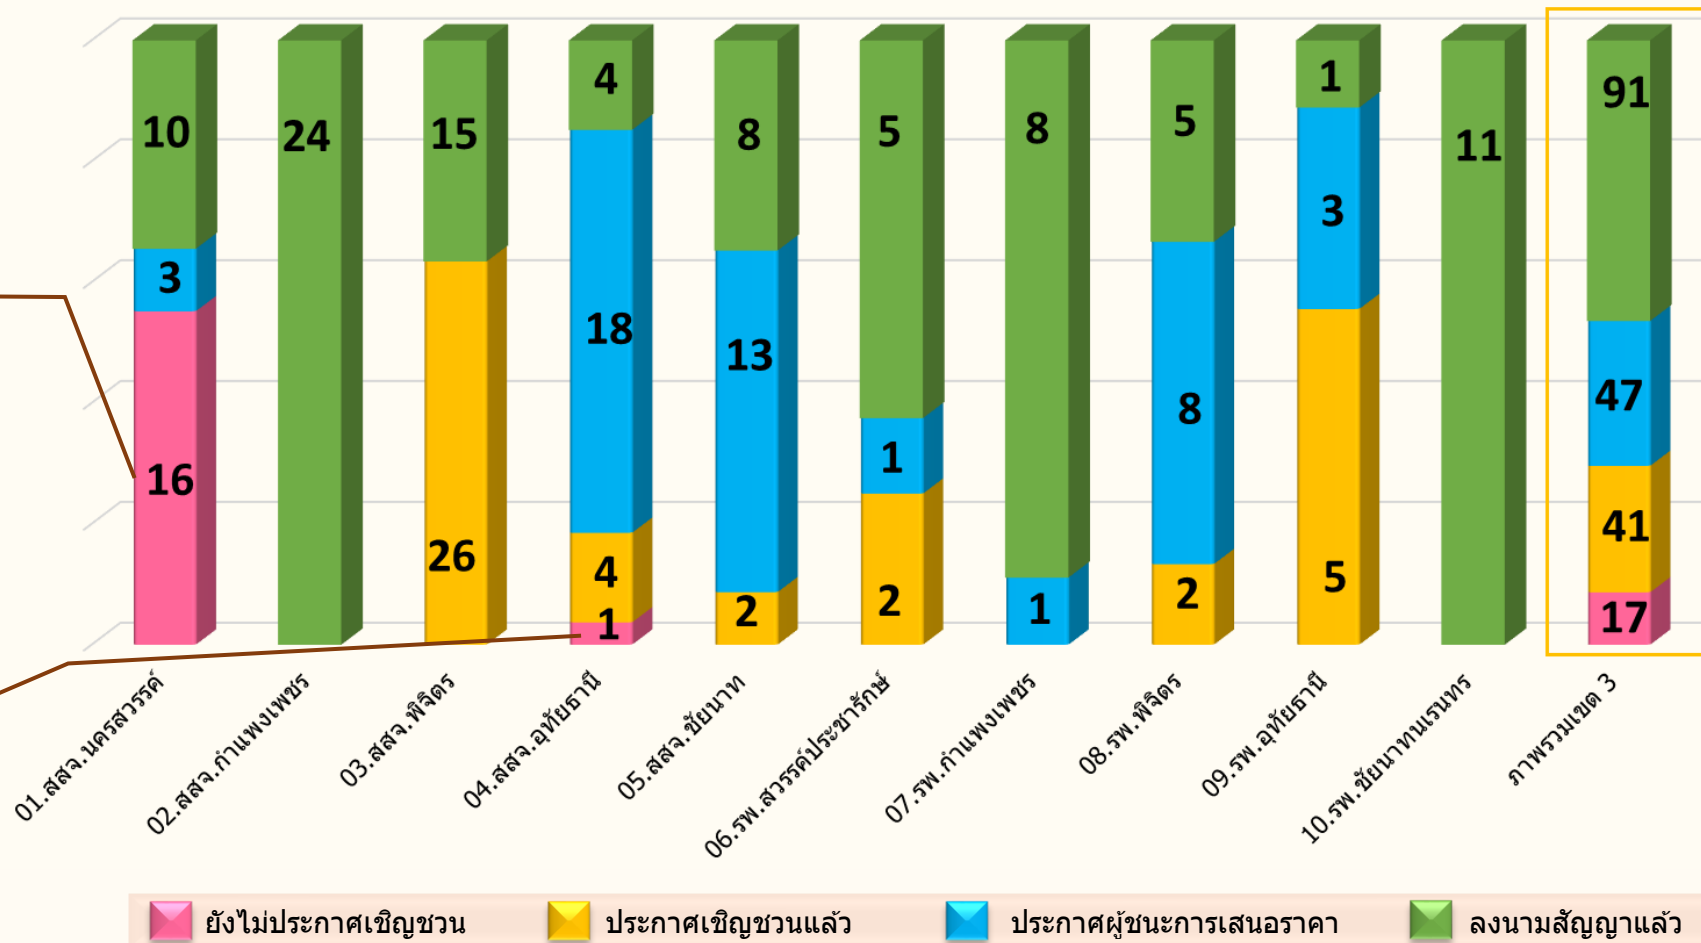

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2566 - 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 67

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า					
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิ วิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	18	11	10	1	57,970,775.00	31%	129,031,725.00	69%	คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 10 - 11 วันที่ 19 ธ.ค. 67
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	135,067,800	28 มี.ค. 68	16	12	11	1	49,786,083.54	29.43%	119,381,716.46	70.57%	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากวัสดุไม่เพียงพอ ต่อการทำงาน

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ที่กัณเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568


1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

(คัณเงิน 2 รายการ คงเหลือ 28 รายการ รวมเป็นเงิน 132,447,500 บาท)

- วิธี E-bidding จำนวน 25 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	รวมจัดสรร		ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ลงนามสัญญาแล้ว	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	10	50,136,300					10	50,136,300
สสจ.กำแพงเพชร	6	32,260,000					6	32,260,000
สสจ.พิจิตร	3	6,454,100					3	6,454,100
สสจ.อุทัยธานี	2	10,994,000	1	9,393,800			1	1,600,200
สสจ.ชัยนาท	9	47,922,500			1	5,925,600	8	41,996,900
ภาพรวมเขตฯ 3	30	147,766,900	1	9,393,800	1	5,925,600	28	132,447,500

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

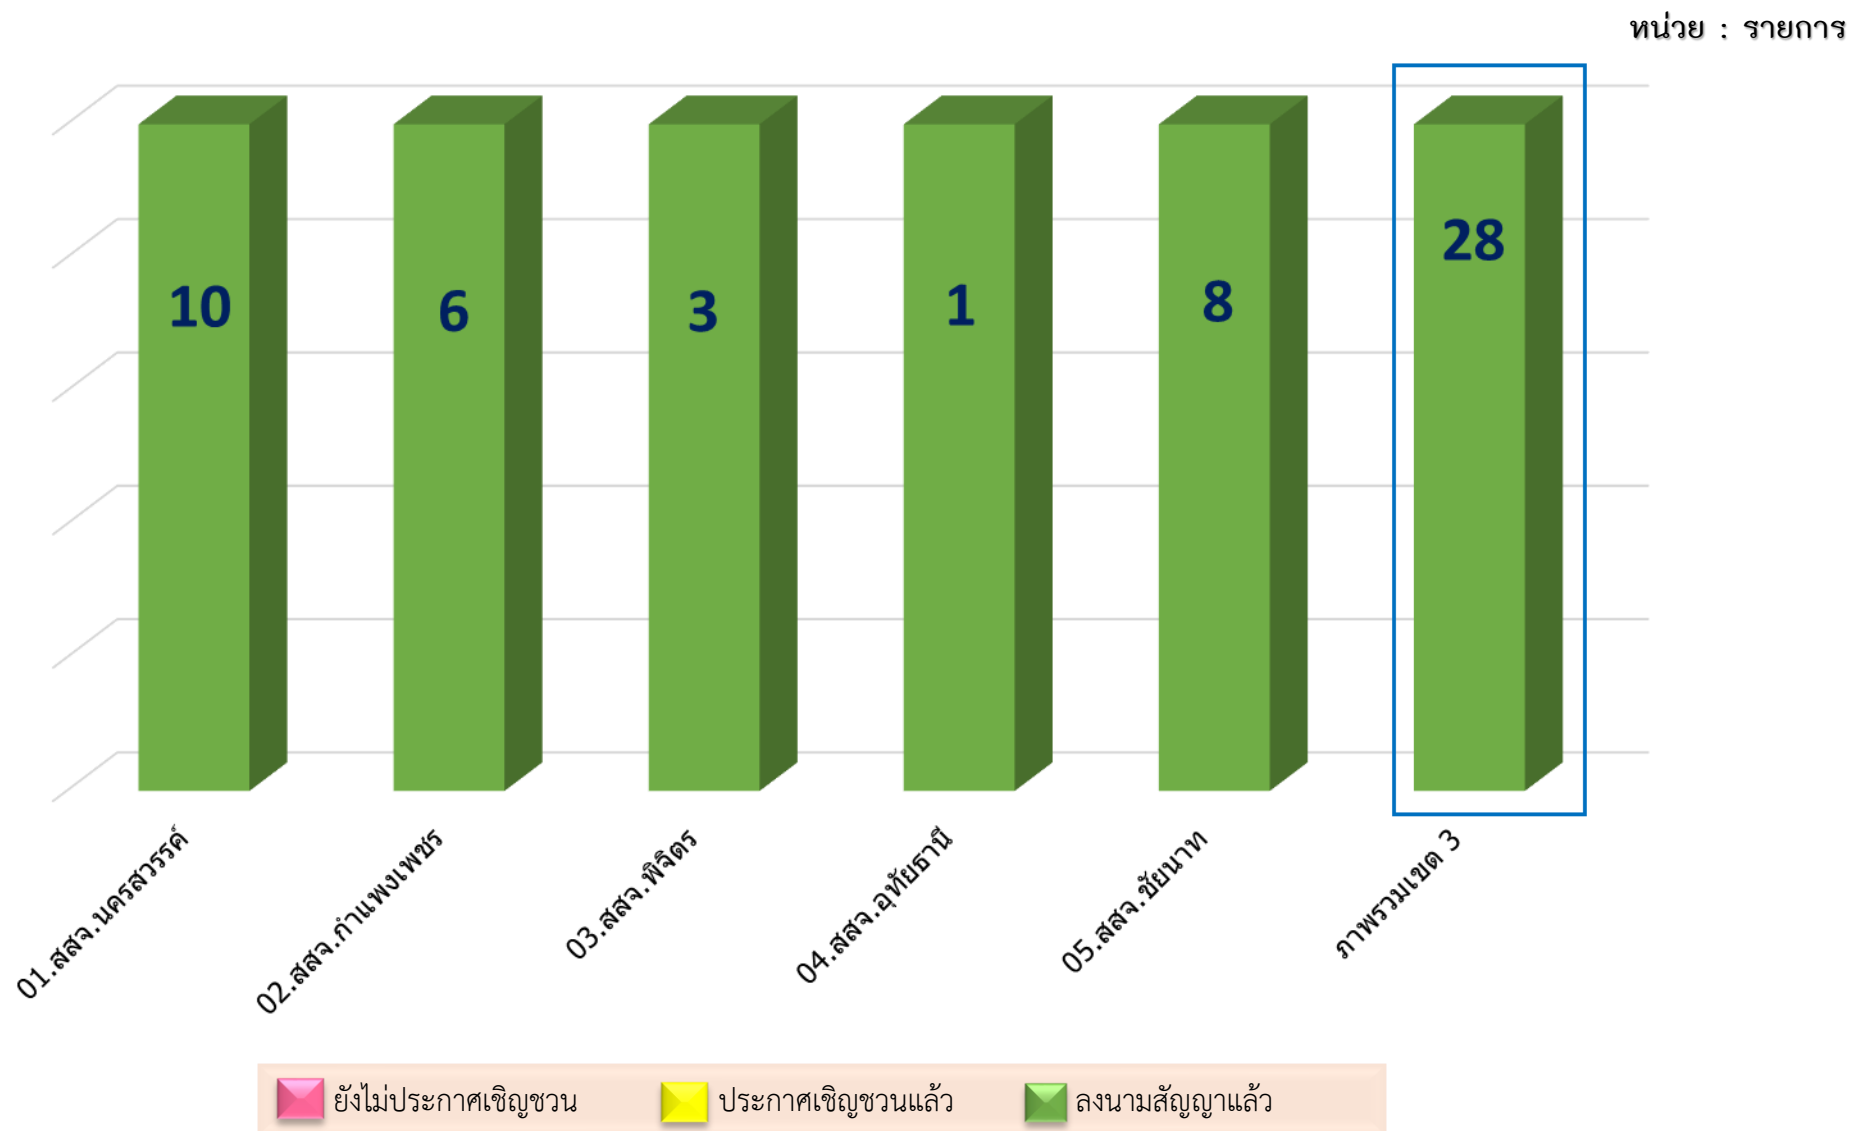

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567 - 2569

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบ ปี 2567	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 2 ธ.ค. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 4 ธ.ค. 67	หมายเหตุ
รพ.สุวรรณประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	16.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	16.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบายกำหนดภายหลังพ้นจาก ระยะเวลาอุทธรณ์	
	ตั้งงบปี 2567		26,472,500				
	ตั้งงบปี 2568		75,005,200				
	ตั้งงบปี 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และ จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และ จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	อยู่ระหว่าง เรียกทำ สัญญา
	ตั้งงบปี 2567		105,873,500				
	ตั้งงบปี 2568		289,065,400				
	ตั้งงบปี 2569		289,065,400				

รายงานงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 67

หน่วยบริการ	ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	7	26,984,100	2	81,013,400	9	107,997,500
สสจ.กำแพงเพชร	3	25,789,200	1	158,438,400	4	184,227,600
สสจ.พิจิตร	9	35,999,100			9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	5	24,461,500			5	24,461,500
รพ.สวรรค์ประชารักษ์			1	558,798,300	1	558,798,300
รพ.อุทัยธานี			1	371,145,100	1	371,145,100
ภาพรวมเขตฯ 3	24	113,233,900	5	1,169,395,200	29	1,282,629,100



สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งสิ้น 24 รายการ รวมเป็นเงิน 113,233,900 บาท


- วิธี E-bidding จำนวน 22 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ลงนามสัญญา		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	2	18,821,500	5	8,162,600					7	26,984,100
สสจ.กำแพงเพชร	3	25,789,200							3	25,789,200
สสจ.พิจิตร	7	34,655,500			1	845,000	1	498,600	9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	4	24,259,500					1	202,000	5	24,461,500
ภาพรวมเขตฯ 3	16	103,525,700	5	8,162,600	1	845,000	2	700,600	24	113,233,900



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568
 รวมทั้งสิ้น 24 รายการ รวมเป็นเงิน 113,233,900 บาท

หน่วย : รายการ

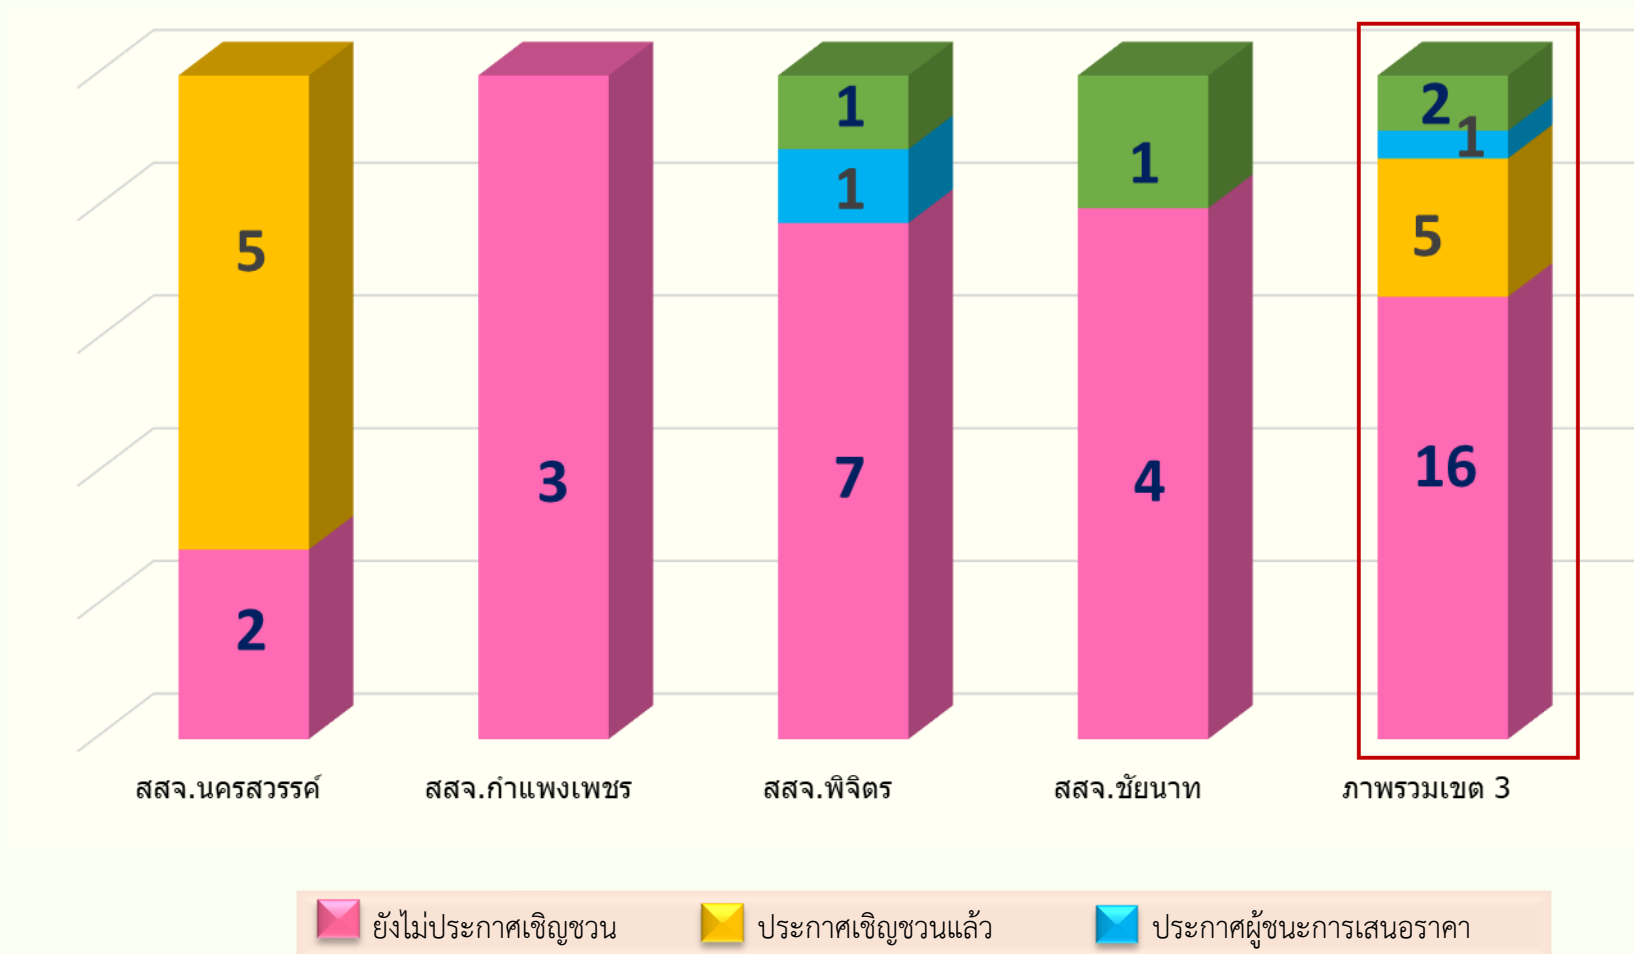

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 2 ธ.ค. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 4 ธ.ค. 67	หมายเหตุ
รพ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,397 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	74,229,100	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอ แบบแปลน และ BOQ จาก กองแบบแผน
	ตั้งปี 2568		74,229,100				
	ตั้งปี 2569		148,458,100				
	ตั้งปี 2570		148,457,900				
รพ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,682 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	31,687,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอเอกสาร รายการประกอบแบบ +แบบแปลน + ประมาณราคา จาก กรบส.
	ตั้งปี 2568		31,687,700				
	ตั้งปี 2569		63,375,400				
	ตั้งปี 2570		63,375,300				
รพ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์	อาคารผู้ป่วยนอก (รพช.) พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,696 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	13,157,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอแบบ แปลน และ BOQ จาก กองแบบแผน
	ตั้งปี 2568		13,157,700				
	ตั้งปี 2569		52,630,800				
	ตั้งปี 2570		-				



สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 - 2570 จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,169,395,200 บาท (ต่อ)

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 2 ธ.ค. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 4 ธ.ค. 67	หมายเหตุ
รพ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	3,045,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอแบบ แปลน และ BOQ จาก กองแบบแผน
	ตั้งปี 2568		3,045,000				
	ตั้งปี 2569		12,179,900				
	ตั้งปี 2570		-				
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์	อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,111 ตารางเมตร	1	22,352,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เป็นงบเงินกู้ ยังไม่ สามารถทำได้ เนื่องจาก กบรส. ยังไม่มีที่ปรึกษา
	ตั้งปี 2568		22,352,000				
	ตั้งปี 2569		44,703,900				
	ตั้งปี 2570		44,703,800				
