

รายงานติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ณ วันที่ 13 มกราคม 2568

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

01

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567
ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 159 รายการ)

02

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง)
ที่กันเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 78 รายการ)

03

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

04

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2566 - 2568

05

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 รายการ)

06

สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567 - 2569
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ)

07

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

08

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2568 - 2570



รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 68


หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	25	48,110,000	10	3,150,000	35	51,260,000
สสจ.กำแพงเพชร	17	33,200,000	1	350,000	18	33,550,000
สสจ.พิจิตร	23	30,610,000	11	3,540,000	34	34,150,000
สสจ.อุทัยธานี	14	18,180,000	7	2,716,000	21	20,896,000
สสจ.ชัยนาท	1	2,200,000			1	2,200,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	37,200,000			7	37,200,000
รพ.กำแพงเพชร	9	36,750,000			9	36,750,000
รพ.พิจิตร	17	47,818,000			17	47,818,000
รพ.อุทัยธานี	5	13,600,000			5	13,600,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	12	33,750,000			12	33,750,000
ภาพรวมเขตฯ 3	130	301,418,000	29	9,756,000	159	311,174,000



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

หน่วย : รายการ

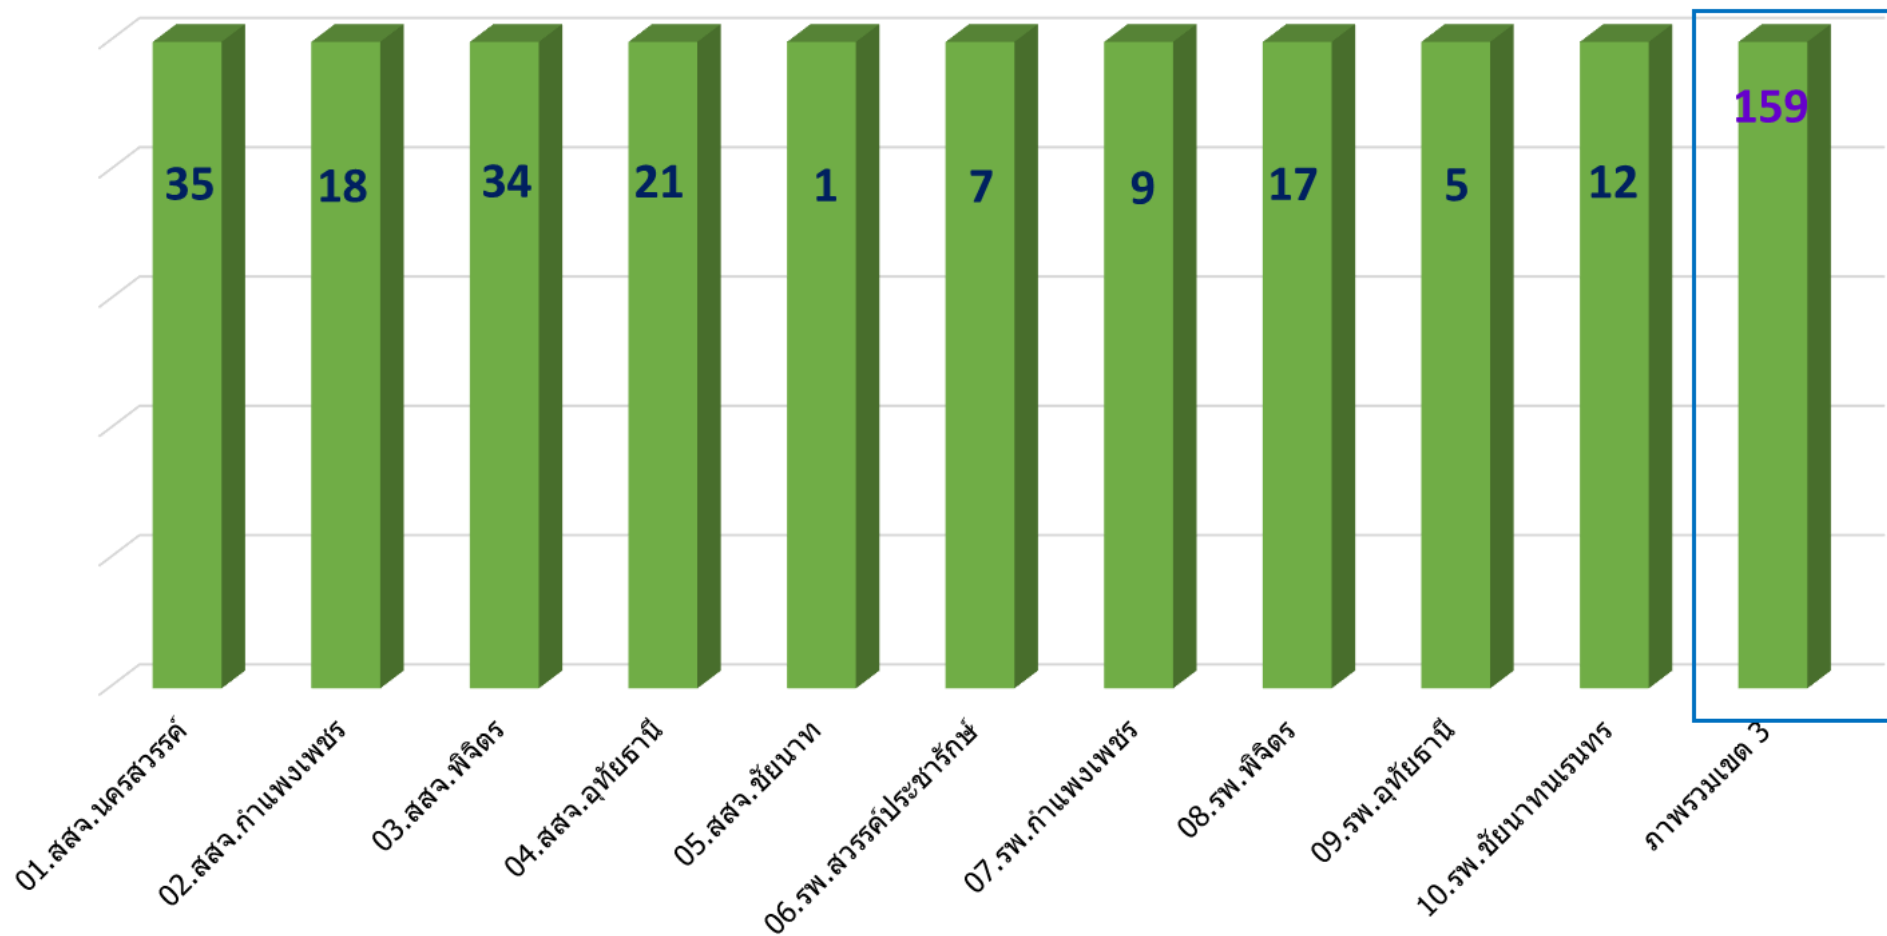

ยังไม่ประกาศเชิญชวน



ประกาศเชิญชวนแล้ว



ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



ลงนามสัญญาแล้ว

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568


รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 68

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	27	40,500,000			27	40,500,000
สสจ.กำแพงเพชร	14	9,250,000	5	550,000	19	9,800,000
สสจ.พิจิตร	12	4,000,000	1	50,000	13	4,050,000
สสจ.อุทัยธานี	4	10,000,000	3	950,000	7	10,950,000
สสจ.ชัยนาท	1	1,000,000	1	350,000	2	1,350,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	1,000,000			1	1,000,000
รพ.กำแพงเพชร			3	1,250,000	3	1,250,000
รพ.พิจิตร	2	2,050,000			2	2,050,000
รพ.อุทัยธานี			3	1,350,000	3	1,350,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร			1	450,000	1	450,000
ภาพรวมเขตฯ 3	61	67,800,000	17	4,950,000	78	72,750,000

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รวมทั้งสิ้น 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท

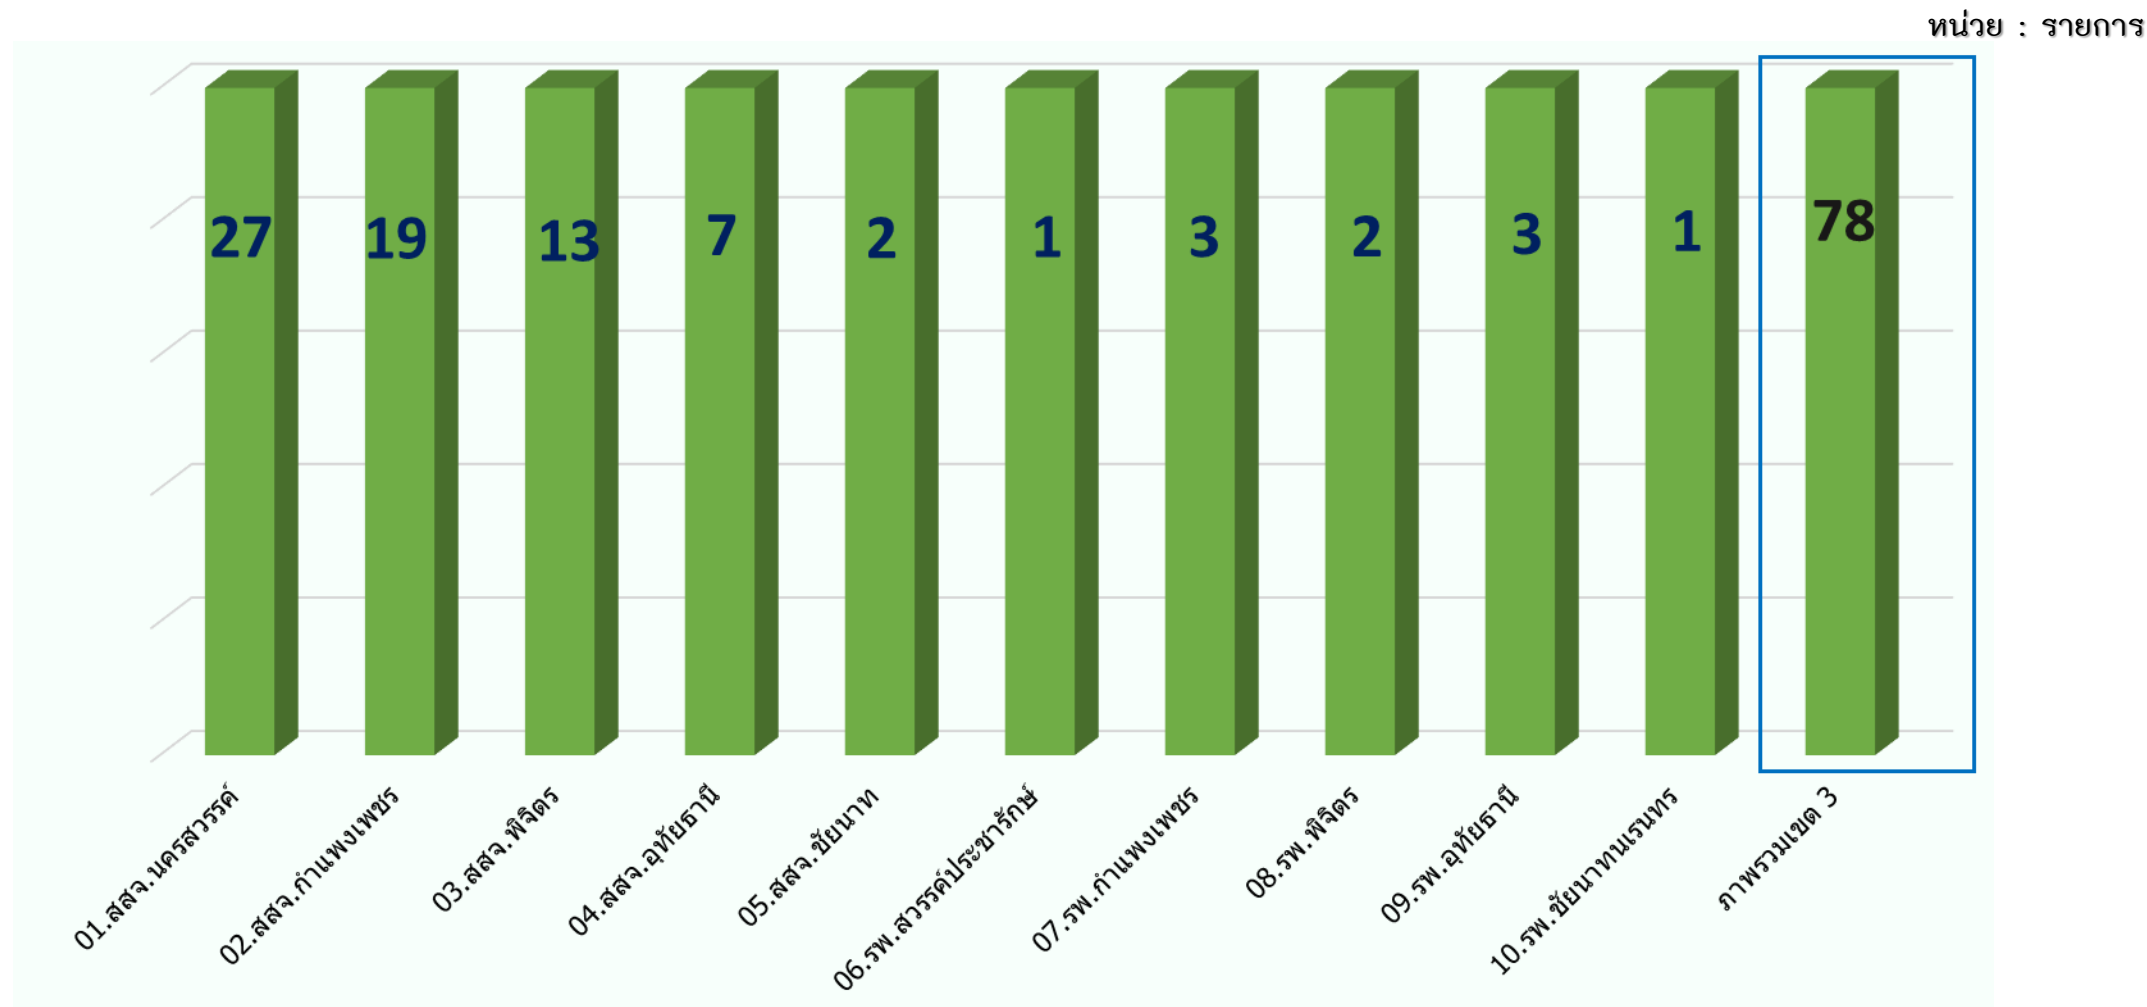

ยังไม่ประกาศเชิญชวน



ประกาศเชิญชวนแล้ว



ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



ลงนามสัญญาแล้ว

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท


ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 68

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	22	30,700,000	7	2,492,000	29	33,192,000
สสจ.กำแพงเพชร	20	25,110,000	4	880,000	24	25,990,000
สสจ.พิจิตร	26	28,630,000	15	4,051,000	41	32,681,000
สสจ.อุทัยธานี	23	21,470,000	4	1,045,000	27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	10	11,400,000	13	3,461,000	23	14,861,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	60,920,000	1	400,000	8	61,320,000
รพ.กำแพงเพชร	8	16,750,000	1	400,000	9	17,150,000
รพ.พิจิตร	14	29,260,000	1	400,000	15	29,660,000
รพ.อุทัยธานี	8	14,090,000	1	400,000	9	14,490,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	9	22,400,000	2	2,900,000	11	25,300,000
ภาพรวมเขตฯ 3	147	260,730,000	49	16,429,000	196	277,159,000

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท

หน่วย : รายการ

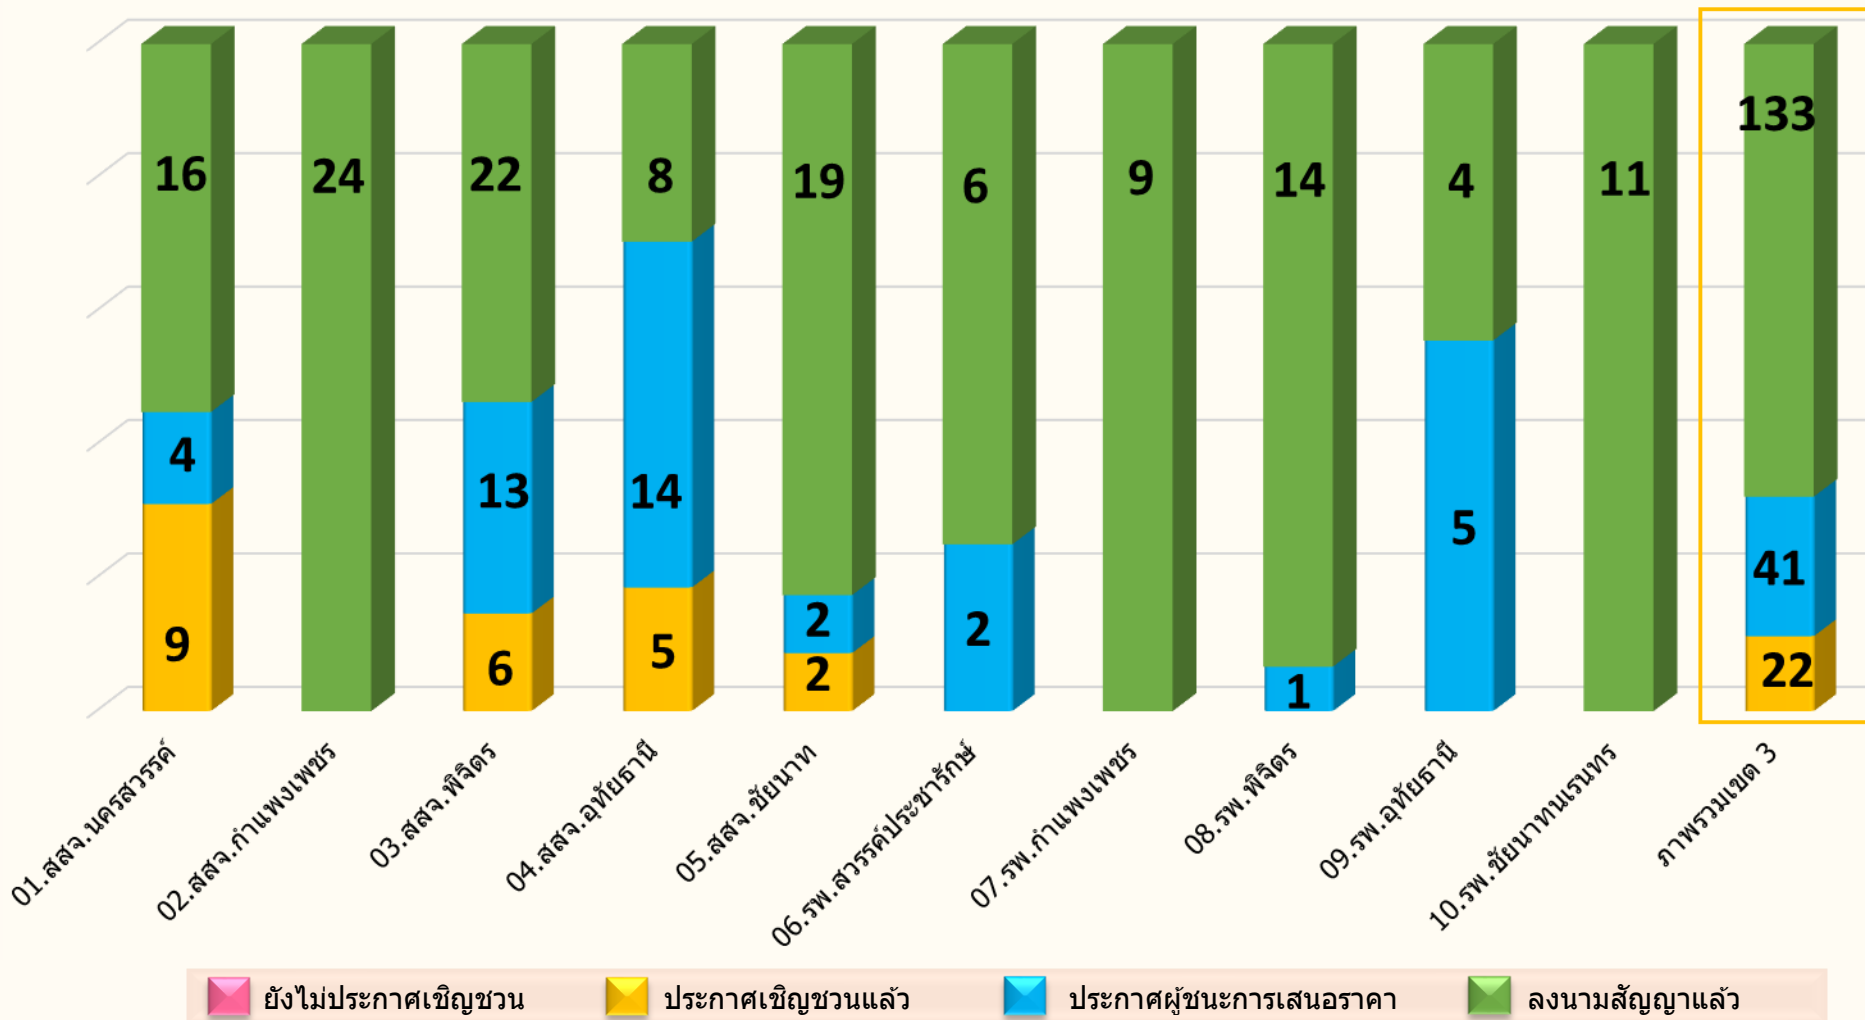

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2566 - 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 68

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า					
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิ วิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	18	11	12	-	82,281,100.00	44%	104,721,400.00	56%	
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	135,067,800	28 มี.ค. 68	16	13	12	1	57,990,721.84	34.28%	111,177,078.16	65.72%	- เนื่องจากวัสดุไม่ เพียงพอต่อการทำงาน วัสดุเข้าหน้างานล่าช้า - ตรวจรับงวดงานที่ 12 วันที่ 20 ม.ค. 68

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567


ที่กั้นเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 68

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท
 (คืบเงิน 2 รายการ คงเหลือ 28 รายการ รวมเป็นเงิน 132,447,500 บาท)

- วิธี E-bidding จำนวน 25 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วย : รายการ

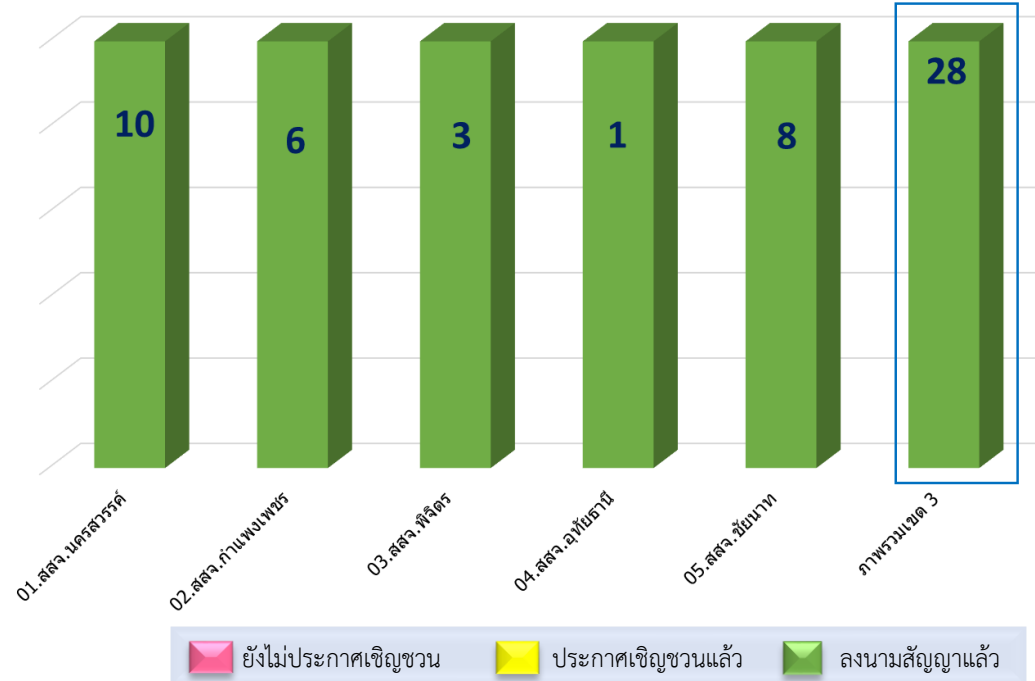

หน่วยบริการ	รวมจัดสรร		ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ลงนามสัญญาแล้ว	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ. นครสวรรค์	10	50,136,300					10	50,136,300
สสจ. กำแพงเพชร	6	32,260,000					6	32,260,000
สสจ. พิจิตร	3	6,454,100					3	6,454,100
สสจ. อุทัยธานี	2	10,994,000	1	9,393,800			1	1,600,200
สสจ. ชัยนาท	9	47,922,500			1	5,925,600	8	41,996,900
ภาพรวมเขต 3	30	147,766,900	1	9,393,800	1	5,925,600	28	132,447,500

รายการก่อสร้าง รพ.ทัพทัน และ รพ.วัดสิงห์ ได้ดำเนินการคืบเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567 - 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 68

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบประมาณ 2567	1-วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 6 ม.ค. 68	สถานะการดำเนินงาน ณ 13 ม.ค. 68	หมายเหตุ
รพ.สุวรรณประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	18.จัดทำบันทึกรายงานผล การพิจารณา	18.จัดทำบันทึกรายงานผล การพิจารณา	
	ตั้งงบประมาณ 2567		26,472,500				
	ตั้งงบประมาณ 2568		75,005,200				
	ตั้งงบประมาณ 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอ ราคาทุกรายทราบ	18.จัดทำบันทึกรายงานผล การพิจารณา	
	ตั้งงบประมาณ 2567		105,873,500				
	ตั้งงบประมาณ 2568		289,065,400				
	ตั้งงบประมาณ 2569		289,065,400				

รายการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม. รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 วงเงิน 594,000,000 บาท จำนวน 22 งวด วันเริ่มสัญญา 11 ม.ค. 68 – สัญญาสิ้นสุด 16 พ.ย. 70 (1,040 วัน)

งวดงานที่	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดแล้วเสร็จ (วัน)	วันเริ่ม - สิ้นสุดงวด
1	26,433,000	90	11 ม.ค. 68 - 11 เม.ย. 68
2	16,335,000	45	12 เม.ย. 68 - 25 พ.ค. 68
3	12,177,000	45	26 พ.ค. 68 - 9 ก.ค. 68
4	13,008,600	45	10 ก.ค. 68 - 23 ส.ค. 68
5	13,008,600	45	24 ส.ค. 68 - 7 ส.ค. 68
6	17,107,200	45	8 ส.ค. 68 - 21 พ.ย. 68
7	17,998,200	45	22 พ.ย. 68 - 5 ม.ค. 69
8	17,998,200	45	6 ม.ค. 68 - 19 ก.พ. 69
9	17,998,200	45	20 ก.พ. 69 - 5 เม.ย. 69
10	18,473,400	45	6 เม.ย. 69 - 21 พ.ค. 69
11	18,473,400	45	22 พ.ค. 69 - 4 ก.ค. 69

งวดงานที่	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดแล้วเสร็จ (วัน)	วันเริ่ม - สิ้นสุดงวด
12	18,473,400	45	5 ก.ค. 69 - 18 ส.ค. 69
13	24,413,400	45	19 ส.ค. 69 - 2 ต.ค. 69
14	23,284,800	45	3 ต.ค. 69 - 16 พ.ย. 69
15	17,760,600	45	17 พ.ย. 69 - 31 ธ.ค. 69
16	27,264,600	45	1 ม.ค. 70 - 14 ก.พ. 70
17	26,670,600	45	15 ก.พ. 70 - 31 มี.ค. 70
18	31,185,000	45	1 ก.พ. 70 - 15 พ.ค. 70
19	38,610,000	45	16 พ.ค. 70 - 29 มิ.ย. 70
20	35,758,800	45	30 มิ.ย. 70 - 13 ส.ค. 70
21	81,318,600	45	14 ส.ค. 70 - 27 ก.ย. 70
22	80,249,500	50	28 ก.ย. 70 - 16 พ.ย. 70

รายงานงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 68

หน่วยบริการ	ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	7	26,984,100	2	81,013,400	9	107,997,500
สสจ.กำแพงเพชร	3	25,789,200	1	158,438,400	4	184,227,600
สสจ.พิจิตร	9	35,999,100			9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	5	24,461,500			5	24,461,500
รพ.สวรรค์ประชารักษ์			1	558,798,300	1	558,798,300
รพ.อุทัยธานี			1	371,145,100	1	371,145,100
ภาพรวมเขตฯ 3	24	113,233,900	5	1,169,395,200	29	1,282,629,100




ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 24 รายการ รวมเป็นเงิน 113,233,900 บาท

- วิธี E-bidding จำนวน 22 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

หน่วย : รายการ

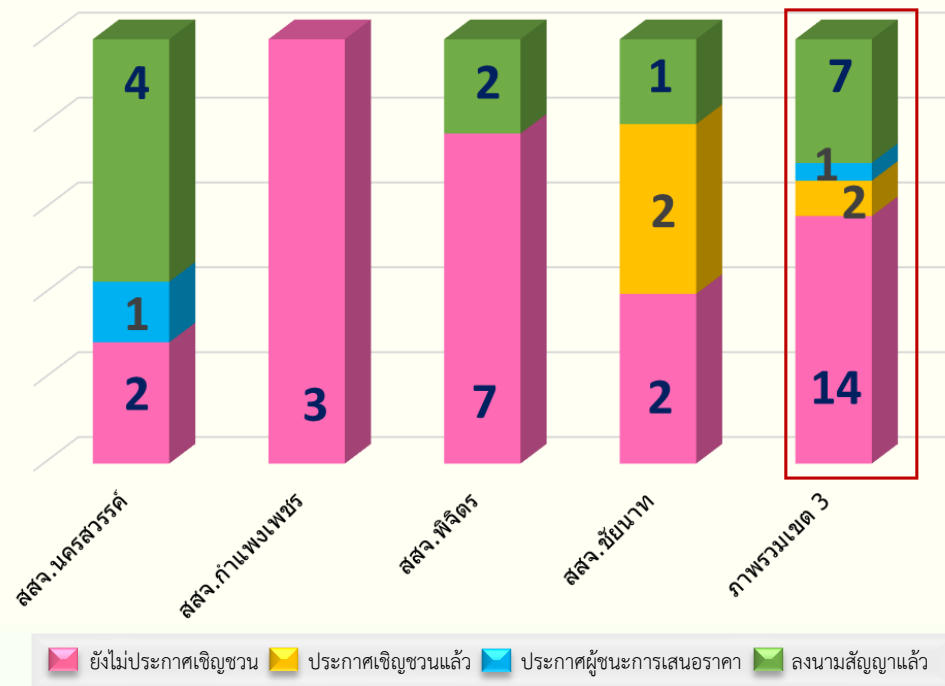

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ลงนามสัญญา		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	2	18,821,500			1	1,600,500	4	6,562,100	7	26,984,100
สสจ.กำแพงเพชร	3	25,789,200							3	25,789,200
สสจ.พิจิตร	7	34,655,500					2	1,343,600	9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	2	16,363,700	2	7,895,800			1	202,000	5	24,461,500
ภาพรวมเขต 3	14	95,629,900	2	7,895,800	1	1,600,500	7	8,107,700	24	113,233,900



ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0512.4/ว650 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ๒ -

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่องหนผู้ผูกพันต่อไป

๒.๒.๒ กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่องหนผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่องหนผู้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๒.๓ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๔ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่องหน และการเบิกจ่าย ให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒.๕ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐ ในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ทิพาพร

(นางสาวทิพาพร ผาสุข)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อ 2.2.2 กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่องหนผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่องหนผู้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนยังไม่ประกาศเชิญชวน

สสจ.นครสวรรค์



ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.หนองบัว	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	9,849,500.00	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่
รพ.ตากฟ้า	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,972,000.00		จัดทำราคากลาง

สสจ.กำแพงเพชร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.โกสัมพีนคร	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,596,400	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	
รพ.ทรายทองวัฒนา	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,596,400		
รพ.บึงสามัคคี	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,596,400		

สสจ.ชัยนาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.สรรพยา	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 295 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7,633,200	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
รพ.เนินขาม	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,730,500		

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนยังไม่ประกาศเชิญชวน



สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.ตะพานหิน	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด	2,200,000	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ	จัดทำประกาศร่าง TOR
รพ.บึงนาราง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตรม.	10,097,300		
รพ.สากเหล็ก	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตรม.	10,097,300		
รพ.สามง่าม	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตรม.	1,221,500		
รพ.โพทะเล	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตรม.	1,221,500		
รพ.วชิรбарมี	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตรม.	1,221,500		
รพ.บางมูลนาก	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตรม.	8,596,400	5.รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา และจัดทำ ประกาศและเอกสารประกวดราคา	



สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 - 2570 จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,169,395,200 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 6 ม.ค. 68	สถานะการดำเนินงาน ณ 13 ม.ค. 68	หมายเหตุ
รพ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,397 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	74,229,100	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลางท้องถิ่น
	ตั้งปี 2568		74,229,100				
	ตั้งปี 2569		148,458,100				
	ตั้งปี 2570		148,457,900				
รพ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,682 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	31,687,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่าง คกก. กำหนดราคากลาง
	ตั้งปี 2568		31,687,700				
	ตั้งปี 2569		63,375,400				
	ตั้งปี 2570		63,375,300				
รพ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์	อาคารผู้ป่วยนอก (รพช.) พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,696 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	13,157,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่าง คกก. กำหนดราคากลาง
	ตั้งปี 2568		13,157,700				
	ตั้งปี 2569		52,630,800				
	ตั้งปี 2570		-				



สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 - 2570 จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,169,395,200 บาท (ต่อ)

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 6 ม.ค. 68	สถานะการดำเนินงาน ณ 13 ม.ค. 68	หมายเหตุ
รพ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	3,045,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่าง คกก. กำหนดราคากลาง
	ตั้งปี 2568		3,045,000				
	ตั้งปี 2569		12,179,900				
	ตั้งปี 2570		-				
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์	อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,111 ตารางเมตร	1	22,352,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เนื่องจากโรงพยาบาลฯ อื่น ๆ ที่อยู่ในโครงการ งบเงินกู้เดียวกัน มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายการ จึงทำให้ต้อง นำเสนอพิจารณา กรม. อีกครั้ง รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จึงไม่สามารถเริ่ม ดำเนินการตามขั้นตอน ใด ๆ ได้
	ตั้งปี 2568		22,352,000				
	ตั้งปี 2569		44,703,900				
	ตั้งปี 2570		44,703,800				
