

รายงานติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

01

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567
ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 159 รายการ)

02

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง)
ที่กันเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 78 รายการ)

03

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

04

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2566 - 2568

05

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 รายการ)

06

สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567 - 2569
(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ)

07

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

08

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ปีงบประมาณ 2568 - 2570

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1. รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568 จำนวน 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

(ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอดิตตามผลการเบิกจ่าย)

- วิธี E-bidding จำนวน 130 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 29 รายการ

2. รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (งบกลาง) ที่กันเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568 จำนวน 78 รายการ วงเงิน 72,750,000 บาท


(ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอดิตตามผลการเบิกจ่าย)

- วิธี E-bidding จำนวน 61 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 รายการ

รายงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ วงเงิน 277,159,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	22	30,700,000	7	2,492,000	29	33,192,000
สสจ.กำแพงเพชร	20	25,110,000	4	880,000	24	25,990,000
สสจ.พิจิตร	26	28,630,000	15	4,051,000	41	32,681,000
สสจ.อุทัยธานี	23	21,470,000	4	1,045,000	27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	10	11,400,000	13	3,461,000	23	14,861,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	60,920,000	1	400,000	8	61,320,000
รพ.กำแพงเพชร	8	16,750,000	1	400,000	9	17,150,000
รพ.พิจิตร	14	29,260,000	1	400,000	15	29,660,000
รพ.อุทัยธานี	8	14,090,000	1	400,000	9	14,490,000
รพ.ชัยนาทเรนทร	9	22,400,000	2	2,900,000	11	25,300,000
ภาพรวมเขตฯ 3	147	260,730,000	49	16,429,000	196	277,159,000

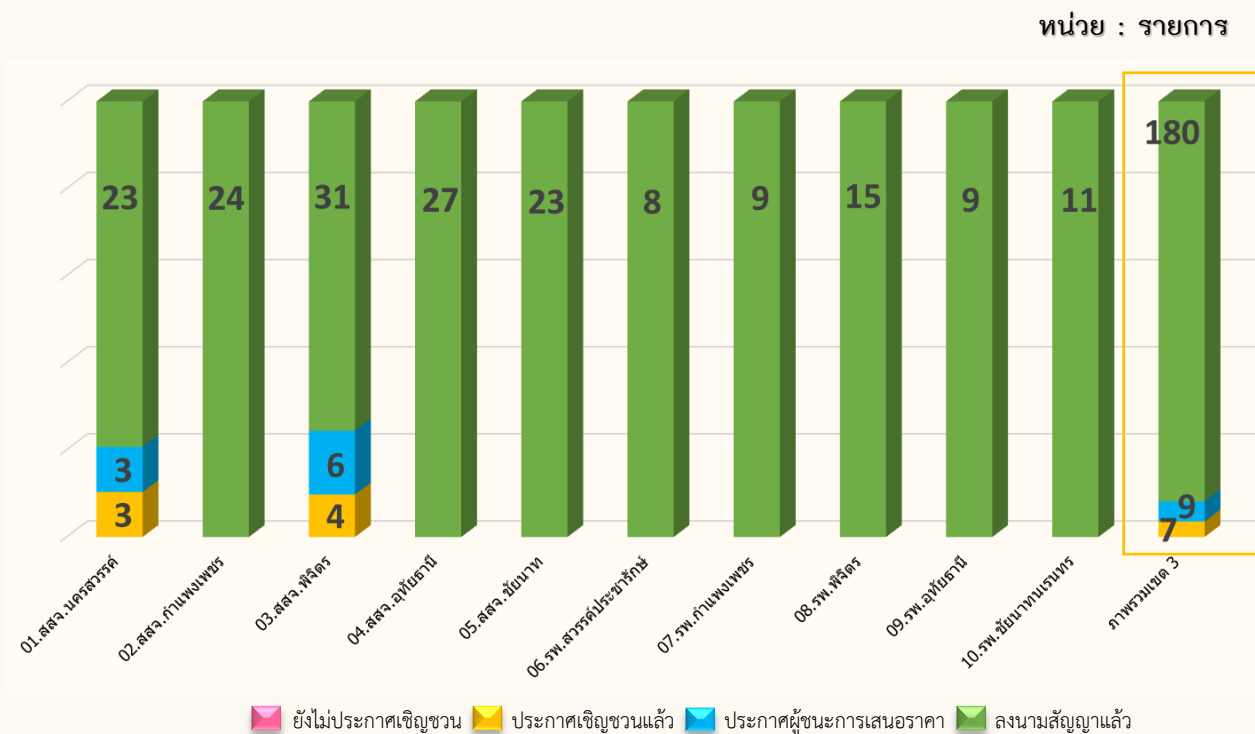

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนประกาศเชิญชวนแล้ว



สสจ.นครสวรรค์

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.โกรกพระ	ยูนิตทำฟัน	460,000.00	8.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP วันที่ 19 ก.พ. 68
รพ.ตากลี	ยูนิตทำฟัน	460,000.00		
รพ.หนองบัว	ยูนิตทำฟัน	460,000.00		

สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.บางมูลนาก	ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน	750,000.00	8.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	
รพ.โพทะเล	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	2,500,000.00	10.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	
รพ.ระพวนหิน	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์	950,000.00		
รพ.วังทรายพูน	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์	950,000.00		

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สสจ.นครสวรรค์



ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.ท่าตะโก	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,500,000.00	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	
รพ.ชุมแสง	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,500,000.00		
รพ.ลาดยาว	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	2,500,000.00		

สสจ.กำแพงเพชร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.โกสัมพีนคร	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8,596,400.00	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	
รพ.ทรายทองวัฒนา	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8,596,400.00		
รพ.บึงสามัคคี	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8,596,400.00		

สสจ.ชัยนาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
สสจ.ชัยนาท	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัทยพยาบาล 20 ห้อง 10 ครอบครั้ว (แฟลต 1)	3,947,900.00	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	
สสจ.ชัยนาท	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัทยพยาบาล 20 ห้อง 10 ครอบครั้ว (แฟลต 2)	3,947,900.00		

รายละเอียดเพิ่มเติม: ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



สสจ.พิจิตร

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.วังทรายพูน	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่	1,200,000.00	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	
รพ.ระเทศพานหิน	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่	1,200,000.00		
รพ.บางมูลนาก	เครื่องจักรห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง	1,600,000.00		
รพ.ทับคล้อ	เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ	400,000.00		
รพ.ทับคล้อ	เครื่องตรวจสอบแกนหาหลอดเลือดดำต้นใต้ผิวหนัง	180,000.00		
รพ.บึงนาราง	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว	500,000.00		
รพ.โพทะเล	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร	1,221,500.00	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	
รพ.วังทรายพูน	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่	1,200,000.00		

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2566 - 2568

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า					
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิ วิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	18	13	12	1	82,281,100.00	44%	104,721,400.00	56%	- ตรวจรับงานงวดที่ 12 วันที่ 17 ก.พ. 68
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	135,067,800	28 มี.ค. 68	16	14	13	1	68,428,375.10	40.45%	100,739,424.90	59.55%	- คาดว่าจะส่งงวดที่ 13 กลางเดือน ก.พ. 68

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567 - 2569

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 28 รายการ รวมเป็นเงิน 132,447,500 บาท
(ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอติดตามผลการเบิกจ่าย)

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่าย		เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ล่าช้า	งบ ปี 67	งบ ปี 68					
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุน บริการ 8 ชั้น	164,330,000	26,473,000	15,531,000	8 ต.ค. 69	14	1	2	-	26,473,000	9,679,600	36,152,600	22%	128,177,400	78%	
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	594,000,000	105,873,500	732,500	16 พ.ย. 70	22	-	1	-	-		-	-	594,000,000	100%	- อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 1

หมายเหตุ : รพ.กำแพงเพชร คาดว่าจะเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ ได้ทันเพียง งานงวดที่ 1 - 4 จำนวนเงิน 67,953,600 บาท
และไม่สามารถใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ได้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 68 จำนวนเงิน 37,919,900 บาท

รายการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา รพ.ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

ที่ กพ ๐๐๓๓.๒๐๑๑.๓/๑๒๒๗



โรงพยาบาลก้าแพงเพชร
๔๒๘ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองก้าแพงเพชร กพ ๒๒๐๐๐

กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
เลขที่รับ 17/68
วันที่รับ 20 มี.ค. 68
เวลา 13.46 น.

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓
เลขที่รับ 169/68
วันที่ 20 มี.ค. 2568
เวลา 08.54 น.

๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้นฯ โรงพยาบาลก้าแพงเพชร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ๑ หลัง (งบผูกพัน ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ สธ ๐๒๐๗.๐๗/๑๓๑๔๕
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว ๑๕๐
ลงวันที่ ๓๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรร รายการ ก่อสร้าง
อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐
ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลก้าแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัด
ก้าแพงเพชร ๑ หลัง (งบผูกพัน ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ในวงเงิน ๖๘๔,๐๐๔,๓๐๐.-บาท
(หาร้อยแปดสิบล้านสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ,ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าก่อสร้างฯ จำนวนเงิน ๑๐๕,๘๗๓,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งร้อยห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จังหวัดก้าแพงเพชร
ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท พุทธเดชะ จำกัด (ผู้รับจ้าง) เพื่อทำการก่อสร้างฯ ในวงเงินทั้งสิ้น ๕๙๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) นั้น

โรงพยาบาลก้าแพงเพชร จึงขอรายงานให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ ทราบว่าการก่อสร้าง
อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้นฯ โรงพยาบาลก้าแพงเพชร จังหวัด
ก้าแพงเพชร ๑ หลัง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันเพียง งวดที่ ๑ – ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๙๕๓,๖๐๐.-บาท (หกสิบ
เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และไม่สามารถใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๗,๙๑๙,๙๐๐.-บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก้าแพงเพชร

โรงพยาบาลก้าแพงเพชร
กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕
โทรสาร. ๐-๕๕๗๑-๒๓๐๖


รายงานงบลทน รยการลัองก่อสร้ง ป้งบประมาณ 2568



ความก้าวมหน้าการจ้ดซ้จ้ดจ้ง รยการลัองก่อสร้งปีเต้ยว ป้งบประมาณ 2568
รวมท้้งลััน 24 รยการ รวมเป้เงิน 113,233,900 บาท

- ว้ E-bidding จ้งนวน 22 รยการ
- ว้เพะจะจ้ง จ้งนวน 2 รยการ

หน่วยบรการ	ย้งม่ประกาศเช้ชวน		ประกาศเช้ชวนล้		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ลงนามสัณญา		รวมหน่วยบรการ	
	จ้งนวน	วงเงิน	จ้งนวน	วงเงิน	จ้งนวน	วงเงิน	จ้งนวน	วงเงิน	จ้งนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	2	18,821,500					5	8,162,600	7	26,984,100
สสจ.ก้าวมพะ					3	25,789,200			3	25,789,200
สสจ.พิจิตร	2	20,194,600	4	13,239,400	1	1,221,500	2	1,343,600	9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท	2	16,363,700			2	7,895,800	1	202,000	5	24,461,500
ภาพรวมเขตฯ 3	6	55,379,800	4	13,239,400	6	34,906,500	8	9,708,200	24	113,233,900

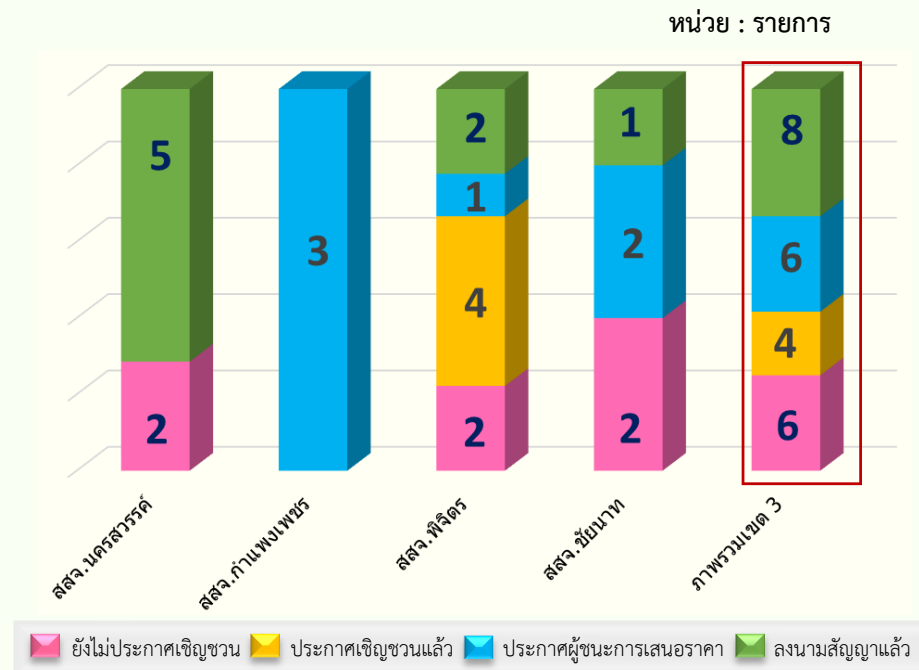



ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0512.4/ว650 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ๒ -

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่องหนผู้ผูกพันต่อไป

๒.๒.๒ กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่องหนผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่องหนผู้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๒.๓ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๔ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่องหน และการเบิกจ่าย ให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒.๕ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐ ในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ทิพาพร

(นางสาวทิพาพร ผาสุข)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อ 2.2.2 กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่องหนผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่องหนผู้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

สสจ.พิจิตรสสจ.ชัยนาท

THANK
YOU

