



รายงานติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ คำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



กรอบการนำเสนอ

01

การบริหารจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พรบ.68

02

ผลการเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 - 2568

03

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

04


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2568



1 การบริหารจัดการซื้อจัดจ้างงบประมาณ พรบ.68

1. รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568 ณ 6 มี.ค. 68

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	22	30,700,000	7	2,492,000	29	33,192,000
สสจ.กำแพงเพชร	20	25,110,000	4	880,000	24	25,990,000
สสจ.พิจิตร	26	28,630,000	15	4,051,000	41	32,681,000
สสจ.อุทัยธานี	23	21,470,000	4	1,045,000	27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	10	11,400,000	13	3,461,000	23	14,861,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	60,920,000	1	400,000	8	61,320,000
รพ.กำแพงเพชร	8	16,750,000	1	400,000	9	17,150,000
รพ.พิจิตร	14	29,260,000	1	400,000	15	29,660,000
รพ.อุทัยธานี	8	14,090,000	1	400,000	9	14,490,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	9	22,400,000	2	2,900,000	11	25,300,000
ภาพรวมเขตฯ 3	147	260,730,000	49	16,429,000	196	277,159,000

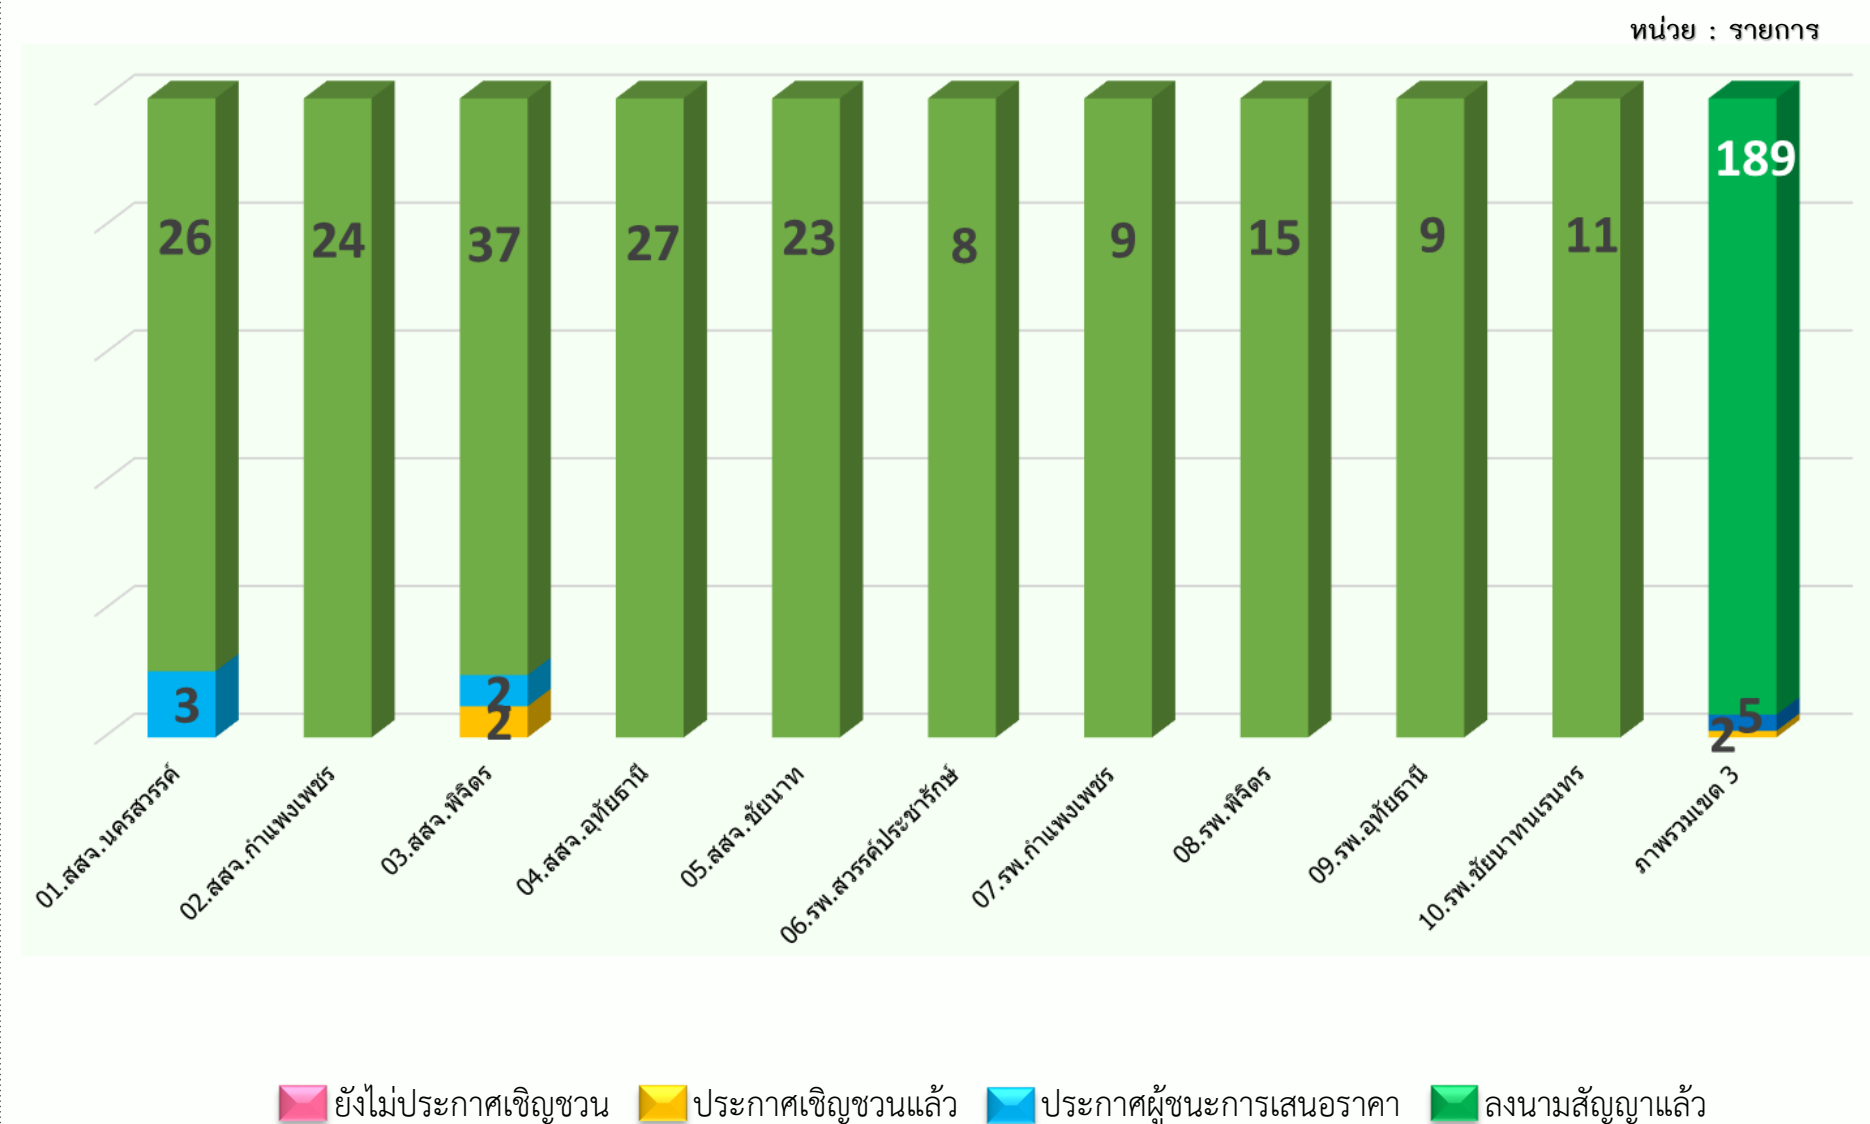

ขั้นตอนประกาศเชิญชวนแล้ว



ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน	750,000	8.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	
รพ.โพทะเล จ.พิจิตร	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	2,500,000	10.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	

ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	ยูนิตทำฟัน	460,000	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ	
รพ.ตากลี จ.นครสวรรค์	ยูนิตทำฟัน	460,000	ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail	
รพ.หนองบัว จ.นครสวรรค์	ยูนิตทำฟัน	460,000	และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	


ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพร.ตะพานหิน จ.พิจิตร	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์	950,000	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ	
รพ.วังทรายพูน จ.พิจิตร	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์	950,000	ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail	
			และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	

1 2. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568 ณ 6 มี.ค. 68

- วิธี E-bidding จำนวน 22 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ลงนามสัญญา		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	1	9,849,500	1	8,972,000			5	8,162,600	7	26,984,100
สสจ.กำแพงเพชร					1	8,596,400	2	17,192,800	3	25,789,200
สสจ.พิจิตร			2	20,194,600	1	8,596,400	6	7,208,100	9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท			1	8,730,500	1	7,633,200	3	8,097,800	5	24,461,500
ภาพรวมเขตฯ 3	1	9,849,500	4	37,897,100	3	24,826,000	16	40,661,300	24	113,233,900

อาคารจ่ายกลาง (คสล.1 ชั้น) รพ.หนองบัว วงเงิน 9,849,500 บาท
- คาดว่าจะประกาศเผยแพร่ ภายในสัปดาห์หน้า

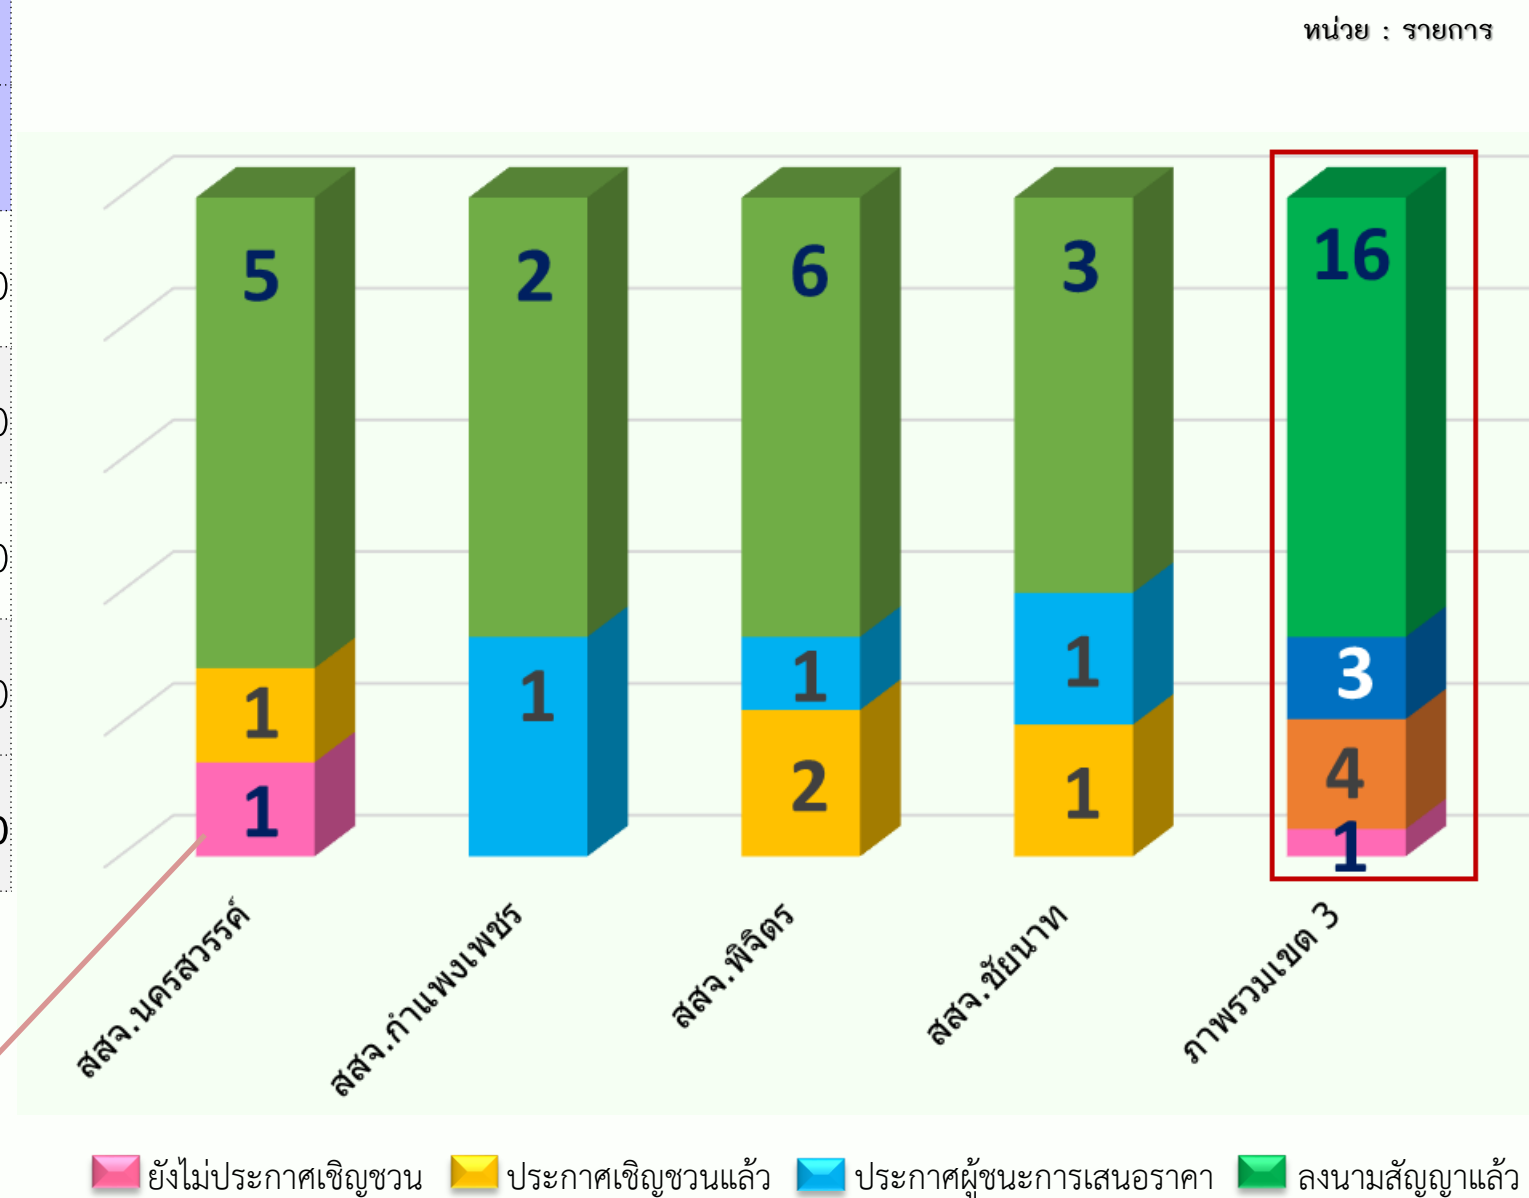

ขั้นตอนประกาศเชิญชวนแล้ว



ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,972,000	8.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP วันที่ 13 มี.ค. 68

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.บึงนาราง จ.พิจิตร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตรม.	10,097,300	8.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ได้รับแบบร่าง (ปลายเดือน ธค.67)
รพ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตรม.	10,097,300		และเป็นอำนาจ ผวจ. ร่างในการเสนอแฟ้ม เสนอราคาวันที่ 6 มีค.68

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.เนินขาม จ.ชัยนาท	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,730,500	9.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	

3. สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 - 2570 ณ 6 มี.ค. 68

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 7 ก.พ. 68	สถานะการดำเนินงาน ณ 6 มี.ค. 68	หมายเหตุ
รพ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,397 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	1	74,229,100	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	7.กรมบัญชีกลางจัดส่ง ประกาศ/เอกสารซื้อ หรือจ้าง ให้ สตง. ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	มีการแก้ไขแบบ BOQ (ชื่อรายการ) เสนอ ผวจ. อนุมัติราคากลาง วันที่ 25 ก.พ. 68
รพ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 4,682 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	1	31,687,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง
รพ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์	อาคารผู้ป่วยนอก (รพช.) พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,696 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	1	13,157,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง (อำนาจผู้ว่าฯ)
รพ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	1	3,045,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2.แต่งตั้งบุคคล/กกก. จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)	อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศ (อำนาจรองผู้ว่าฯ)
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์	อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,111 ตารางเมตร	1	22,352,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เนื่องจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่อยู่ใน โครงการบงเงินกู้เดียวกัน มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ จึงทำให้ ต้องนำเสนอพิจารณา กรม. อีกครั้ง รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จึงไม่สามารถ เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนใด ๆ ได้

2 ผลการเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 - 2568 ณ 6 มี.ค. 68

- รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า					
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิ วิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	18	13	13	-	93,501,250.00	50%	93,501,250.00	50%	
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	135,067,800	28 มี.ค. 68	16	15	14	1	89,151,430.60	52.70%	80,016,369.40	47.30%	

รายการงบประมาณ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568 (ครุภัณฑ์/ก่อสร้างปีเดียว/ก่อสร้างผูกพัน) ณ 6 มี.ค. 68

59 รายการ วงเงินรวม 342,129,610.08 บาท

ครุภัณฑ์ 29 รายการ
วงเงิน 72,322,960 บาท

ก่อสร้างปีเดียว 28 รายการ
วงเงิน 137,460,650.08 บาท

ก่อสร้างผูกพัน 2 รายการ
วงเงิน 132,346,000 บาท

หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์		ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน		รวม	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	14	29,736,460.00	12	64,193,153.08			26	93,929,613.08
สสจ.กำแพงเพชร			6	29,663,000.00			6	29,663,000.00
สสจ.พิจิตร	8	11,370,500.00	3	5,622,888.00			11	16,993,388.00
สสจ.อุทัยธานี	1	2,500,000.00	1	1,520,000.00			2	4,020,000.00
สสจ.ชัยนาท			6	36,461,609.00			6	36,461,609.00
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	6,999,000.00			1	26,472,500.00	2	33,471,500.00
รพ.กำแพงเพชร					1	105,873,500.00	1	105,873,500.00
รพ.พิจิตร	4	14,722,000.00					4	14,722,000.00
รพ.อุทัยธานี	1	6,995,000.00					1	6,995,000.00
ภาพรวมเขตฯ 3	29	72,322,960.00	28	137,460,650.08	2	132,346,000.00	59	342,129,610.08

1. รายการครุภัณฑ์ ปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	เงินกันสุทธิ	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	14	29,736,460.00					29,736,460.00	100.00		
สสจ.พิจิตร	8	11,370,500.00	1,000.00	0.01	1,499,000.00	13.18	9,870,500.00	86.81	1,500,000.00	13.19
สสจ.อุทัยธานี	1	2,500,000.00	4,500.00	0.18	2,495,500.00	99.82			2,500,000.00	100.00
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	6,999,000.00					6,999,000.00	100.00		
รพ.พิจิตร	4	14,722,000.00					14,722,000.00	100.00		
รพ.อุทัยธานี	1	6,995,000.00					6,995,000.00	100.00		
ภาพรวมเขต 3	29	72,322,960.00	5,500.00	0.01	3,994,500.00	5.52	68,322,960.00	94.47	4,000,000.00	5.53

รายการครุภัณฑ์ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ฯ รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร : รอส่งมอบ
2. รถพยาบาล (รถตู้) รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (สัญญาสิ้นสุด วันที่ 20 เม.ย. 68) : รอส่งมอบ

2. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	เงินกันสุทธิ	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	12	64,193,153.08	1,063,743.81	1.66	24,149,408.00	37.62	38,980,001.27	60.72	25,213,151.81	39.28
สสจ.กำแพงเพชร	6	29,663,000.00	55,796.19	0.19	17,820,600.00	60.08	11,786,603.81	39.74	17,876,396.19	60.26
สสจ.พิจิตร	3	5,622,888.00					5,622,888.00	100.00		
สสจ.อุทัยธานี	1	1,520,000.00			946,960.00	62.30	573,040.00	37.70	946,960.00	62.30
สสจ.ชัยนาท	6	36,461,609.00	41,359.88	0.11	25,673,944.49	70.41	10,746,304.63	29.47	25,715,304.37	70.53
ภาพรวมเขต 3	28	137,460,650.08	1,160,899.88	0.84	68,590,912.49	49.90	67,708,837.71	49.26	69,751,812.37	50.74

รายการก่อสร้างปีเดียว ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

สสจ.นครสวรรค์

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.แม่เปิน	บ้านพัก ขรก. ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	1,185,000.00	-	1,185,000.00	-	
รพ.แม่เปิน	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	1,739,000.00	-	1,739,000.00	-	
รพ.บรรพตพิสัย	อาคารซักฟอก	7,640,000.00	-	4,354,800.00	3,285,200.00	
รพ.แม่वंก	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ	1,218,223.08	1,149.63	-	1,217,073.45	
รพ.ไพศาลี	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ	1,344,000.00	-	1,344,000.00	-	
รพ.ชุมตาบง	อาคารโภชนาการ	5,800,000.00	470,694.18	3,306,000.00	2,023,305.82	
รพ.หนองบัว	อาคารจ่ายกลาง	10,309,800.00	591,900.00	6,996,888.00	2,721,012.00	
รพ.ลาดยาว	ระบบบำบัดน้ำเสีย	8,333,000.00	-	5,833,100.00	2,499,900.00	
รวม		37,569,023.08	1,063,743.81	24,758,788.00	11,746,491.27	

2. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รายการก่อสร้างปีเดียว ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

สสจ.กำแพงเพชร

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.บึงสามัคคี	อาคารพัสดุ	8,370,000.00	-	6,026,400.00	2,343,600.00	
รพ.คลองลาน	อาคารพัสดุ	7,980,000.00	-	3,032,400.00	4,947,600.00	
รพ.โกสุมพินคร	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	1,188,000.00	-	594,000.00	594,000.00	
รพ.โกสุมพินคร	อาคารจ่ายกลาง	9,340,000.00	51,400.00	8,167,800.00	1,120,800.00	
	รวม	26,878,000.00	51,400.00	17,820,600.00	9,006,000.00	

สสจ.อุทัยธานี

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.ห้วยคต	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ	1,520,000.00	-	946,960.00	573,040.00	
	รวม	1,520,000.00	-	946,960.00	573,040.00	

สสจ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.หนองมะโมง	อาคารพัสดุ	7,099,000.00	-	5,217,765.00	1,881,235.00	
รพ.สรรพยา	อาคารพัสดุ	7,899,999.00	41,359.88	5,119,009.49	2,739,629.63	
รพ.เนินขาม	อาคารซักฟอก	6,690,000.00	-	3,813,300.00	2,876,700.00	
รพ.หันคา	อาคารจ่ายกลาง	10,295,500.00	-	7,412,760.00	2,882,740.00	
สสจ.ชัยนาท	ปรับปรุงห้องประชุมหลวงปู่ศุขและปรับปรุงระบบภาพและเสียง	4,111,110.00	-	4,111,110.00	-	
	รวม	36,095,609.00	41,359.88	25,673,944.49	10,380,304.63	

3. รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568 ณ 6 มี.ค. 68

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่าย		เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ทั้งหมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ล่าช้า	งบ ปี 67	งบ ปี 68					
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุน บริการ 8 ชั้น	164,330,000	26,473,000	15,531,000	8 ต.ค. 69	14	1	2	-	26,473,000	9,679,600	36,152,600	22%	128,177,400	78%	
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	594,000,000	105,873,500	732,500	16 พ.ย. 70	22	-	1	-	-	-	-	-	594,000,000	100%	- อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 1

225 รายการ วงเงินรวม 1,017,688,900.00 บาท

ครุภัณฑ์ 196 รายการ
วงเงิน 276,280,050 บาท


ก่อสร้างปีเดียว 24 รายการ
วงเงิน 113,233,900 บาท

ก่อสร้างผูกพัน 5 รายการ
วงเงิน 144,471,500 บาท

หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์		ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน		รวม	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	29	32,788,800	7	26,984,100	2	16,202,700	38	75,975,600
สสจ.กำแพงเพชร	24	25,926,500	3	25,789,200	1	31,687,700	28	83,403,400
สสจ.พิจิตร	41	32,681,000	9	35,999,100			50	68,680,100
สสจ.อุทัยธานี	27	22,515,000					27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	23	14,861,000	5	24,461,500			28	39,322,500
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	8	61,177,700			1	22,352,000	9	83,529,700
รพ.กำแพงเพชร	9	17,150,000					9	17,150,000
รพ.พิจิตร	15	29,549,050					15	29,549,050
รพ.อุทัยธานี	9	14,490,000			1	74,229,100	10	88,719,100
รพ.ชัยนาทนเรนทร	11	25,141,000					11	508,844,450
ภาพรวมเขตฯ 3	196	276,280,050	24	113,233,900	5	144,471,500	225	1,017,688,900

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2568 (ครุภัณฑ์/ก่อสร้างปีเดียว/ก่อสร้างผูกพัน)

หน่วยเบิกจ่าย	จำนวน รายการ	งบสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	38	75,975,600.00	23,738,880.80	31.25	10,409,849.20	13.70	41,826,870.00	55.05
สสจ.กำแพงเพชร	28	83,403,400.00	1,873,900.00	2.25	24,052,600.00	28.84	57,476,900.00	68.91
สสจ.พิจิตร	50	68,680,100.00	28,248,000.00	41.13	4,769,000.00	6.94	35,663,100.00	51.93
สสจ.อุทัยธานี	27	22,515,000.00	11,079,685.00	49.21	9,792,500.00	43.49	1,642,815.00	7.30
สสจ.ชัยนาท	28	39,322,500.00	14,935,000.00	37.98	5,131,200.00	13.05	19,256,300.00	48.97
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	9	83,529,700.00	52,602,700.00	62.97	8,575,000.00	10.27	22,352,000.00	26.76
รพ.กำแพงเพชร	9	17,150,000.00	4,983,600.00	29.06	12,089,370.00	70.49	77,030.00	0.45
รพ.พิจิตร	15	29,549,050.00	23,014,050.00	77.88	6,535,000.00	22.12		
รพ.อุทัยธานี	10	88,719,100.00	8,309,000.00	9.37	4,738,000.00	5.34	75,672,100.00	85.29
รพ.ชัยนาทนเรนทร	11	25,141,000.00			25,141,000.00	100.00		
ภาพรวมเขต 3	225	533,985,450.00	168,784,815.80	31.61	111,233,519.20	20.83	253,967,115.00	47.56

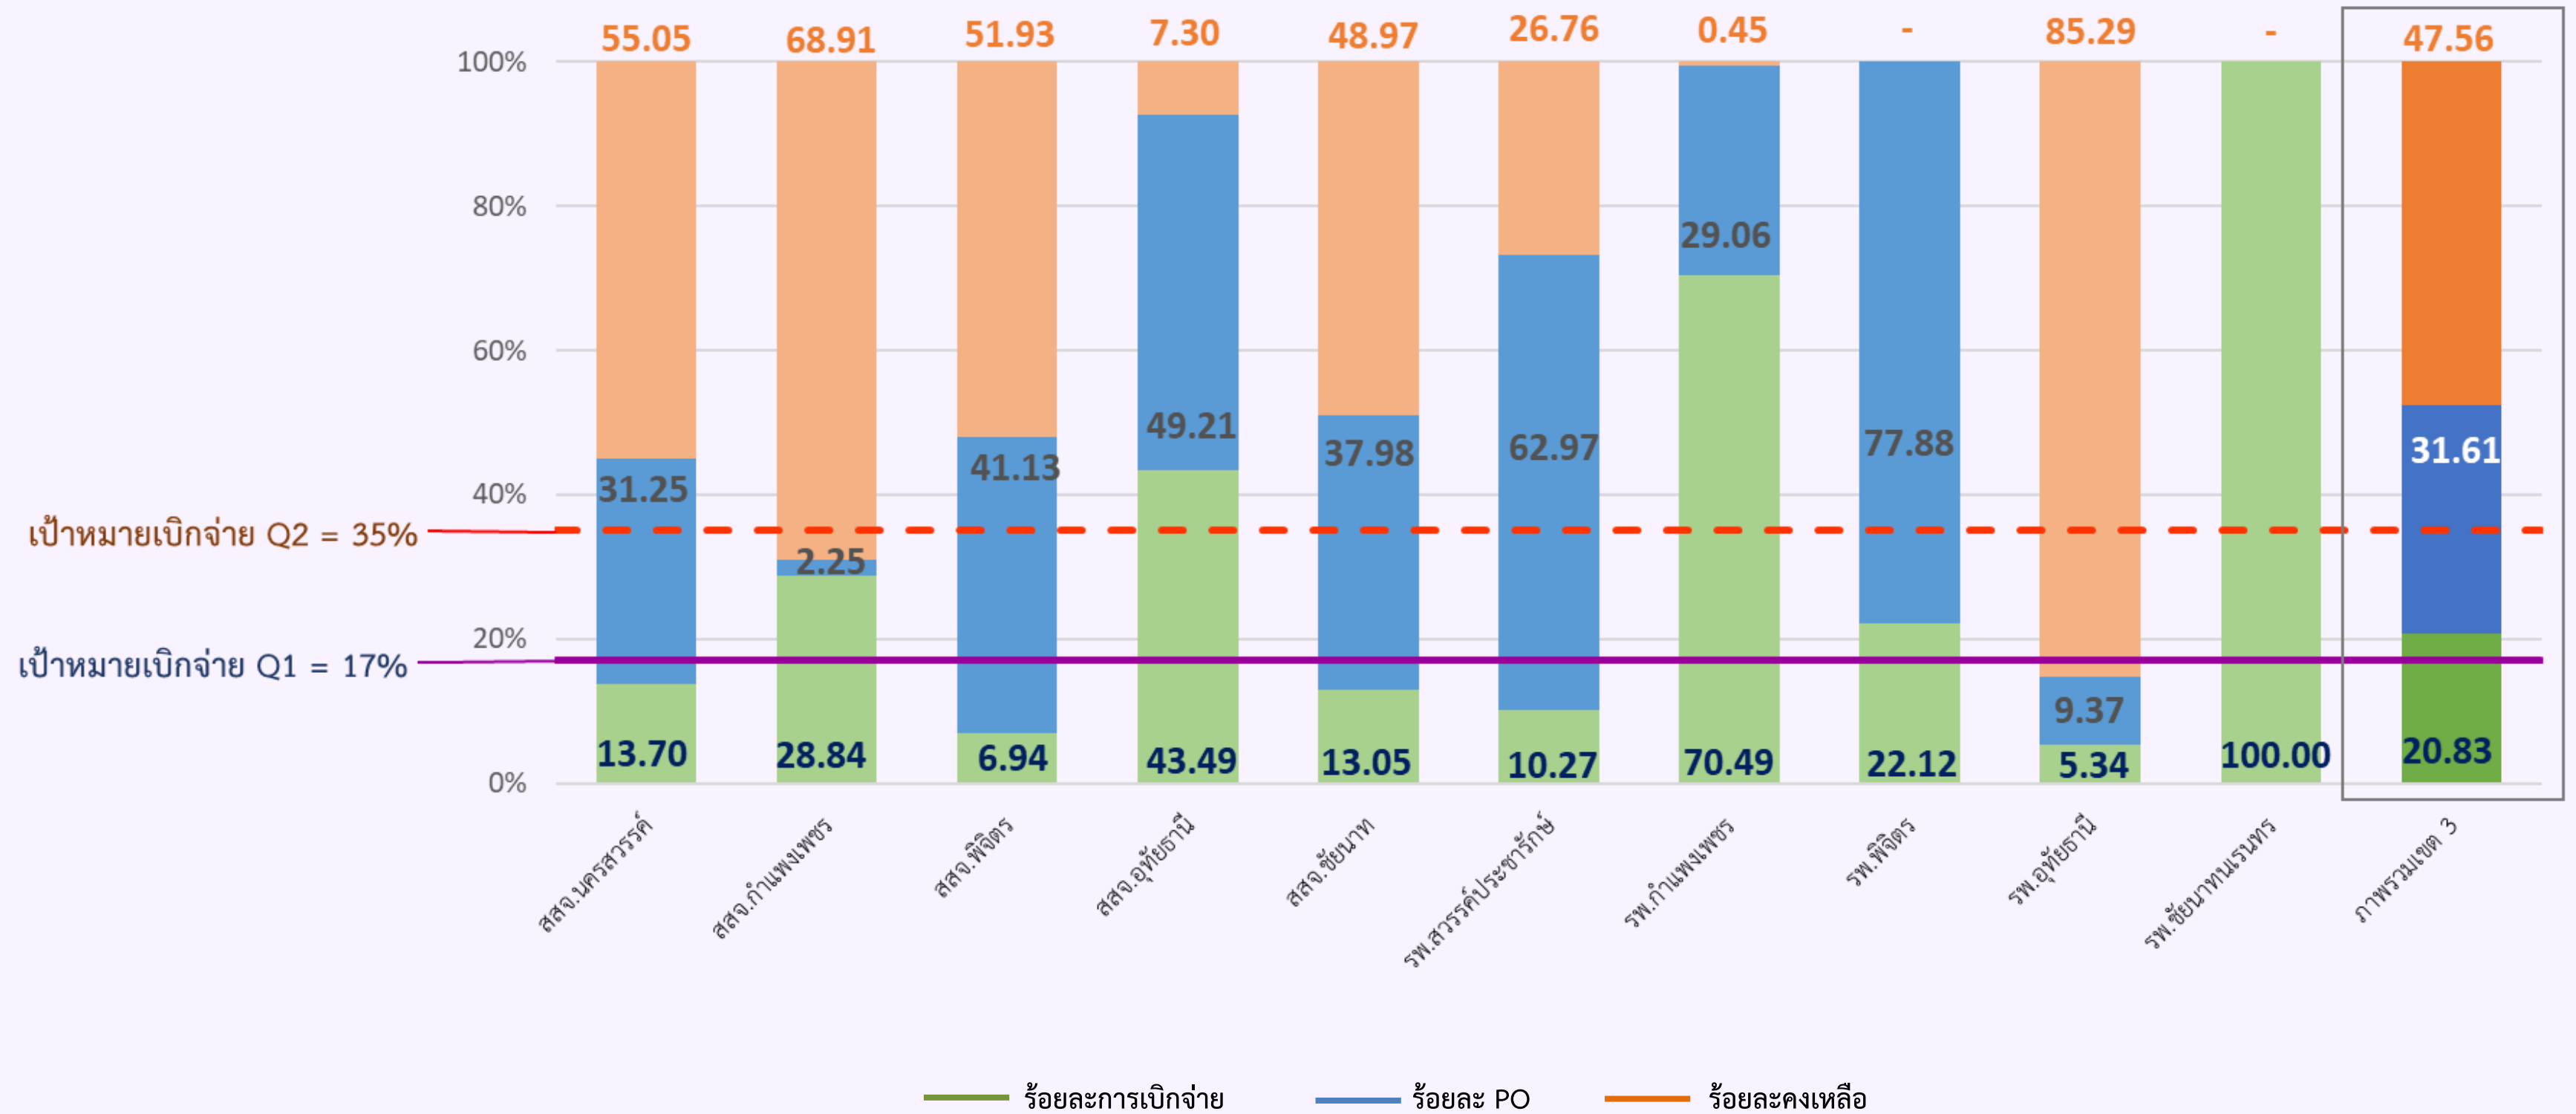

THANK
YOU

