



รายงานติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ คำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2568



กรอบการนำเสนอ

01

การบริหารจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พรบ.68

02

ผลการเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 - 2568

03


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

04

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2568



หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	22	30,700,000	7	2,492,000	29	33,192,000
สสจ.กำแพงเพชร	20	25,110,000	4	880,000	24	25,990,000
สสจ.พิจิตร	26	28,630,000	15	4,051,000	41	32,681,000
สสจ.อุทัยธานี	23	21,470,000	4	1,045,000	27	22,515,000
สสจ.ชัยนาท	10	11,400,000	13	3,461,000	23	14,861,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	60,920,000	1	400,000	8	61,320,000
รพ.กำแพงเพชร	8	16,750,000	1	400,000	9	17,150,000
รพ.พิจิตร	14	29,260,000	1	400,000	15	29,660,000
รพ.อุทัยธานี	8	14,090,000	1	400,000	9	14,490,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	9	22,400,000	2	2,900,000	11	25,300,000
ภาพรวมเขต 3	147	260,730,000	49	16,429,000	196	277,159,000

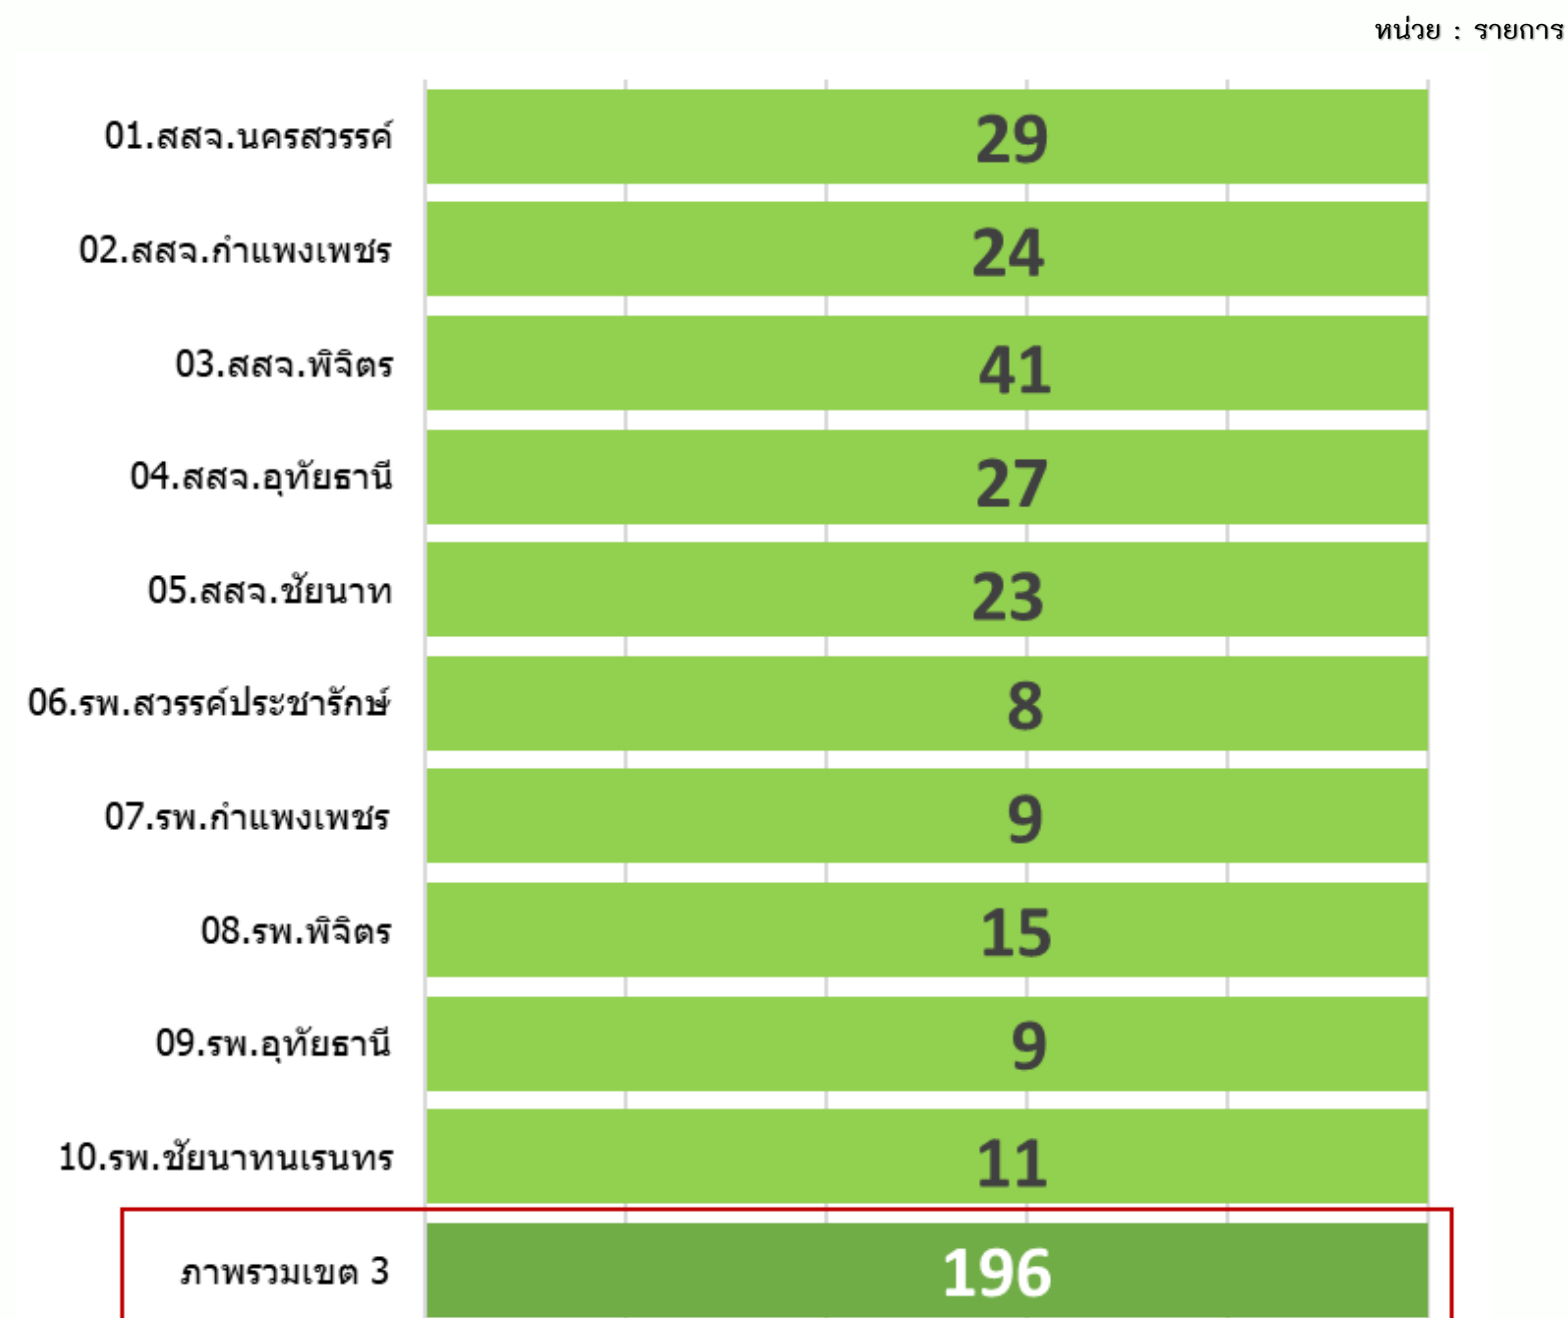

ยังไม่ประกาศเชิญชวน
 ประกาศเชิญชวนแล้ว
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ลงนามสัญญาแล้ว

(ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 196 รายการ)


1 การบริหารจัดการซื้อจัดจ้างงบประมาณ พรบ.68

2. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 68

- วิธี E-bidding จำนวน 22 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศ เชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		ลงนามสัญญา		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์			1	9,849,500	1	8,972,000	6	8,162,600	7	26,984,100
สสจ.กำแพงเพชร					1	8,596,400	2	17,192,800	3	25,789,200
สสจ.พิจิตร					2	20,194,600	7	15,804,500	9	35,999,100
สสจ.ชัยนาท					2	16,363,700	3	8,097,800	5	24,461,500
ภาพรวมเขตฯ 3			1	9,849,500	6	54,126,700	17	49,257,700	24	113,233,900

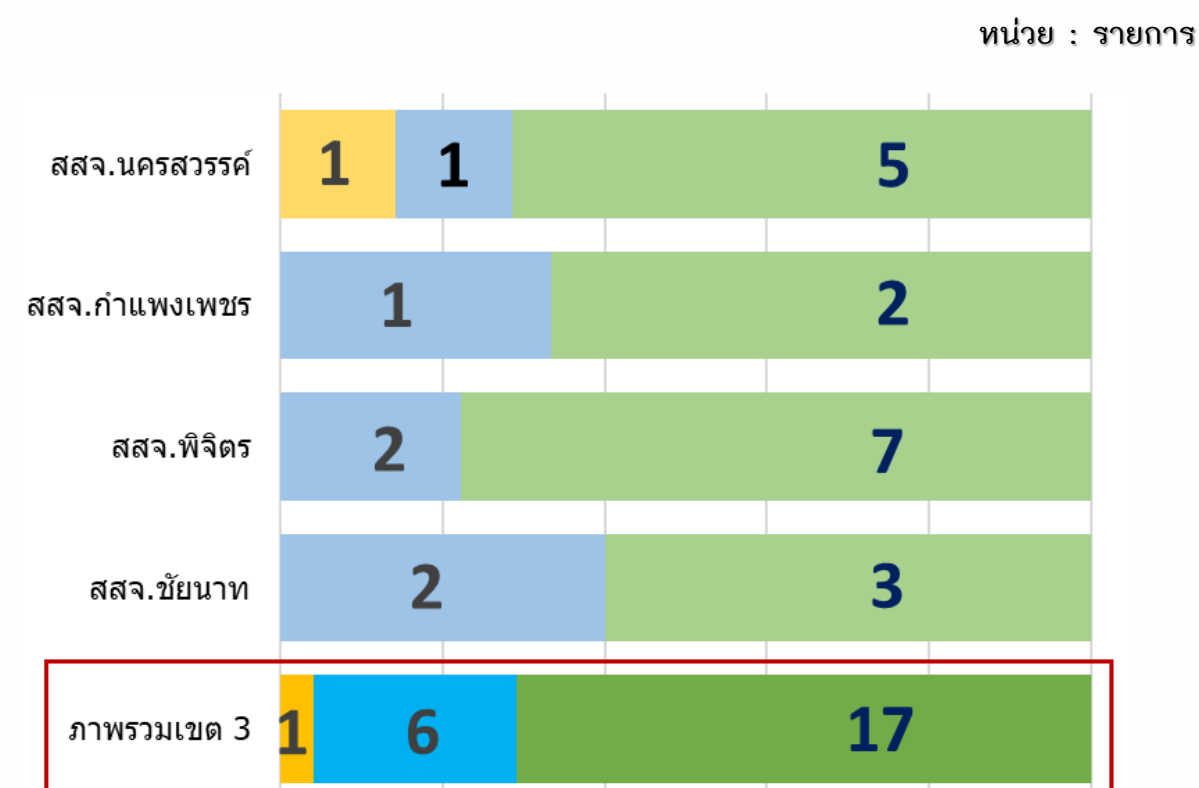

ประกาศเชิญชวนแล้ว
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ลงนามสัญญาแล้ว



ขั้นตอนประกาศเชิญชวนแล้ว

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.หนองบัว จ.นครสวรรค์	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	9,849,500	9.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคาฯ

ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	8,972,000	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	
รพ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	8,596,400		
รพ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	10,097,300		
รพ.บึงนาราง จ.พิจิตร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	10,097,300		
รพ.สรรพยา จ.ชัยนาท	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	7,633,200		
รพ.เนินขาม จ.ชัยนาท	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	8,730,500		

1

การบริหารจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พรบ.68

3. สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 - 2570

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 68

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งปี 2568	1-วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 6 มี.ค. 68	สถานะการดำเนินงาน ณ 2 เม.ย. 68	หมายเหตุ
รพ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์	อาคารผู้ป่วยนอก (รพช.) พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	1	13,157,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	2.แต่งตั้งบุคคล/คกก.จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	ผู้ว่าฯ ลงนามอนุมัติราคากลาง วันที่ 2 เม.ย. 68
รพ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	1	3,045,000	E-bidding	2.แต่งตั้งบุคคล/คกก.จัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	8.กำหนดวัน เวลาชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
รพ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	1	31,687,700	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่างร่างประกาศ
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์	อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น	1	22,352,000	E-bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	โครงการงบเงินกู้
รพ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	1	74,229,100	E-bidding	7.กรมบัญชีกลางจัดส่ง ประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้าง ของหน่วยงานให้ สตง. ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	7.กรมบัญชีกลางจัดส่ง ประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้าง ของหน่วยงานให้ สตง. ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	มีการแก้ไขแบบ BOQ (ชื่อรายการ) เสนอ ผวจ. อนุมัติราคากลาง วันที่ 25 ก.พ. 68

ผลการเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 - 2568

- รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 68

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ ล่าช้า					
รพ.พิจิตร จ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิ วิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	18	15	15	-	117,811,575.00	73%	69,190,925.00	37%	
รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท	อาคารเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	135,067,800	28 มี.ค. 68	16	16	15	1	124,439,833.68	73.56%	44,727,966.32	26.44%	ขยายเวลาก่อสร้าง สิ้นสุด วันที่ 15 พ.ค. 68

59 รายการ วงเงินรวม 342,129,610.08 บาท

ครุภัณฑ์ 29 รายการ
วงเงิน 72,322,960 บาทก่อสร้างปีเดียว 28 รายการ
วงเงิน 137,460,650.08 บาทก่อสร้างผูกพัน 2 รายการ
วงเงิน 132,346,000 บาท


หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	กันเงินสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (สำรองเงิน)	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	26	93,929,613.08	20,479,957.00	21.80	72,385,912.27	77.06	1,063,743.81	1.13
สสจ.กำแพงเพชร	6	29,663,000.00	11,663,100.00	39.32	17,944,103.81	60.49	55,796.19	0.19
สสจ.พิจิตร	11	16,993,388.00	1,499,000.00	8.82	15,493,388.00	91.17	1,000.00	0.01
สสจ.อุทัยธานี	2	4,020,000.00	3,442,460.00	85.63	573,040.00	14.25	4,500.00	0.11
สสจ.ชัยนาท	6	36,461,609.00	23,432,938.49	64.27	12,762,654.63	35.00	266,015.88	0.73
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	2	33,471,500.00	-	-	33,471,500.00	100.00	-	-
รพ.กำแพงเพชร	1	105,873,500.00	105,873,500.00	100.00	-	-	-	-
รพ.พิจิตร	4	14,722,000.00	-	-	14,722,000.00	100.00	-	-
รพ.อุทัยธานี	1	6,995,000.00	-	-	6,995,000.00	100.00	-	-
ภาพรวมเขต 3	59	342,129,610.08	166,390,955.49	48.63	174,347,598.71	50.96	1,391,055.88	0.41

รวม 59 รายการ

เพิ่มเป้า Q3 = 54%

เป้าหมายเบิกจ่าย Q2 = 35%

เป้าหมายเบิกจ่าย Q1=17%

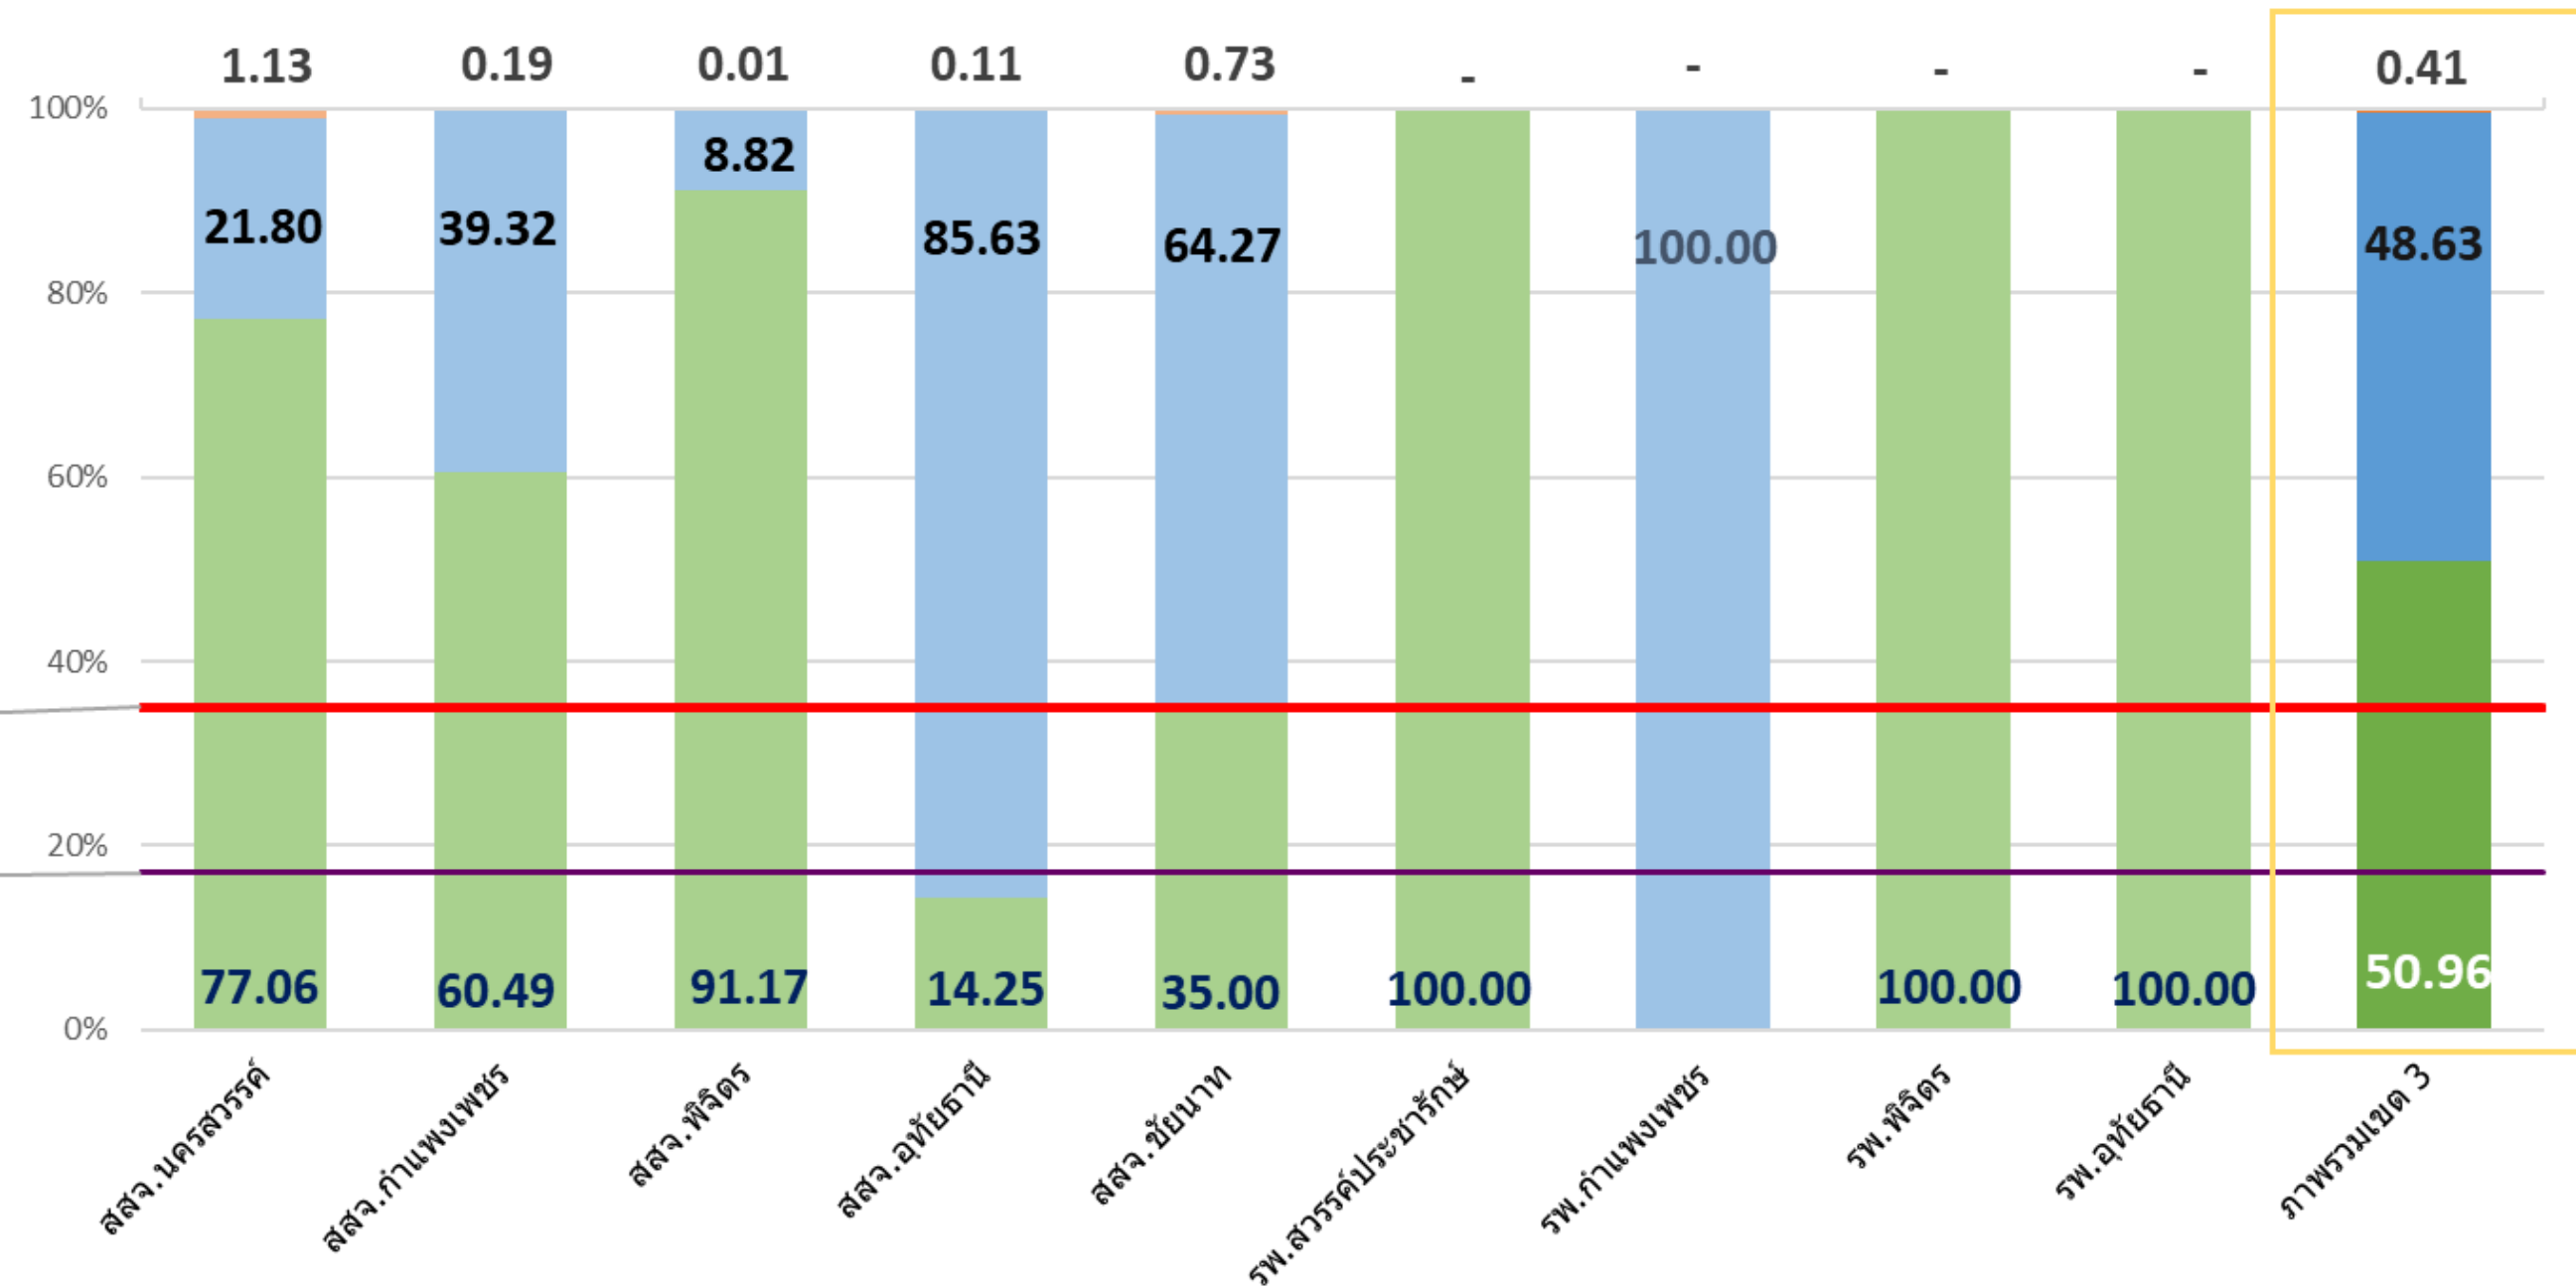

ทำแถบสีให้กว้างขึ้นได้ไหม



ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ PO

ร้อยละคงเหลือ (สำรองเงิน)

รายการงบประมาณ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568 (ครุภัณฑ์/ก่อสร้างปีเดียว/ก่อสร้างผูกพัน)

1. รายการครุภัณฑ์ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 68

เต็มสี่พันเพิ่มในกรอบใหญ่

ดีไหม?



59 รายการ

วงเงินรวม 342,129,610.08 บาท

ครุภัณฑ์ 29 รายการ

วงเงิน 72,322,960 บาท

ก่อสร้างปีเดียว 28 รายการ

วงเงิน 137,460,650.08 บาท

ก่อสร้างผูกพัน 2 รายการ

วงเงิน 132,346,000 บาท

หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	กันเงินสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (สำรองเงิน)	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	14	29,736,460.00	-	-	29,736,460.00	100.00	-	-
สสจ.พิจิตร	8	11,370,500.00	1,499,000.00	13.18	9,870,500.00	86.81	1,000.00	0.01
สสจ.อุทัยธานี	1	2,500,000.00	2,495,500.00	99.82	-	-	4,500.00	0.18
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	6,999,000.00	-	-	6,999,000.00	100.00	-	-
รพ.พิจิตร	4	14,722,000.00	-	-	14,722,000.00	100.00	-	-
รพ.อุทัยธานี	1	6,995,000.00	-	-	6,995,000.00	100.00	-	-
ภาพรวมเขต 3	29	72,322,960.00	3,994,500.00	5.52	68,322,960.00	94.47	5,500.00	0.01

รายการครุภัณฑ์ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ฯ รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร : รอส่งมอบ
2. รถพยาบาล (รถตู้) รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (สัญญาสิ้นสุด วันที่ 20 เม.ย. 68) : รอส่งมอบ

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS

รายการงบประมาณ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568 (ครุภัณฑ์/ก่อสร้างปีเดียว/ก่อสร้างผูกพัน)

1. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 68

59 รายการ
วงเงินรวม 342,129,610.08 บาท

ครุภัณฑ์ 29 รายการ
วงเงิน 72,322,960 บาท

ก่อสร้างปีเดียว 28 รายการ
วงเงิน 137,460,650.08 บาท

ก่อสร้างผูกพัน 2 รายการ
วงเงิน 132,346,000 บาท

หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	กันเงินสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (สำรองเงิน)	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	12	64,193,153.08	24,149,408.00	37.62	38,980,001.27	60.72	1,063,743.81	1.66
สสจ.กำแพงเพชร	6	29,663,000.00	17,820,600.00	60.08	11,786,603.81	39.74	55,796.19	0.19
สสจ.พิจิตร	3	5,622,888.00	-	-	5,622,888.00	100.00	-	-
สสจ.อุทัยธานี	1	1,520,000.00	946,960.00	62.30	573,040.00	37.70	-	-
สสจ.ชัยนาท	6	36,461,609.00	25,673,944.49	70.41	10,746,304.63	29.47	41,359.88	0.11
ภาพรวมเขต 3	28	137,460,650.08	68,590,912.49	49.90	67,708,837.71	49.26	1,160,899.88	0.84

ทำตัวหนา เน้นให้ต่างกัน

2. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว/ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

สสจ.นครสวรรค์

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.แม่เปิน	บ้านพัก ขรก. ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	1,185,000.00	-	1,019,100.00	165,900.00	
รพ.แม่เปิน	บ้านพัก ขรก. ระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	1,739,000.00	-	1,139,045.00	599,955.00	
รพ.บรรพตพิสัย	อาคารซักฟอก	7,640,000.00	-	4,354,800.00	3,285,200.00	
รพ.แม่वंก	บ้านพัก ขรก. ระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ	1,218,223.08	1,149.63	-	1,217,073.45	
รพ.ไพศาลี	บ้านพัก ขรก. ระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ	1,344,000.00	-	1,137,024.00	206,976.00	
รพ.ชุมตาบง	อาคารโภชนาการ	5,800,000.00	470,694.18	-	5,329,305.82	
รพ.หนองบัว	อาคารจ่ายกลาง	10,309,800.00	591,900.00	6,996,888.00	2,721,012.00	
รพ.ลาดยาว	ระบบบำบัดน้ำเสีย	8,333,000.00	-	5,833,100.00	2,499,900.00	
	รวม	37,569,023.08	1,063,743.81	20,479,957.00	16,025,322.27	

สสจ.กำแพงเพชร

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.บึงสามัคคี	อาคารพัสดุ	8,370,000.00	-	4,938,300.00	3,431,700.00	
รพ.คลองขลุง	บ้านพัก ขรก. ระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ	1,188,000.00	4,396.19	-	1,183,603.81	
รพ.โกสัมพีนคร	อาคารจ่ายกลาง	9,340,000.00	51,400.00	6,724,800.00	2,563,800.00	
	รวม	18,898,000.00	55,796.19	11,663,100.00	7,179,103.81	

2. รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว/ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

สสจ.อุทัยธานี

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.ห้วยคต	บ้านพัก ขรก. ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ	1,520,000.00	-	946,960.00	573,040.00	
	รวม	1,520,000.00	-	946,960.00	573,040.00	

สสจ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยบริการ	รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
รพ.หนองมะโมง	อาคารพัสดุ	7,099,000.00	-	4,436,875.00	2,662,125.00	
รพ.สรรพยา	อาคารพัสดุ	7,899,999.00	41,359.88	5,119,009.49	2,739,629.63	
รพ.เนินขาม	อาคารซักฟอก	6,690,000.00	-	3,813,300.00	2,876,700.00	
รพ.หันคา	อาคารจ่ายกลาง	10,295,500.00	-	6,177,300.00	4,118,200.00	
สสจ.ชัยนาท	ปรับปรุงห้องประชุมหลวงปู่ศุขและปรับปรุงระบบภาพและเสียง	4,111,110.00	224,656.00	3,886,454.00	-	
	รวม	36,095,609.00	266,015.88	23,432,938.49	12,396,654.63	

รายการลงทุน ปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568 (ครุภัณฑ์/ก่อสร้างปีเดียว/ก่อสร้างผูกพัน)

3. รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 68

ตามสัญญา


ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	งบ ปี 68 (บาท)	วันที่สิ้นสุด สัญญา	งวดงาน				เบิกจ่าย		เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ทั้ง หมด	ตาม แผน	ปัจจุบัน	ที่ล่าช้า	งบ ปี 67	งบ ปี 68					
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่	อาคารสนับสนุน บริการ 8 ชั้น	164,330,000	26,472,500	15,530,500	8 ต.ค. 69	14	1	2	-	26,472,500	9,680,100	36,152,600	22%	128,177,400	78%	
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	594,000,000	105,873,500	732,500	16 พ.ย. 70	22	-	1	-	-	-	-	-	594,000,000	100%	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ 1

วงเงินตามยอดโอนเงิน

คงเหลือ

รพ.สปร. 42,003,000 บาท 15,530,500 บาท

รพ.กำแพง 106,606,000 บาท 100%

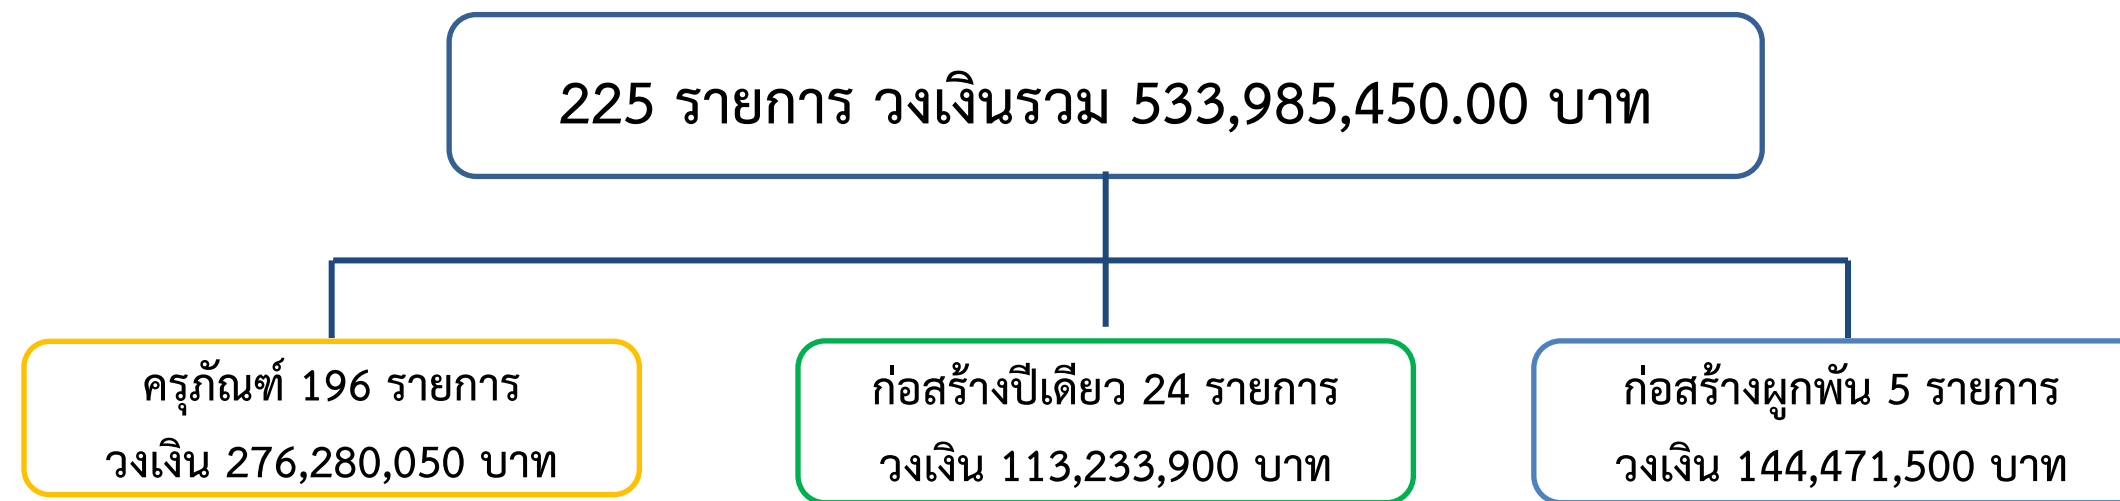


หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	38	75,975,600.00	20,366,081.60	26.81	16,530,648.40	21.76	39,078,870.00	51.43
สสจ.กำแพงเพชร	28	83,403,400.00	23,324,900.00	27.97	25,145,600.00	30.15	34,932,900.00	41.88
สสจ.พิจิตร	50	68,680,100.00	35,437,200.00	51.60	9,783,000.00	14.24	23,459,900.00	34.16
สสจ.อุทัยธานี	27	22,515,000.00	5,243,685.00	23.29	17,228,500.00	76.52	42,815.00	0.19
สสจ.ชัยนาท	28	39,322,500.00	12,668,075.00	32.22	7,398,125.00	18.81	19,256,300.00	48.97
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	9	83,529,700.00	52,602,700.00	62.97	8,575,000.00	10.27	22,352,000.00	26.76
รพ.กำแพงเพชร	9	17,150,000.00	-	-	17,072,970.00	99.55	77,030.00	0.45
รพ.พิจิตร	15	29,549,050.00	16,375,350.00	55.42	13,173,700.00	44.58	-	-
รพ.อุทัยธานี	10	88,719,100.00	4,045,000.00	4.56	10,352,000.00	11.67	74,322,100.00	83.77
รพ.ชัยนาทนเรนทร	11	25,141,000.00	-	-	25,141,000.00	100.00	-	-
ภาพรวมเขต 3	225	533,985,450.00	170,062,991.60	31.85	150,400,543.40	28.17	213,521,915.00	39.98

4

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2568 (ครุภัณฑ์/ก่อสร้างปีเดียว/ก่อสร้างผูกพัน)

รวม 225 รายการ

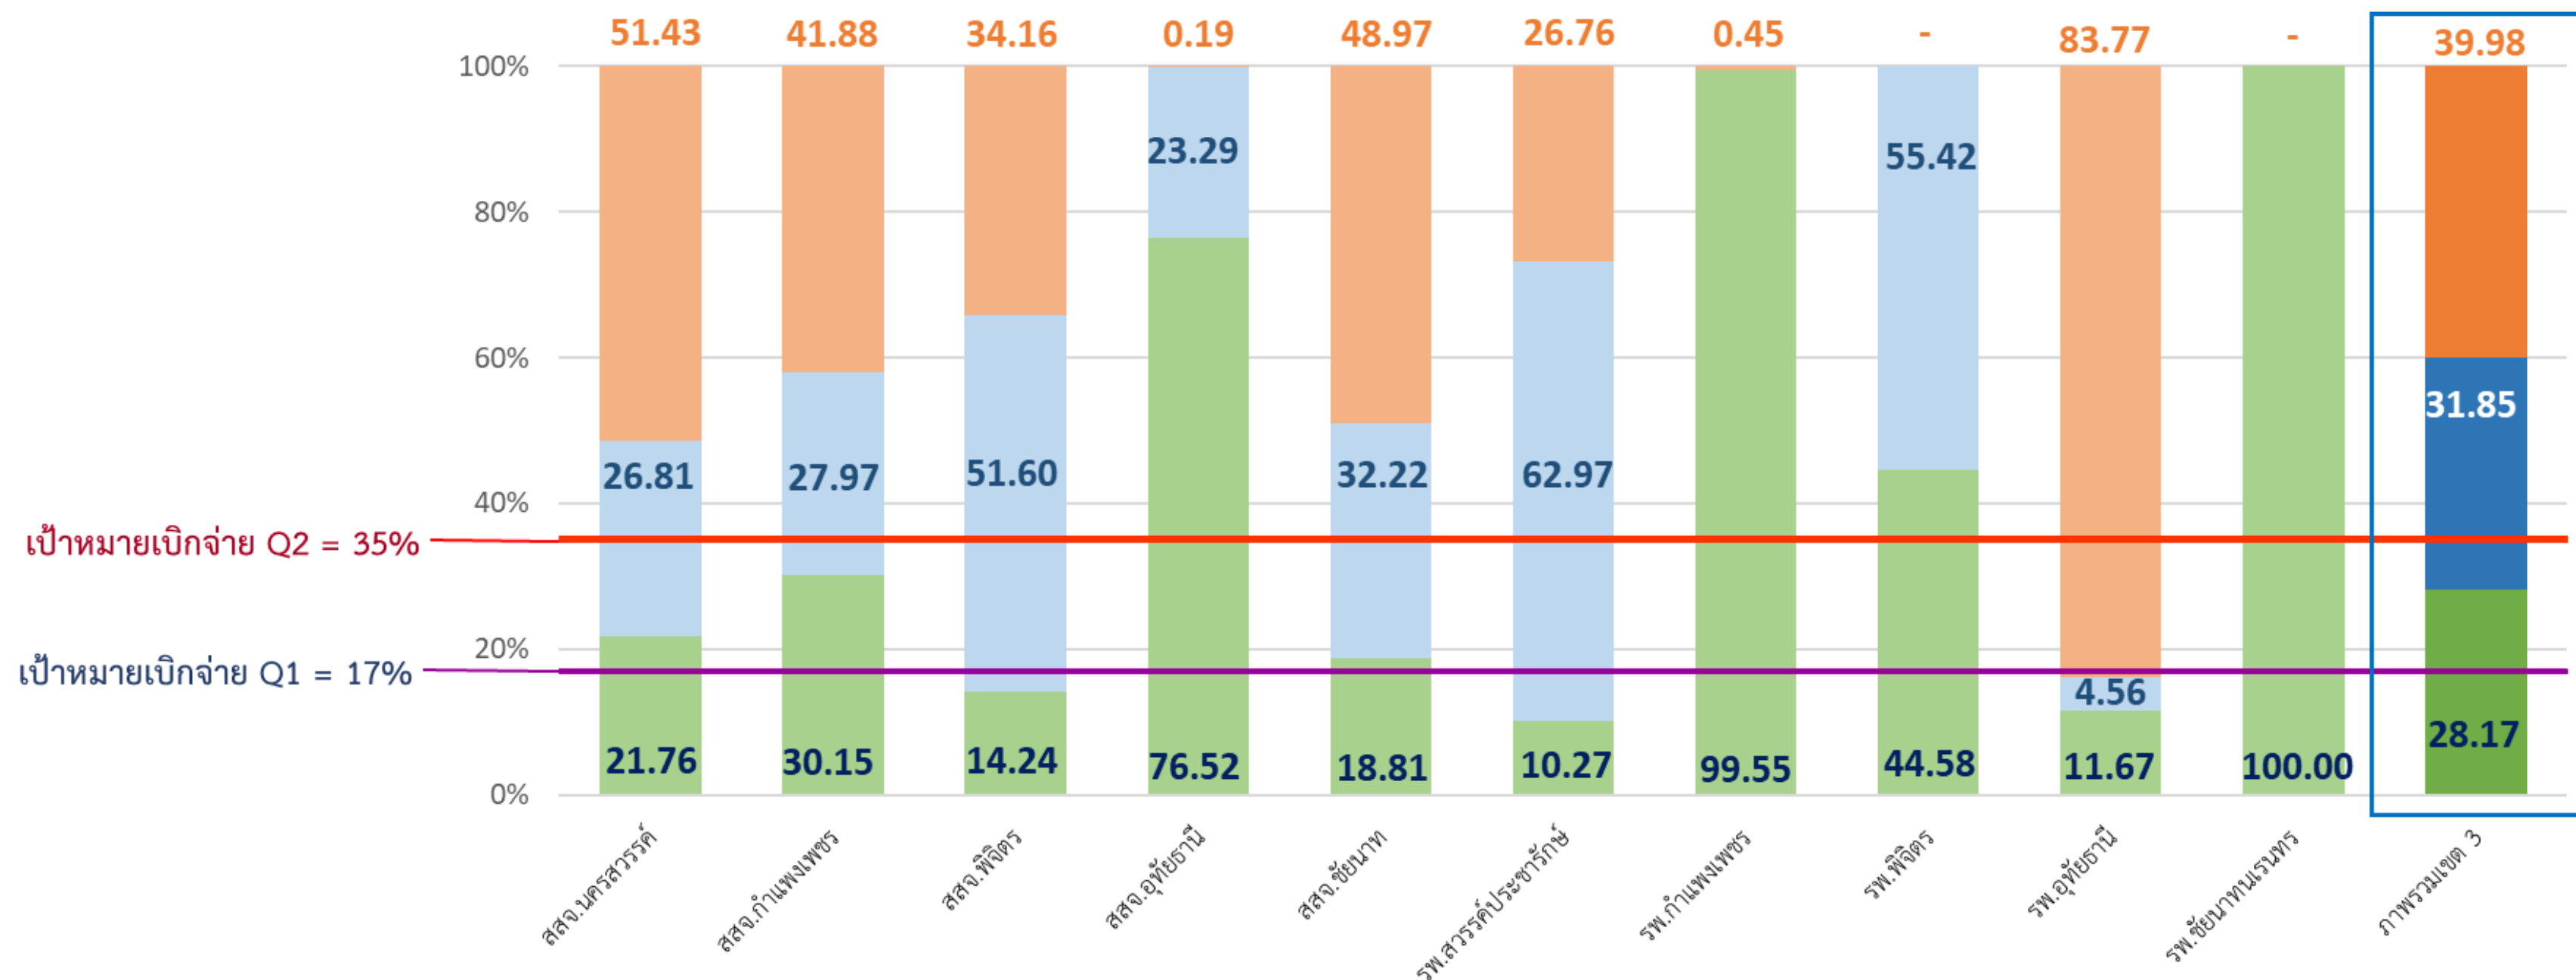

ทำกรอบสีให้กว้างขึ้น



ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ PO

ร้อยละคงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	งบสุทธิ	PO	ร้อยละ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
สสจ.นครสวรรค์	29	32,788,800.00	16,832,590.00	51.34	15,907,360.00	48.51	48,850.00	0.15
สสจ.กำแพงเพชร	24	25,926,500.00	780,900.00	3.01	25,145,600.00	96.99	-	-
สสจ.พิจิตร	42	34,881,000.00	24,236,200.00	69.48	8,694,000.00	24.92	1,950,800.00	5.59
สสจ.อุทัยธานี	27	22,515,000.00	5,243,685.00	23.29	17,228,500.00	76.52	42,815.00	0.19
สสจ.ชัยนาท	23	14,861,000.00	7,509,000.00	50.53	7,171,000.00	48.25	181,000.00	1.22
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	8	61,177,700.00	52,602,700.00	85.98	8,575,000.00	14.02	-	-
รพ.กำแพงเพชร	9	17,150,000.00	-	-	17,072,970.00	99.55	77,030.00	0.45
รพ.พิจิตร	15	29,549,050.00	16,375,350.00	55.42	13,173,700.00	44.58	-	-
รพ.อุทัยธานี	9	14,490,000.00	4,045,000.00	27.92	10,352,000.00	71.44	93,000.00	0.64
รพ.ชัยนาทนเรนทร	11	25,141,000.00	-	-	25,141,000.00	100.00	-	-
ภาพรวมเขต 3	197	278,480,050.00	127,625,425.00	45.83	148,461,130.00	53.31	2,393,495.00	0.86



196 รายการใหม่

ขอขอบคุณครับ !

