

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๑/๒๕๖๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๓/๓๔๗๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณีการบริหาร
และกำกับการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าเพื่อให้งานก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดที่มีงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ ๒๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจตามที่หน่วยงานร้องขอเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้หน่วยงานที่มีงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ ๒๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด โดยให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๓/ว ๑๙๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ แต่กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถจัดหาช่างควบคุมงานได้ และต้องการรับการสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถร้องขอได้เป็นกรณีไป พร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ในการปฏิบัติภารกิจตามที่หน่วยงานร้องขอ ดังนี้

- การออกแบบ ประกอบด้วย สืบหาข้อมูล ร่วมประชุมปรึกษาการออกแบบ ชี้สถานที่พิจารณาผลการประกวดราคา เป็นต้น

- การอำนวยการก่อสร้าง ประกอบด้วย ตรวจสอบผัง ร่วมประชุมการก่อสร้าง ตรวจสอบจ้างตรวจสอบงานระบบ/ครุภัณฑ์ เป็นต้น

- การควบคุม กำกับการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไปด้วยความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการมอบหมายภารกิจของกองแบบแผนไปสู่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ โดยการกำกับของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ๔ แห่ง เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานและกำกับการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การแก้ไขแบบแปลนและการปรับ BOQ

๒. การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจการจ้างงาน

๓. การจ่าย...

๓. การจ่ายค่าคุมงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของช่างผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบเงินบำรุง

๔. การพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณางานบริหารและกำกับงานก่อสร้าง ระดับกรม

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๓/๓๔๗๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และหากหน่วยงาน และสถานบริการสุขภาพ โดยประสงค์จะขอสนับสนุนผู้ควบคุมงาน ให้ขอสนับสนุนได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ ผ่านศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ๔ แห่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ พร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างดำเนินการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ในการปฏิบัติภารกิจตามที่หน่วยงาน ร้องขอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข




กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กองกฎหมาย


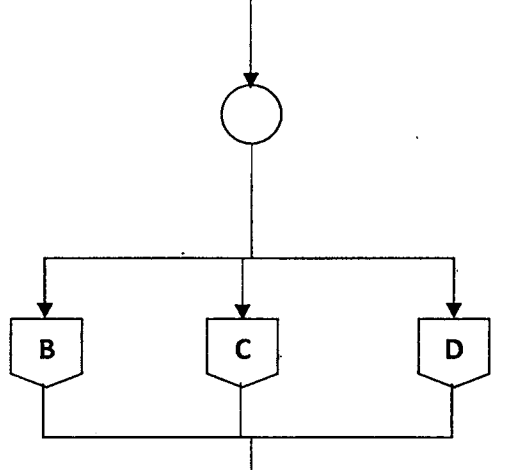
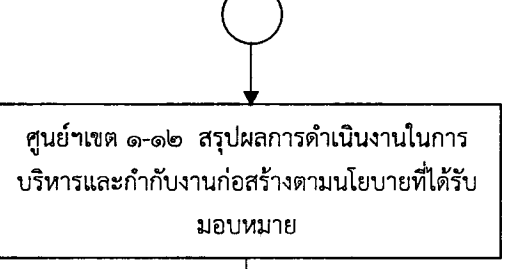

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๕๖๕๑

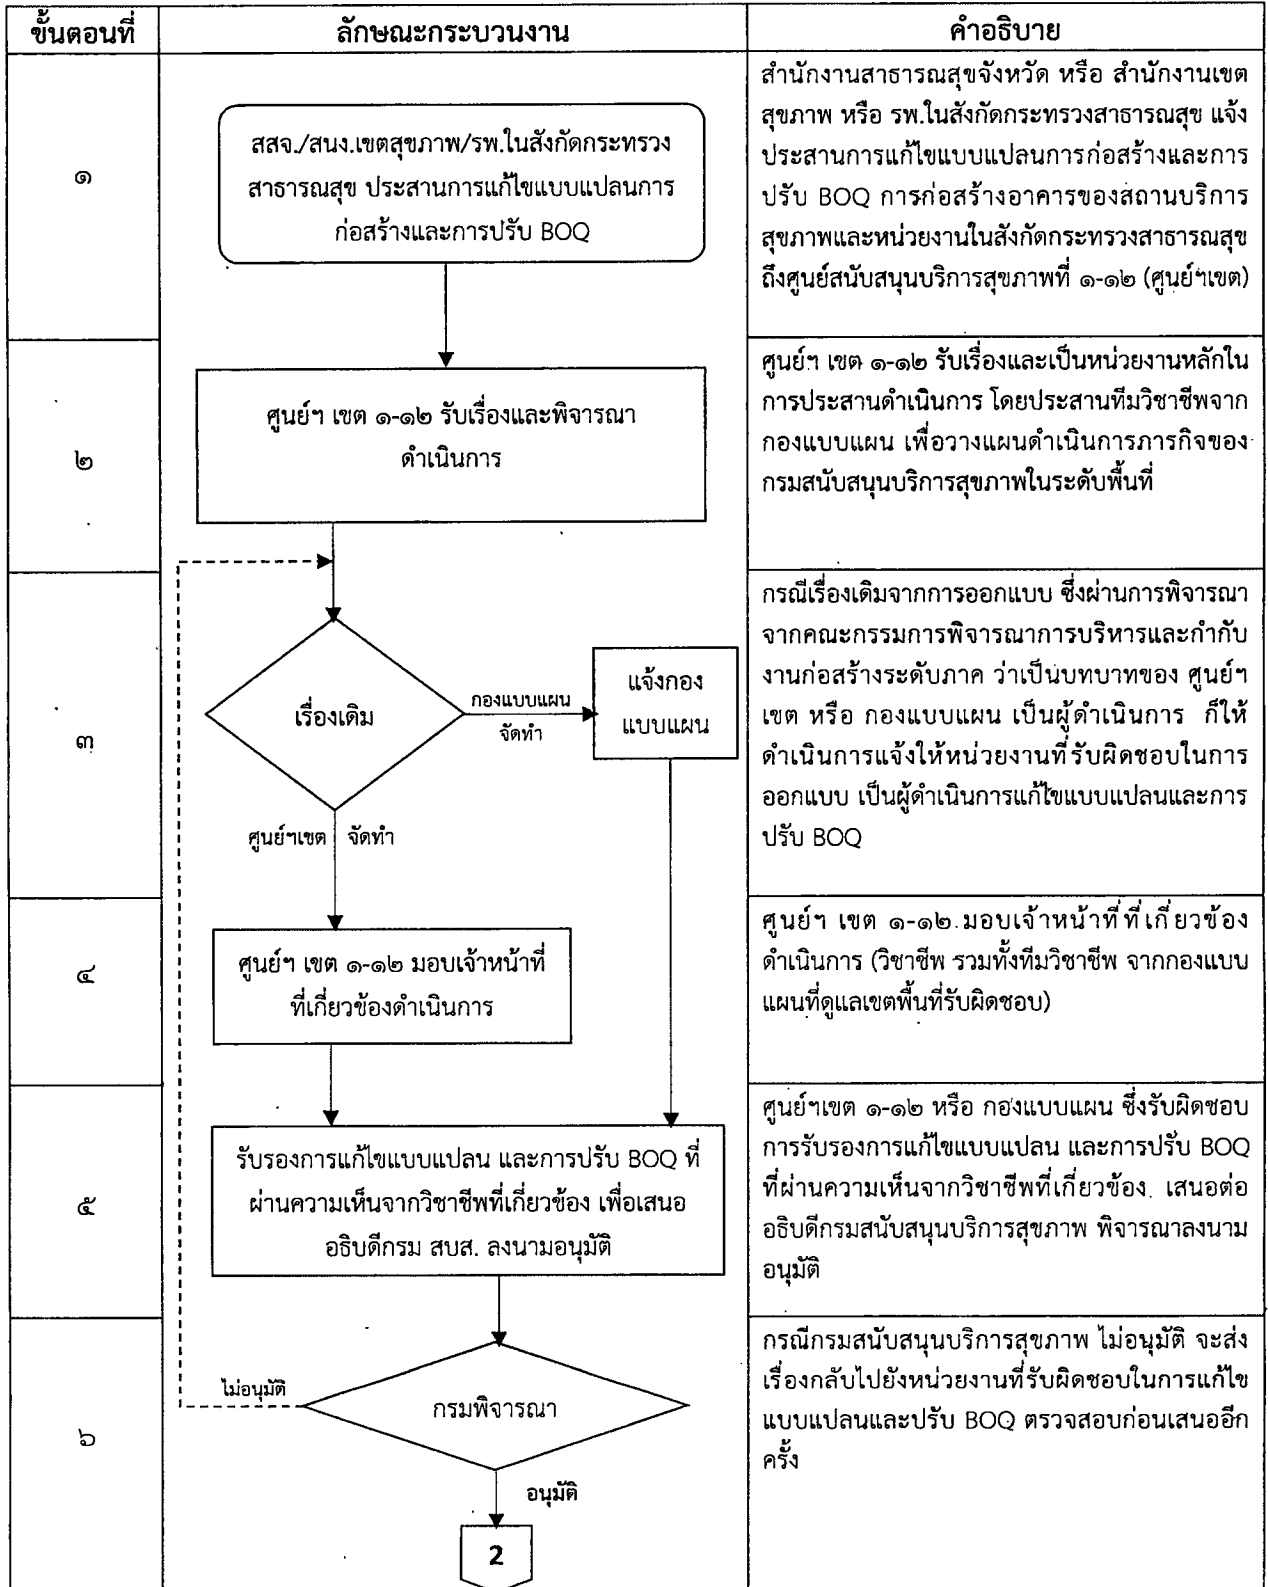
ผังกระบวนการงาน A : การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรณีการบริหารงานและกำกับการทำงานก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพ
 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
๑	 <p>สสจ./สนง.เขตสุขภาพ/รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งความประสงค์การก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ไปยัง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ (ศูนย์ฯ เขต ๑-๑๒)</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งความประสงค์การก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน ๔ งานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ออกแบบและแก้ไขแบบแปลน ๒. ปรับ BOQ (งวดงานงวดเงิน) ๓. การควบคุมงานก่อสร้าง ๔. การตรวจการจ้างงาน <p>ซึ่งครอบคลุม ๑)การให้ความเห็นในการตรวจพิจารณาเปรียบเทียบ ใบบงราคาค่าก่อสร้างราคาตามสัญญา ปรับราคา (ค่า k) แบบแปลนอาคารแบบ Shop Drawing แบบ Asbuilt Drawing ๒)การให้ความเห็น การตรวจพิจารณาการก่อสร้าง รวมถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และ ๓)การแจ้งรายชื่อผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเป็นกรรมการดำเนินการก่อสร้าง เช่น กรรมการชี้สถานที่ กรรมการประกวดราคา เป็นต้น โดยแจ้งไปยัง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ ในพื้นที่รับผิดชอบ</p>
๒	 <p>ศูนย์ฯ เขต ๑-๑๒ นำเข้าคณะกรรมการพิจารณาการบริหารและกำกับงานก่อสร้าง ระดับภาค ของกรม สบส.</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ทั้ง ๔ ภาค ภาคเหนือ (สบส.๑,๒,๓) ภาคกลาง (สบส. ๔,๕,๖) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สบส. ๗,๘,๙,๑๐) ภาคใต้ (สบส. ๑๑,๑๒) จะประชุมพิจารณาร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ในพื้นที่กำกับ</p>
๓	 <p>พิจารณา ลักษณะของงาน</p>	<p>พิจารณาลักษณะของงานว่าเข้าข่าย เป็นงานก่อสร้างที่ ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน หรือ ซับซ้อนมาก ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะกำหนด และแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>หากมติ ที่ ประชุมมอบ ศูนย์ฯเขต เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งกรณี ไม่ซับซ้อน หรือ ซับซ้อน เมื่อศูนย์ฯเขต ดำเนินการ จะรายงานความก้าวหน้าและเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบ ผ่าน ศูนย์ฯภาค</p>

ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
		<p>หากศูนย์ฯ เขต ไม่สามารถดำเนินการได้ (ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก) จะแจ้งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการบริหารและกำกับงานก่อสร้าง ระดับกรม เป็นผู้พิจารณา มอบกองแบบแผน ดำเนินการต่อไป (ฝั่งกระบวนการงาน E)</p>
๔		<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ (ศูนย์ฯเขต ๑-๑๒) รับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาการบริหารและกำกับงานก่อสร้างระดับภาค กรณีงานก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อน หรือซับซ้อน และ มติคณะกรรมการพิจารณาการบริหารและกำกับงานก่อสร้างระดับกรม กรณีงานก่อสร้างที่ ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก เพื่อเตรียมสรุปข้อมูลและเตรียมประสานที่มิวิชาชีพของกองแบบแผนที่ ดูแล ศูนย์ฯเขต ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการเตรียมแจ้ง</p>
๕		<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ (ศูนย์ฯเขต ๑-๑๒) ประสานการดำเนินการร่วมกับทีมวิชาชีพของกองแบบแผนที่ดูแล ศูนย์ฯเขต ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนดำเนินการ ตามนโยบายมอบหมายภารกิจ ๔ งานลงในระดับพื้นที่ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)</p>
๖		<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งความประสงค์การก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบหนังสือจาก ศูนย์ฯ เขต ๑-๑๒ เพื่อเตรียมพื้นที่ และการประสานงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด</p>
๗		<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งความประสงค์การก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานดำเนินการในระหว่างการบริหารและกำกับการก่อสร้างของอาคารสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การแก้ไขแบบแปลน การปรับ BOQ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจการจ้างงาน เป็นต้น</p>

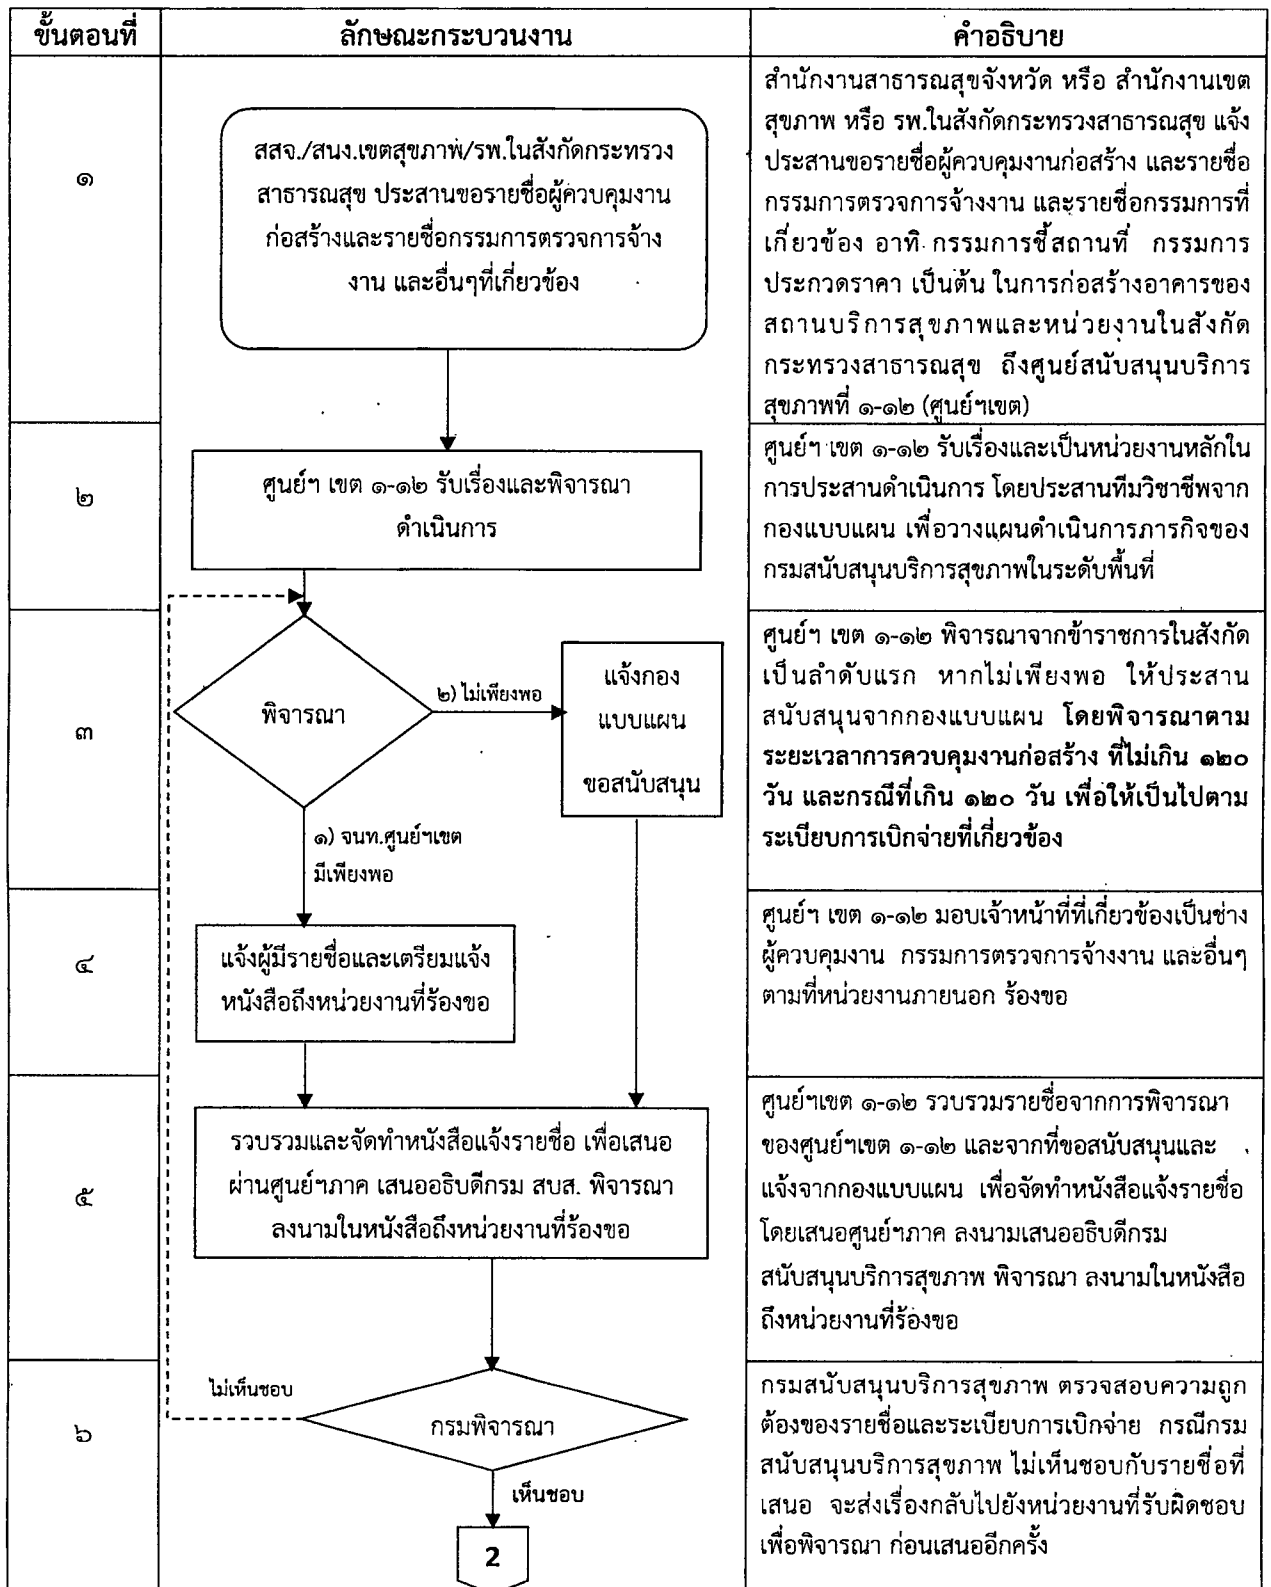
ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
		<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งความประสงค์การก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานดำเนินการ การลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแปลน (ออกแบบและจัดทำวงเงิน)</p>
๘		<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งความประสงค์การก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>ผังกระบวนการ B : การแก้ไขแบบแปลนและการปรับ BOQ</p> <p>ผังกระบวนการ C : การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจการจ้างงาน</p> <p>ผังกระบวนการ D : การจ่ายค่าคุมงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของช่างผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบเงินบำรุง</p>
๙		<p>ศูนย์ฯเขต ๑-๑๒ สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายมอบหมายภารกิจ ๔ งาน (การบริหารและกำกับงานก่อสร้าง) เป็นประจำ (รายวัน รายสัปดาห์ ภายเดือน รายไตรมาส รายปี) ประกอบด้วย ผลงาน ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข ทบทวน เพื่อผลสำเร็จของงาน เป็นต้น</p>
๑๐		<p>รายงานการดำเนินงานผ่านกลไก ศูนย์ฯภาค และรองอธิบดี เพื่อเข้าสู่ระบบรายงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>

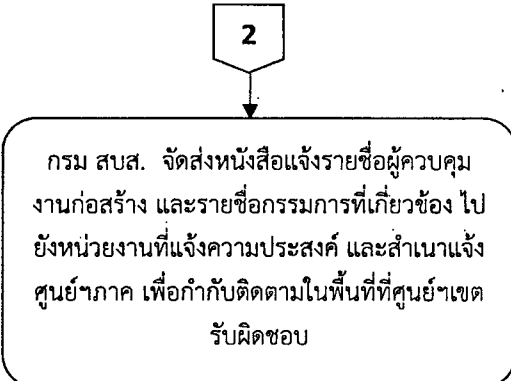
**ผังกระบวนการงาน B : การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรณีการบริหารงานและกำกับกำกับการก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพ
 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (การแก้ไขแบบแปลนและการปรับ BOQ)**



ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
๗	<div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">ศูนย์ฯภาค และศูนย์ฯเขต ๑-๑๒ รวบรวมเรื่องการแก้ไขแบบแปลนและการปรับ BOQ ที่ดำเนินการเอง หรือที่ได้รับการแจ้งจากกองแบบแผน เพื่อเสนอ ศูนย์ฯภาค ๔ ภาค ลงนามหนังสือถึงหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์</p> </div>	<p>ศูนย์ฯภาค และ ศูนย์ฯเขต ๑-๑๒ รวบรวมเรื่องการแก้ไขแบบแปลนและการปรับ BOQ</p> <p>จากที่ดำเนินการเอง และ/หรือ ที่ได้รับการแจ้งจากกองแบบแผน</p> <p>เสนอ ศูนย์ฯภาค ๔ ภาค ลงนามหนังสือถึงหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์</p>
๘	<div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">ศูนย์ฯภาค ๔ ภาค ประสานจัดส่งเอกสารการอนุมัติแก้ไขแบบแปลนและการปรับ BOQ ไปยังหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์</p> </div>	<p>ศูนย์ฯภาค ๔ ภาค ประสานจัดส่งเอกสารการอนุมัติแก้ไขแบบแปลนและการปรับ BOQ ไปยังหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

**ผังกระบวนการงาน C : การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรณีการบริหารงานและกำกับกำกับการก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพ
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจการจ้างงาน)**





ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
๗	<div style="text-align: center;">  <p>2</p> <p>กรม สบส. จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และรายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ และสำเนาแจ้งศูนย์ฯภาค เพื่อกำกับติดตามในพื้นที่ที่ศูนย์ฯเขตรับผิดชอบ</p> </div>	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรณีที่ไม่เกิน ๑๒๐ วัน และกรณีไม่เกิน ๑๒๐ วัน รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ และสำเนาแจ้งศูนย์ฯภาค เพื่อกำกับติดตามในพื้นที่ที่ศูนย์ฯเขต รับผิดชอบ</p>

ผังกระบวนการงาน D : การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรณีการบริหารงานและกำกับกำกับการก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพ
 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(การจ่ายค่าคุมงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของช่างผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบเงินบำรุง)

ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
๑	<p>กรม สบส. แจกแนวทางการจ่ายเงิน เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุข</p>	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำและแจกแนวทางการจ่ายเงิน เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุข ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒	<p>สสจ./สนง.เขตสุขภาพ/รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างและรายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ</p>	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งรายชื่อช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และรายชื่อกรรมการตรวจการจ้างงาน และรายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรรมการชี้สถานที่ กรรมการประกวดราคา เป็นต้น ในการก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๓	<p>สสจ./สนง.เขตสุขภาพ/รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รวบรวมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายของผู้ควบคุมงาน</p>	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รวบรวมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายของผู้ควบคุมงาน
๔	<p>ตรวจสอบ</p> <p>ไม่ถูกต้อง</p> <p>ถูกต้อง</p>	กรณีตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ควบคุมงานส่งหลักฐานเพิ่มเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้อง
๕	<p>จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินบำรุงของศูนย์ฯเขตในพื้นที่ที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน</p> <p>2</p>	เมื่อหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินบำรุงของศูนย์ฯเขต ในพื้นที่ที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานอยู่

ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
๖	 <pre> graph TD A[2] --> B[แจ้งศูนย์ภาค และ/หรือพร้อมหลักฐานการ โอนเงิน ทราบ] </pre>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานเขตสุขภาพ หรือ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง แจ้งศูนย์ภาค ทราบพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>
๗	 <pre> graph TD B --> C[ศูนย์ภาค แจ้ง ศูนย์เขต ที่ได้รับเงินโอนเข้า บัญชีเงินบำรุง เพื่อแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างรายนั้นๆ ทราบเพื่อทำการเบิกจ่าย] </pre>	<p>ศูนย์ภาค แจ้ง ศูนย์เขต ที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินบำรุง เพื่อแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายนั้นๆ ทราบเพื่อทำการเบิกจ่ายต่อไป</p>

ผังกระบวนการงาน E : การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรณีการบริหารงานและกำกับกิจการก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพ
 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(การพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณางานบริหารและกำกับงานก่อสร้าง ระดับกรม)

ขั้นตอนที่	ลักษณะกระบวนการงาน	คำอธิบาย
๑	<p>ศูนย์ฯภาค และศูนย์ฯเขต แจ้งผลการพิจารณา ลักษณะงานก่อสร้างที่หน่วยงานภายนอกในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข แจ้งความประสงค์ให้ ดำเนินการบริหารและกำกับงานก่อสร้าง ที่อยู่ใน ระดับซับซ้อนซึ่งศูนย์ฯเขต ไม่สามารถดำเนินการได้ และระดับซับซ้อนมาก เสนออธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ</p>	<p>ศูนย์ฯภาค และศูนย์ฯเขต แจ้งผลการพิจารณา ลักษณะงานก่อสร้างที่หน่วยงานภายนอกในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขร้องขอให้ดำเนินการบริหาร และกำกับงานก่อสร้าง ที่อยู่ในระดับซับซ้อนซึ่ง ศูนย์ฯเขต ไม่สามารถดำเนินการได้ และระดับ ซับซ้อนมาก</p> <p>เสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>
๒	<p>อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมาย คณะกรรมการพิจารณางานบริหารและกำกับ งานก่อสร้าง ระดับกรม ดำเนินการ</p>	<p>อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมาย คณะกรรมการพิจารณางานบริหารและกำกับงาน ก่อสร้าง ระดับกรม ดำเนินการพิจารณา</p>
๓	<p>คณะกรรมการพิจารณางานบริหารและกำกับ งานก่อสร้าง ระดับกรม ดำเนินการพิจารณา</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการพิจารณางานบริหารและ กำกับงานก่อสร้าง ระดับกรม เพื่อพิจารณา ตามที่ คณะกรรมการฯ ระดับภาค เสนอ</p>
๔	<p>พิจารณาแล้ว</p> <p>ศูนย์ฯเขต สามารถดำเนินการได้</p> <p>เสนอกรม แจ้ง ศูนย์ฯภาค ดำเนินการ</p> <p>ศูนย์ฯเขต ดำเนินการไม่ได้</p> <p>มอบกองแบบแผนดำเนินการ</p>	<p>หากพิจารณาแล้วว่า หน่วยงานระดับเขต และภาค สามารถดำเนินการได้ จะมีมติแจ้งให้ศูนย์ฯภาค ดำเนินการในระดับซับซ้อน ที่หน่วยงานระดับพื้นที่ สามารถดำเนินการได้ สำหรับระดับซับซ้อนมาก มอบกองแบบแผน ดำเนินการ โดยประสานศูนย์ฯ ภาค และศูนย์ฯเขต ในพื้นที่ ร่วมดำเนินการ</p>
๕	<p>A ขั้นตอน ๔</p>	<p>ศูนย์ฯเขต ๑-๑๒ รับทราบมติ คณะกรรมการฯ ระดับกรม เตรียมประสาน ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง</p>
๖	<p>A ขั้นตอน ๕</p>	<p>ศูนย์ฯเขต ๑-๑๒ วางแผนดำเนินการร่วมกับทีม วิชาชีพ จากกองแบบแผน</p>
